

# 【東日本大震災津波】 社会資本の復旧・復興ロードマップの概要

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

【問い合わせ先】  
岩手県復興局 (019-629-6935)

## 策定の趣旨

### ◆ 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、身近な社会資本の整備に関する情報を定期的に提供

被災者や被災地の事業者が、今後の生活再建・事業再開等を具体的に検討するためには、県民生活に身近な**社会資本の復旧・復興の工程**についての**情報**が**不可欠**です。

このため、県では、現時点における県民生活に身近な**社会資本(主要8分野)**の**復旧・復興の見通し**について**情報提供**を行うものです。

なお、記載している箇所名や工程等については、今後、様々な要因により**変更**等が必要になる**可能性がある**ことから、定期的に**最新のデータに更新**しながら、**情報を提供**していきます。

## ロードマップの構成

### ◆ 社会資本の主要8分野について策定

- ①海岸、②まちづくり、③復興道路、④災害公営住宅、⑤漁港、⑥港湾、⑦医療、⑧教育

### ◆ 下記の2種類の表で構成

#### 1 総括表

- ① 各分野の年度別の整備スケジュール(概ねの整備目標)
- ② 市町村別の事業計画掲載箇所数等の一覧 を記載

#### 2 市町村別工程表

※市町村ごとに、すべての分野を一括して記載

- ① 各事業箇所の市町村内位置図
- ② 整備目標及び年度別整備スケジュール等 を記載

## ロードマップの変更要因

### ◆ 想定される変更要因は、下記に掲げるとおり。 そのため、定期的に最新の情報に更新(年4回程度)

#### 1 工程上の要因

- ① 用地取得時における土地所有者調査・関係者調整の長期化
- ② 施工時における漁業や環境配慮等のための工程調整 等

#### 2 事業計画上の要因

- ① まちづくり計画に対する合意形成や復興交付金事業計画等の熟度
- ② 国や市町村、その他関係機関の関連計画との調整 等

社会資本の復旧・復興ロードマップは、県のホームページで公表。

## 1 総括表

### 社会資本の復旧・復興ロードマップ【総括表】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

【問い合わせ先】  
岩手県復興局 (019-629-6935)

1 年度別の整備スケジュール										2 市町村別事業計画掲載箇所数等一覧									
安全への配慮を確保しての整備										※赤字は道路からの変更箇所									
分野	事業	第1期(平成25年度)	第2期(平成26年度)	第3期(平成27年度)	第4期(平成28年度)	第5期(平成29年度)	第6期(平成30年度)	第7期(平成31年度)	第8期(平成32年度)	市町村	事業	第1期(平成25年度)	第2期(平成26年度)	第3期(平成27年度)	第4期(平成28年度)	第5期(平成29年度)	第6期(平成30年度)	第7期(平成31年度)	第8期(平成32年度)
海岸	① 海岸防備施設(防波堤、防風林等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	宮城県	① 海岸防備施設(防波堤、防風林等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
まちづくり	② まちづくり計画(まちづくり計画、まちづくり計画等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	岩手県	② まちづくり計画(まちづくり計画、まちづくり計画等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
復興道路	③ 復興道路(復興道路、復興道路等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	青森県	③ 復興道路(復興道路、復興道路等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
災害公営住宅	④ 災害公営住宅(災害公営住宅、災害公営住宅等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	秋田県	④ 災害公営住宅(災害公営住宅、災害公営住宅等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
漁港	⑤ 漁港(漁港、漁港等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	山形県	⑤ 漁港(漁港、漁港等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
港湾	⑥ 港湾(港湾、港湾等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	福島県	⑥ 港湾(港湾、港湾等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
医療	⑦ 医療(医療、医療等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	茨城県	⑦ 医療(医療、医療等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
教育	⑧ 教育(教育、教育等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	栃木県	⑧ 教育(教育、教育等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1

## 2 市町村別工程表

社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村】										社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村】									
安全・安心で生活するまちづくり										社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村】									
分野	事業	第1期(平成25年度)	第2期(平成26年度)	第3期(平成27年度)	第4期(平成28年度)	第5期(平成29年度)	第6期(平成30年度)	第7期(平成31年度)	第8期(平成32年度)	市町村	事業	第1期(平成25年度)	第2期(平成26年度)	第3期(平成27年度)	第4期(平成28年度)	第5期(平成29年度)	第6期(平成30年度)	第7期(平成31年度)	第8期(平成32年度)
海岸	① 海岸防備施設(防波堤、防風林等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	野田村	① 海岸防備施設(防波堤、防風林等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
まちづくり	② まちづくり計画(まちづくり計画、まちづくり計画等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	野田村	② まちづくり計画(まちづくり計画、まちづくり計画等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
復興道路	③ 復興道路(復興道路、復興道路等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	野田村	③ 復興道路(復興道路、復興道路等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
災害公営住宅	④ 災害公営住宅(災害公営住宅、災害公営住宅等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	野田村	④ 災害公営住宅(災害公営住宅、災害公営住宅等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
漁港	⑤ 漁港(漁港、漁港等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	野田村	⑤ 漁港(漁港、漁港等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
港湾	⑥ 港湾(港湾、港湾等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	野田村	⑥ 港湾(港湾、港湾等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
医療	⑦ 医療(医療、医療等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	野田村	⑦ 医療(医療、医療等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1
教育	⑧ 教育(教育、教育等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1	野田村	⑧ 教育(教育、教育等)の整備・整備計画	1	1	1	1	1	1	1	1



社会資本の復旧・復興ロードマップ【総括表】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

【問い合わせ先】  
岩手県復興局 (019-629-6935)

1 年度別の整備スケジュール  
※全ての箇所を網羅して記載

分野	概要	年度別整備スケジュール								
		第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)		
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
一般海岸・ 漁港海岸・ 農地海岸・ 林野海岸	○ 45海岸で堤防・水門等の 復旧・整備を実施 ○ 20河川で堤防・水門等の 復旧・整備を実施	応急対策								
		施工準備(堤防設計等)								
		防潮堤、水門等の復旧・整備工事						一部防潮堤 等工事	一部水門工事	
農地海岸・ 林野海岸	○ 16海岸で防潮堤・防災林 等の復旧・整備を実施	応急対策								
		施工準備(堤防設計等)								
		防潮堤・防災林等の復旧・整備工事						防災林造成工事(高田松原地区)		
漁港海岸	○ 54海岸(県25海岸、市町村 29海岸)で防潮堤等の復旧・ 整備を実施	応急対策								
		施工準備(堤防設計等)								
		防潮堤等の復旧・整備工事						一部(無堤区間)防潮堤工事		
復興まちづくり	○ 18地区で土地区画整理事 業を実施 ○ 52地区で防災集団移転事 業を実施 ○ 9地区で津波復興拠点整 備事業を実施 ○ 41地区で漁業集落防災機 能強化事業を実施	事業準備・住民合意(復興計画策定等)								
		事業計画手続き等(都市計画決定等)								
		調査・設計・工事等								
		工事進捗にあわせ順次住宅建設								
	○ 1路線で街路を整備 (単独整備のみ掲載)	事業準備				詳細設計・用地測量				
						都市計画変更等		工事		
復興道路	○ 18路線の34区間(箇所)で まちづくりと連携した道路を整 備	施工準備(測量設計等)		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手(逐次供用開始)						
		(H23新規着手) 事業準備	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手(逐次供用開始)							
		(事業中)	用地・工事の推進(逐次供用開始)							
復興支援道路	○ 5路線の8区間(箇所)で復興 支援道路を整備	(H24新規着手) 施工準備 (設計・用地等)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手(逐次供用開始)							
		(事業中)	用地・工事の推進(逐次供用開始)							
復興関連道路	○ 14路線の15区間(箇所)で復興 関連道路を整備	(H25新規着手) 施工準備 (設計・用地等)	(H24新規着手) 施工準備 (設計・用地等)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
		(H24新規着手) 施工準備 (設計・用地等)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
		(事業中)	用地・工事の推進(逐次供用開始)							
災害公営住宅	○ 県及び市町村の全体で 6,038戸の災害公営住宅を整 備	用地		設計						
				工事(2,850戸の整備を予定)						
		用地		設計						
				工事(3,188戸の整備を予定)						
漁港	○ 108漁港(県31漁港、市町村 77漁港)で防波堤、岸壁の 復旧・整備を実施	応急対策								
		施工準備(堤防設計等)				防波堤、岸壁等の復旧・整備工事				
港湾	○ 6港湾(重要港湾4港湾、地 方港湾2港湾)で湾口防波堤、 岸壁、物揚場などの復旧・整備 を実施	(国) 施工準備	湾口防波堤の復旧・整備工事(釜石港、大船渡港)						(宮古港)	
		(県) 暫定供用	防波堤、岸壁等の復旧・整備工事				一部の物揚場、臨港道路等			
医療	○ 県立病院3箇所、市町村立 医療診療所3箇所の整備を 実施	(県) 建設場所選定	用地・設計・工事(大槌病院、山田病院、高田病院)							
		(市町村)	用地・設計・工事							
教育	○ 県立高等学校1箇所、市町村 立小中学校17箇所の整備を 実施(協議、調整中のものを 含む)	事業準備 住民合意								
				用地取得・設計・造成工事						
		設計、校舎・体育館等建設								

2 市町村別 事業計画掲載箇所数等一覧

※赤字は前回からの変更箇所

市町村名	事業 主体	海岸保全施設				復興まちづくり							復興道路等						災害公営住宅		漁 港	港 湾	医 療	教 育
		一般海岸 港湾海岸	農地海岸 林野海岸	漁港海岸	計	土地区画 整理	防災集団 移転	津波復興 拠点	漁業集落 防災	面整備計	街路整備	まちづくり 連携道路	復興道路		復興支援道路		復興関連道路							
		河川・海岸数	海岸数	海岸数	河川・海岸数	地区数	地区数	地区数	地区数	地区数	路線数	箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数	箇所数	戸数	漁港数	地区数	箇所数	箇所数
洋野町	県	6	0	1	7	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	0	0	1	2	-	-
	町	-	-	0	0	0	0	0	1	1	-	-		(国) 1	-	-	-	-	1	4	8	-	-	-
	計	6	0	1	7	0	0	0	1	1	-	1		1	0	0	1	1	1	4	9	2	-	-
久慈市	県	5	0	1	6	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	1	1	2	2	0	0	1	4	-	-
	市	-	-	2	2	0	0	0	4	4	-	-		(国) 2	-	-	-	-	3	11	9	(国) 1	-	-
	計	5	0	3	8	0	0	0	4	4	-	-		2	1	1	2	2	3	11	10	5	-	-
野田村	県	6	2	0	8	-	-	-	-	-	-	2	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	2	26	1	-	-	-
	村	-	-	0	0	1	1	0	2	4	-	-		(国) 1	-	-	-	-	4	75	2	-	-	-
	計	6	2	0	8	1	1	0	2	4	-	2		1	0	0	1	1	6	101	3	-	-	-
普代村	県	4	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-
	村	-	-	0	0	0	0	0	1	1	-	-		(国) 3	-	-	-	-	0	0	3	-	-	-
	計	4	0	0	4	0	0	0	1	1	-	-		3	0	0	0	0	0	0	5	-	-	-
田野畑村	県	2	0	1	3	-	-	-	-	-	-	3	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	2	0	0	1	-	-	-
	村	-	-	1	1	0	0	0	2	2	-	-		(国) 3	-	-	-	-	5	63	3	-	-	-
	計	2	0	2	4	0	0	0	2	2	-	3		3	0	0	1	2	5	63	4	-	-	-
岩泉町	県	2	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	1	2	0	0	0	0	1	1	-	-
	町	-	-	1	1	0	0	0	1	1	-	-		(国) 1	-	-	-	-	2	51	1	-	1	2
	計	2	0	2	4	0	0	0	1	1	-	-		1	1	2	0	0	2	51	2	1	1	2
宮古市	県	13	2	2	17	-	-	-	-	-	-	7	三陸沿岸道 路・宮古盛 岡橋断道路	1	1	3	2	2	12	363	3	7	-	-
	市	-	-	3	3	3	5	2	9	19	-	-		(国) 7	-	-	-	-	12	430	15	(国) 1	1	2
	計	13	2	5	20	3	5	2	9	19	-	7		8	1	3	2	2	24	793	18	8	1	2
山田町	県	4	3	4	11	-	-	-	-	-	0	1	三陸沿岸 道路	-	1	1	0	0	11	556	4	-	1	-
	町	-	-	1	1	3	4	1	2	10	-	-		(国) 2	-	-	-	-	8	275	2	-	-	1
	計	4	3	5	12	3	4	1	2	10	0	1		2	1	1	0	0	19	831	6	-	1	1
大槌町	県	2	1	2	5	-	-	-	-	-	0	1	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	5	500	2	-	1	-
	町	-	-	0	0	4	5	2	4	15	-	-		(国) 1	-	-	-	-	11	480	0	-	-	2
	計	2	1	2	5	4	5	2	4	15	0	1		1	0	0	1	1	16	980	2	-	1	2
釜石市	県	6	3	5	14	-	-	-	-	-	0	7	三陸沿岸道 路・東北横 断自動車道 釜石秋田線	-	1	1	3	3	4	198	6	1	-	-
	市	-	-	7	7	4	11	2	14	31	-	-		(国) 3	-	-	-	-	21	1216	9	(国) 1	-	4
	計	6	3	12	21	4	11	2	14	31	0	7		3	1	1	3	3	25	1414	15	2	-	4
大船渡市	県	7	3	5	15	-	-	-	-	-	1	5	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	9	507	6	6	-	-
	市	-	-	8	8	1	21	1	1	24	-	-		(国) 2	-	-	-	-	17	283	16	(国) 1	-	3
	計	7	3	13	23	1	21	1	1	24	1	5		2	0	0	1	1	26	790	22	7	-	3
陸前高田市	県	8	2	3	13	-	-	-	-	-	0	7	三陸沿岸 道路	-	0	0	2	2	7	700	3	-	1	1
	市	-	-	6	6	2	5	1	0	8	-	-		(国) 2	-	-	-	-	6	300	9	-	1	3
	計	8	2	9	19	2	5	1	0	8	0	7		2	0	0	2	2	13	1000	12	-	2	4
全体	県	65	16	25	106	0	0	0	0	0	1	34	3路線	1	5	8	14	15	50	2850	31	21	3	1
	市町村	0	0	29	29	18	52	9	41	120	0	0		(国) 28	-	-	-	-	90	3188	77	(国) 4	3	17
	計	65	16	54	135	18	52	9	41	120	1	34		29	5	8	14	15	140	6038	108	25	6	18



# 社会資本の復旧・復興ロードマップの見方

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

## 事業箇所位置図(久慈市の例)

### 新たな視点による 新たなまちづくり

#### ■事業名・箇所名等

- ・海岸保全施設と漁港は、海岸・漁港名と主な工種を記載。
- ・復興道路等は、路線名及び箇所・区間名を記載。
- ・復興まちづくりは、事業名及び箇所・地区名を記載。
- ・災害公営住宅は、事業名及び団地名を記載

#### ■復興の目標、目指す姿

市町村の復興計画等で位置付けられた復興の目標や目指す姿等を記載。

#### ■事業の計画位置等

- ・各事業の計画・検討区域や実施区域の、位置や範囲を図形記号(凡例参照)で表示。
- ・図形記号の中の数字等は、工程表の「路線・箇所名等」欄の数値等と一致する。

#### ■復興道路等のインターチェンジ

三陸沿岸道路等のインターチェンジの位置を表示。

#### ■復興道路の概略ルート

国が整備を進めている三陸沿岸道路等の概略ルートを表示。(地図の縮尺を任意で調整しているため、国の公表資料と異なる場合がある。)

凡 例	
	3.11 浸水区域
	海岸保全施設
	復興道路等
	復興まちづくり
	災害公営住宅
	漁 港

#### ■凡例

工程表に記載した各事業を図形記号で表示。

#### ■地形図

様式のサイズに合わせて、地形図の縮尺を任意で調整しているため、実際の距離等とは一致しない。

## 工程表(宮古市の例から抜粋表示)

#### ■分野区分

県民生活に身近な主要8分野を記載。

#### ■海岸保全施設の細分項目

- ・港湾海岸は、港湾区域に隣接するなど、港湾管理者が管理する海岸。
- ・農地海岸は、背後に農地を有する海岸。
- ・林野海岸は、防潮林などの保安林を有する海岸。
- ・漁港海岸は、漁港区域に隣接するなど、漁港管理者が管理する海岸。
- ・一般海岸は、上記以外の海岸のうち、海岸保全区域に指定された海岸。

#### ■工事の着手と完成

工事に着手した箇所は★、完成した箇所は☆を表示。

#### ■終期(二重表示)

終期が平成30年度以降となる場合、二重に表示。

#### ■基準日(平成25年12月31日現在)

基準日の目安を赤線で表示。

#### ■道路の種別

(主)は主要地方道、  
(一)は一般県道。

#### ■トピック

復旧工事の完了や復興道路の供用、公営住宅の入居開始等を記載。

#### ■住宅再建の時期

年度ごとの住宅・宅地供給数を記載。

『民』自力再建等の宅地数  
『公』災害公営住宅の戸数

#### ■まちづくりと災害公営住宅の関連

復興まちづくり(面整備事業)と災害公営住宅の関連を記載。  
『単独』災害公営住宅を単独事業として実施  
『●●地区』復興まちづくりと一体的に実施

#### ■災害公営住宅の整備手法

- ・『直接建設』 直接整備を実施
- ・『設計・施工一括選定』 設計・施工業者を一括選定
- ・『買取』 民間事業者が建設した公営住宅を買い取り
- ・『敷地提案型買取』 民間事業者が提案した敷地と共に公営住宅を買い取り

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	工程表
海岸保全施設	一般海岸・港湾海岸	県	1 摂待海岸	防潮堤L=0.1km、水門L=1.0km
			4 高浜海岸	防潮堤L=1.0km、陸間等N=4基
	農地海岸	市	14 宮古大沢海岸	(港湾高潮) 防潮堤L=0.1km 水門等N=3基
			15 摂待地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=0.3km (災害復旧)
	林野海岸	市	16 田老漁港	
			18 宿漁港海岸	
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	(H23 事業新規) ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H24.1.18起工式
			宮古道路	(事業中) ☆用地・工事の推進 ◆H25.3.23「宮古中央インター線(千徳大橋)」供用開始
	復興支線道路	県	B 宮古盛岡横断道路	★測量、設計 ◆H25.1.1
			C 国道340号	(事業中) ☆用地・工事の推進 (逐次供用開始) ◆H25.11.29供用開始
	復興関連道路	市	D (主) 重茂半島線	(事業中) ☆用地・工事の推進 (逐次供用開始) ◆H25.11.29供用開始
			a 田老地区	区域面積: 19.0ha 対象戸数: 220戸 (民180戸・公40戸) 事業準備・住民合意
復興まちづくり	土地区画整理	市	e 崎山地区	対象戸数: 約30戸 (民6戸・公24戸) 事業準備・住民合意
			i 津軽石地区	区域面積: 約1.2ha 事業準備・住民合意
	防災集団移転	県	津波復興拠点	
			漁業集落防災機能強化	
	まちづくり連携道路	市	直接建設	
			設計・施工一括選定	
災害公営住宅	敷地提案型買取	市	キ 佐原(単独)	予定戸数: 50戸
			ス-2 田老(区・田老地区)	予定戸数: 40戸
	直接建設	県	久喜漁港	(漁港災害) 防波堤L=373m、岸壁L=663m 他
			設計・施工一括選定	
	敷地提案型買取	市	久喜漁港	
			設計・施工一括選定	
港湾	漁港	市	久喜漁港	
			設計・施工一括選定	
	漁港	県	久喜漁港	
			設計・施工一括選定	
	漁港	市	久喜漁港	
			設計・施工一括選定	
医療	医療	市	久喜漁港	
			設計・施工一括選定	
	医療	県	久喜漁港	
			設計・施工一括選定	
	医療	市	久喜漁港	
			設計・施工一括選定	
教育	小学校	市	久喜漁港	
			設計・施工一括選定	
	小学校	県	久喜漁港	
			設計・施工一括選定	
	小学校	市	久喜漁港	
			設計・施工一括選定	




社会資本の復旧・復興ロードマップ 【洋野町】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先 【県】県北広域振興局土木部(0194-53-4990)  
同 水産部(0194-53-4985)  
【町】洋野町建設課 (0194-77-2114)

海と高原の絆、未来へ 確かな復興

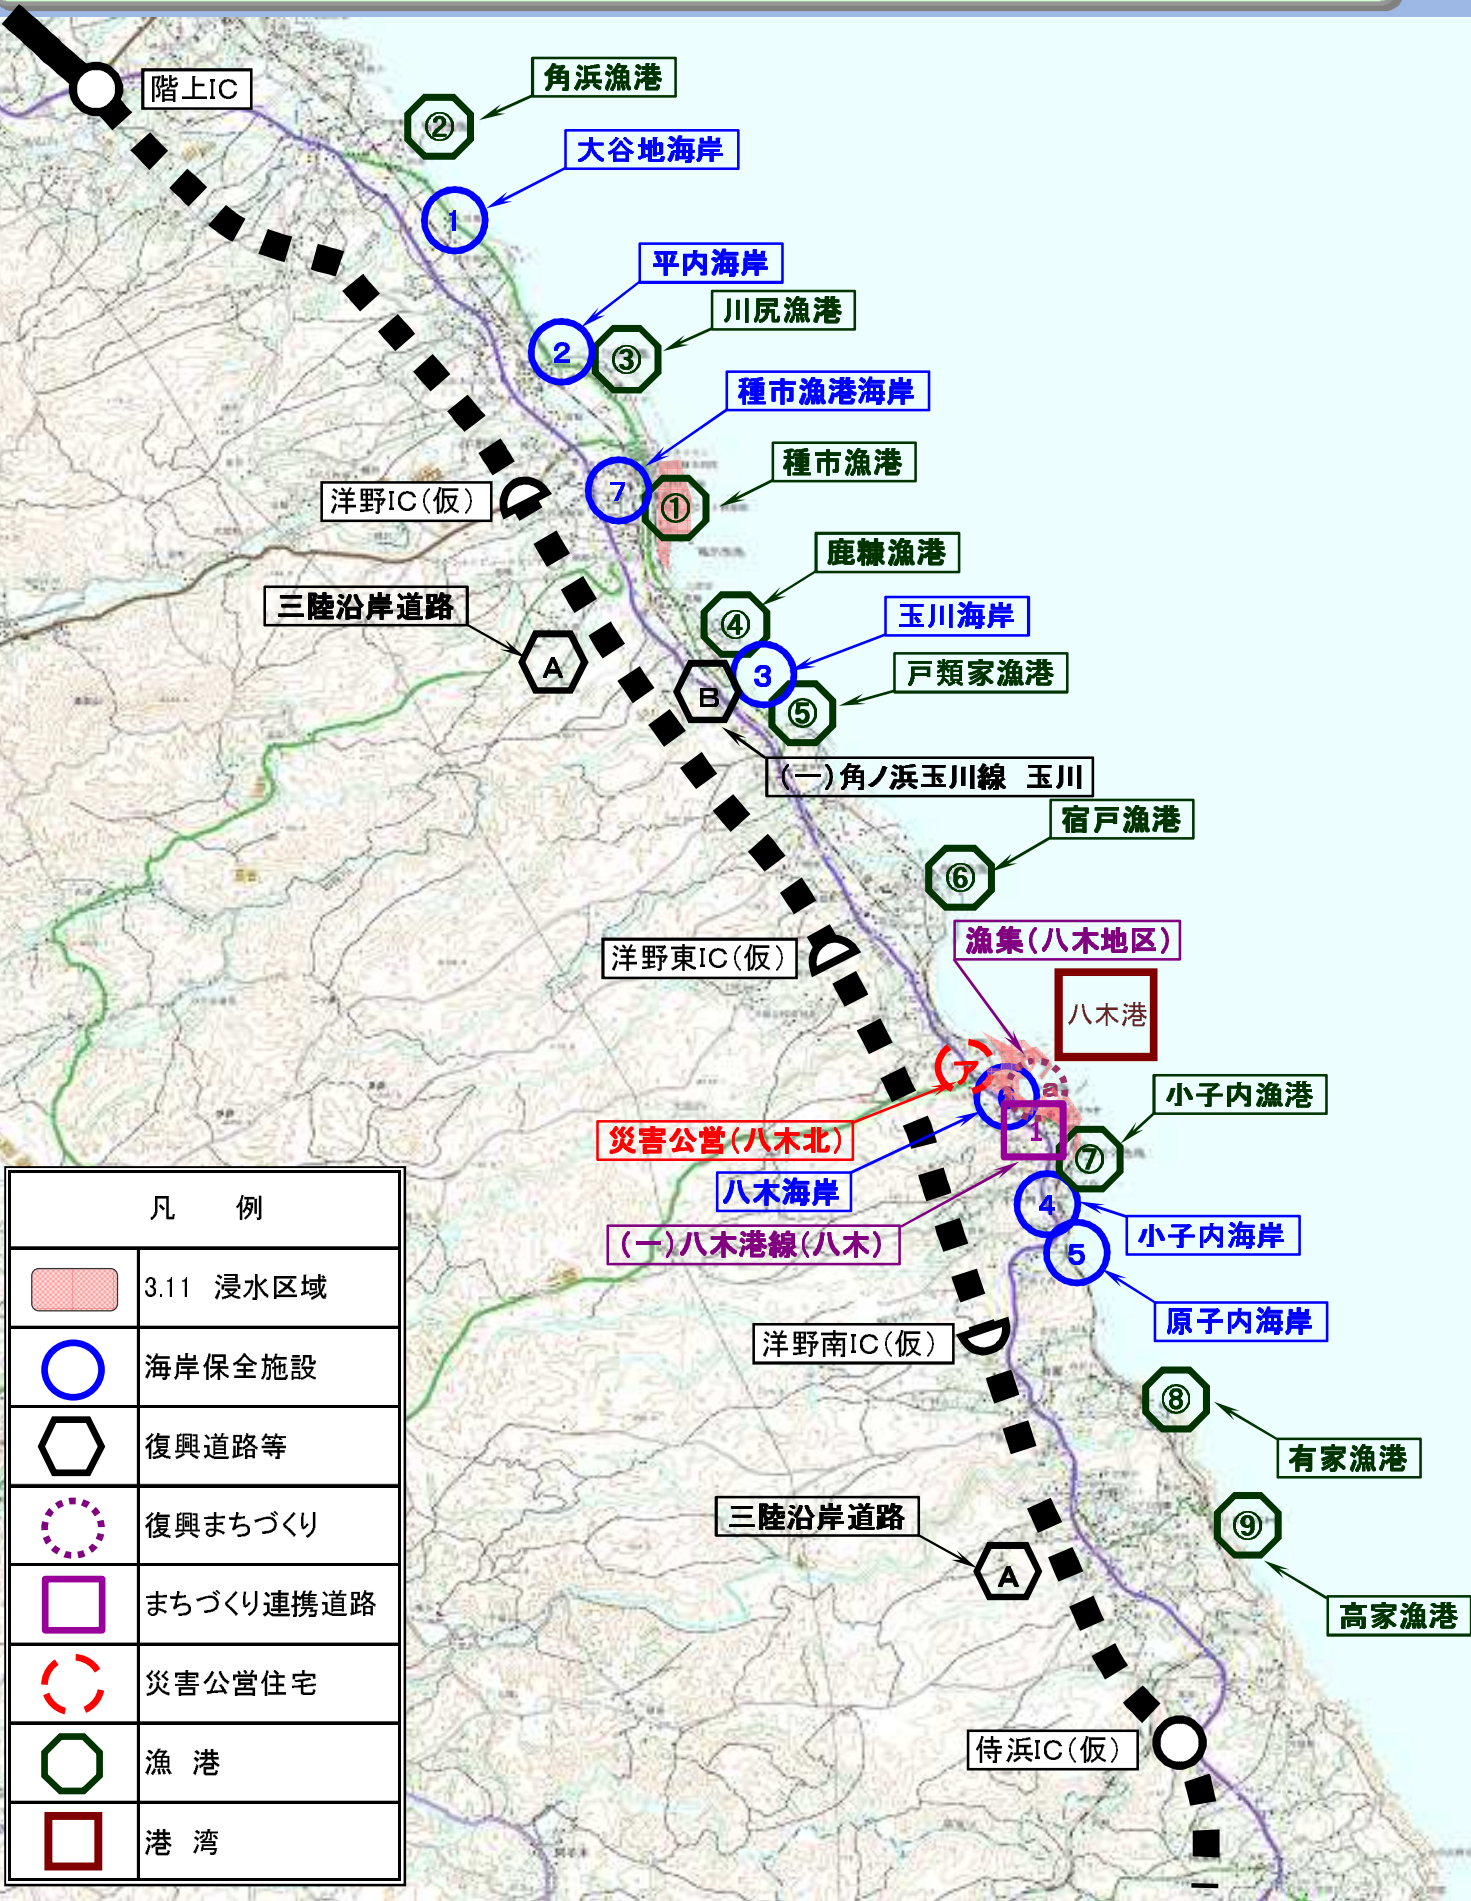

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大谷地海岸	(災害復旧) 根固工V=92m <sup>3</sup> 他	施工準備	☆工事	■H24.12完了							
			2 平内海岸	(災害復旧) 消波工L=220m	施工準備	☆工事		■H25.10完了						
			3 玉川海岸	(災害復旧) 護岸L=87m 他	施工準備	☆工事	■H24.11完了							
			4 小子内海岸	(災害復旧) 監視カメラ1台 他	施工準備	☆工事	■H24.8完了							
			5 原子内海岸	(災害復旧) 根固工V=92m <sup>3</sup> 他	施工準備	☆工事	■H24.5完了							
			6 八木海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km、水門等N=3基	施工準備			工事						
	漁港海岸		7 種市漁港海岸	(災害復旧) 陸開N=1基、水門N=1基 他	☆工事	■H24.3完了								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	洋野階上道路(待浜～階上)	(H23新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.9.12起工式								
	復興関連道路	県	B (一) 角ノ浜玉川線	玉川		(H25新規) 施工準備	用地買収	用地・工事の推進						
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	町	a 八木	用地造成他 対象戸数:17戸(民17戸)	事業準備	設計、用地等	工事							
	まちづくり連携道路	県	1 (一)八木港線	八木		施工準備	工事の推進							
災害公営住宅	直接建設	町	A 八木北(単独)	木造平屋 戸数:4戸	用地	設計	☆工事	■H25.8完了						
漁港	漁港	町	① 種市漁港	(漁港災害) 防波堤L=106m 他	施工準備	応急対策 ☆工事	■H24.9完了							
			② 角浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=10m	施工準備	☆工事	■H24.3完了							
			③ 川尻漁港	(漁港災害) 護岸N=1式 他	施工準備	☆工事	■H24.3完了							
			④ 鹿糠漁港	(漁港災害) 船揚場L=22m 他	施工準備	☆工事	■H24.3完了							
			⑤ 戸類家漁港	(漁港災害) 船揚場N=1式	施工準備	☆工事	■H24.3完了							
			⑥ 宿戸漁港	(漁港災害) 防波堤L=69m、船揚場L=8m 他	施工準備	応急対策 ☆工事	■H24.12完了							
			⑦ 小子内漁港	(漁港災害) 防波堤L=101m、岸壁L=14m 他	施工準備	応急対策 ☆工事	■H25.1完了							
			⑧ 有家漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m 他	施工準備	応急対策 ☆工事	■H25.1完了							
			⑨ 高家漁港	(漁港災害) 防波堤L=45m 他	施工準備	応急対策 ☆工事	■H24.11完了							
港湾	八木港	県	北港地区	(災害復旧) 防波堤L=162m、-4.5m岸壁L=159m、護岸防波(1)×2 L=321.2m 他	暫定供用	☆防波堤、☆物揚場、☆臨港道路	★航路・泊地浚渫							
			南港地区	(災害復旧) 第2防波堤L=13m、1号護岸L=57.8m	暫定供用	☆防波堤、☆護岸	★航路・泊地浚渫							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数です。




# 社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市 1／2】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【県】県北広域振興局土木部(0194-53-4990)  
同 水産部(0194-53-4985)  
【市】久慈市総務部復興推進課(0194-54-8005)

## 新たな視点による 新たなまちづくり

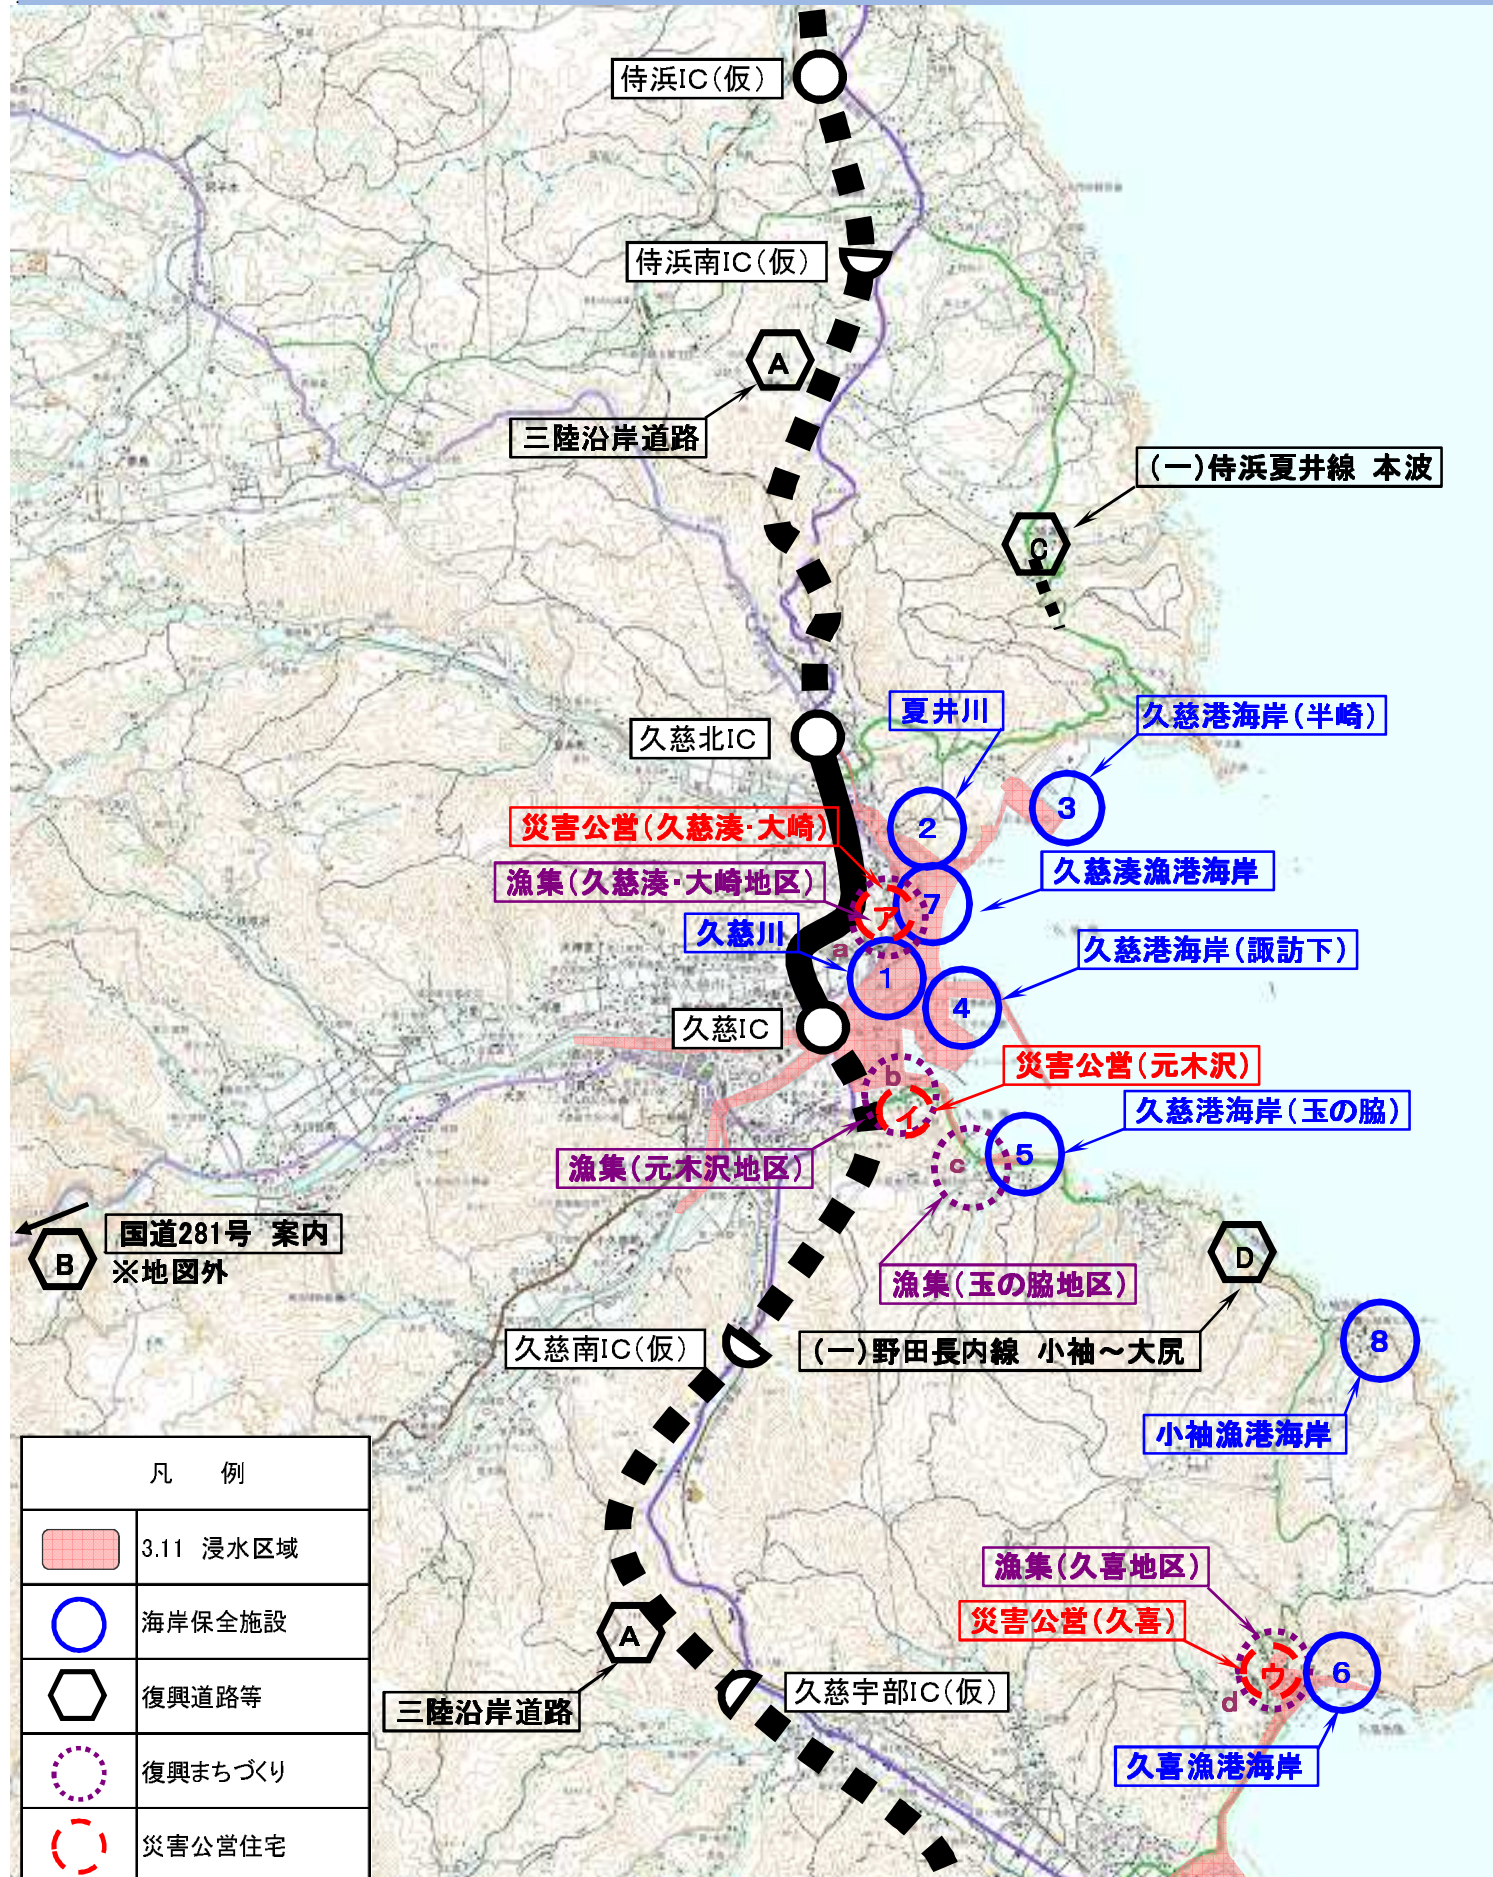


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 久慈川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.0km	施工準備			工事						
			2 夏井川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.8km	施工準備			工事						
	港湾海岸		3 久慈港海岸(半崎)	(災害復旧) 離岸堤L=0.2km	施工準備	☆工事	■H24.10完了							
			4 久慈港海岸(諏訪下)	(災害復旧) 防潮堤L=2.6km、陸間N=12基	施工準備		★工事							
			5 久慈港海岸(玉の脇)	(災害復旧) 離岸堤L=0.4km	施工準備	☆工事	■H24.10完了							
	漁港海岸		6 久喜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備		★工事						
			7 久慈湊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=4基	応急対策	施工準備		★工事						
			8 小袖漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	施工準備			工事						
復興道路等	復興道路	国	久慈北道路	(事業中)	★用地・工事の推進									
			A 三陸沿岸道路	野田久慈道路(普代～久慈)	(H23新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.27起工式								
	復興支援道路	県	B 国道281号	案内	(H24新規)	施工準備	用地買収	★用地・工事の推進						
			C (一) 侍浜夏井線	本波	(事業中)	☆用地・工事の推進		■H24.9.30供用開始						
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	D (一) 野田長内線	小袖～大尻	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
			a 久慈湊・大崎	集落道、避難施設、用地造成 他 対象戸数:14戸(民9戸・公5戸)	事業準備	設計・用地等		民9戸 公5戸	★工事 (集団移転に関してはH25完了予定)					
			b 元木沢	集落道、避難施設、用地造成 他 対象戸数:5戸(民2戸・公3戸)	事業準備	設計・用地等		民2戸 公3戸	☆工事	■H25.11完了				
			c 玉の脇	集落道、用地造成 他 対象戸数:3戸(民3戸)	事業準備	設計・用地等		民3戸	☆工事	■H25.11完了				
	災害公営住宅	市	d 久喜	集落道、漁業集落排水、用地造成 他 対象戸数:4戸(民1戸・公3戸)	事業準備	設計・用地等		民1戸 公3戸	☆工事	■H25.8完了				
			ア 久慈湊・大崎(漁:久慈湊・大崎地区)	木造 予定戸数:5戸	用地・造成			5戸	設計	★工事				
			イ 元木沢(漁:元木沢地区)	木造 予定戸数:3戸	用地・造成			3戸	設計	★工事				
			ウ 久喜(漁:久喜地区)	木造 予定戸数:3戸	用地・造成			3戸	設計	☆工事	■H25.12完了			

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。



新たな視点による 新たなまちづくり

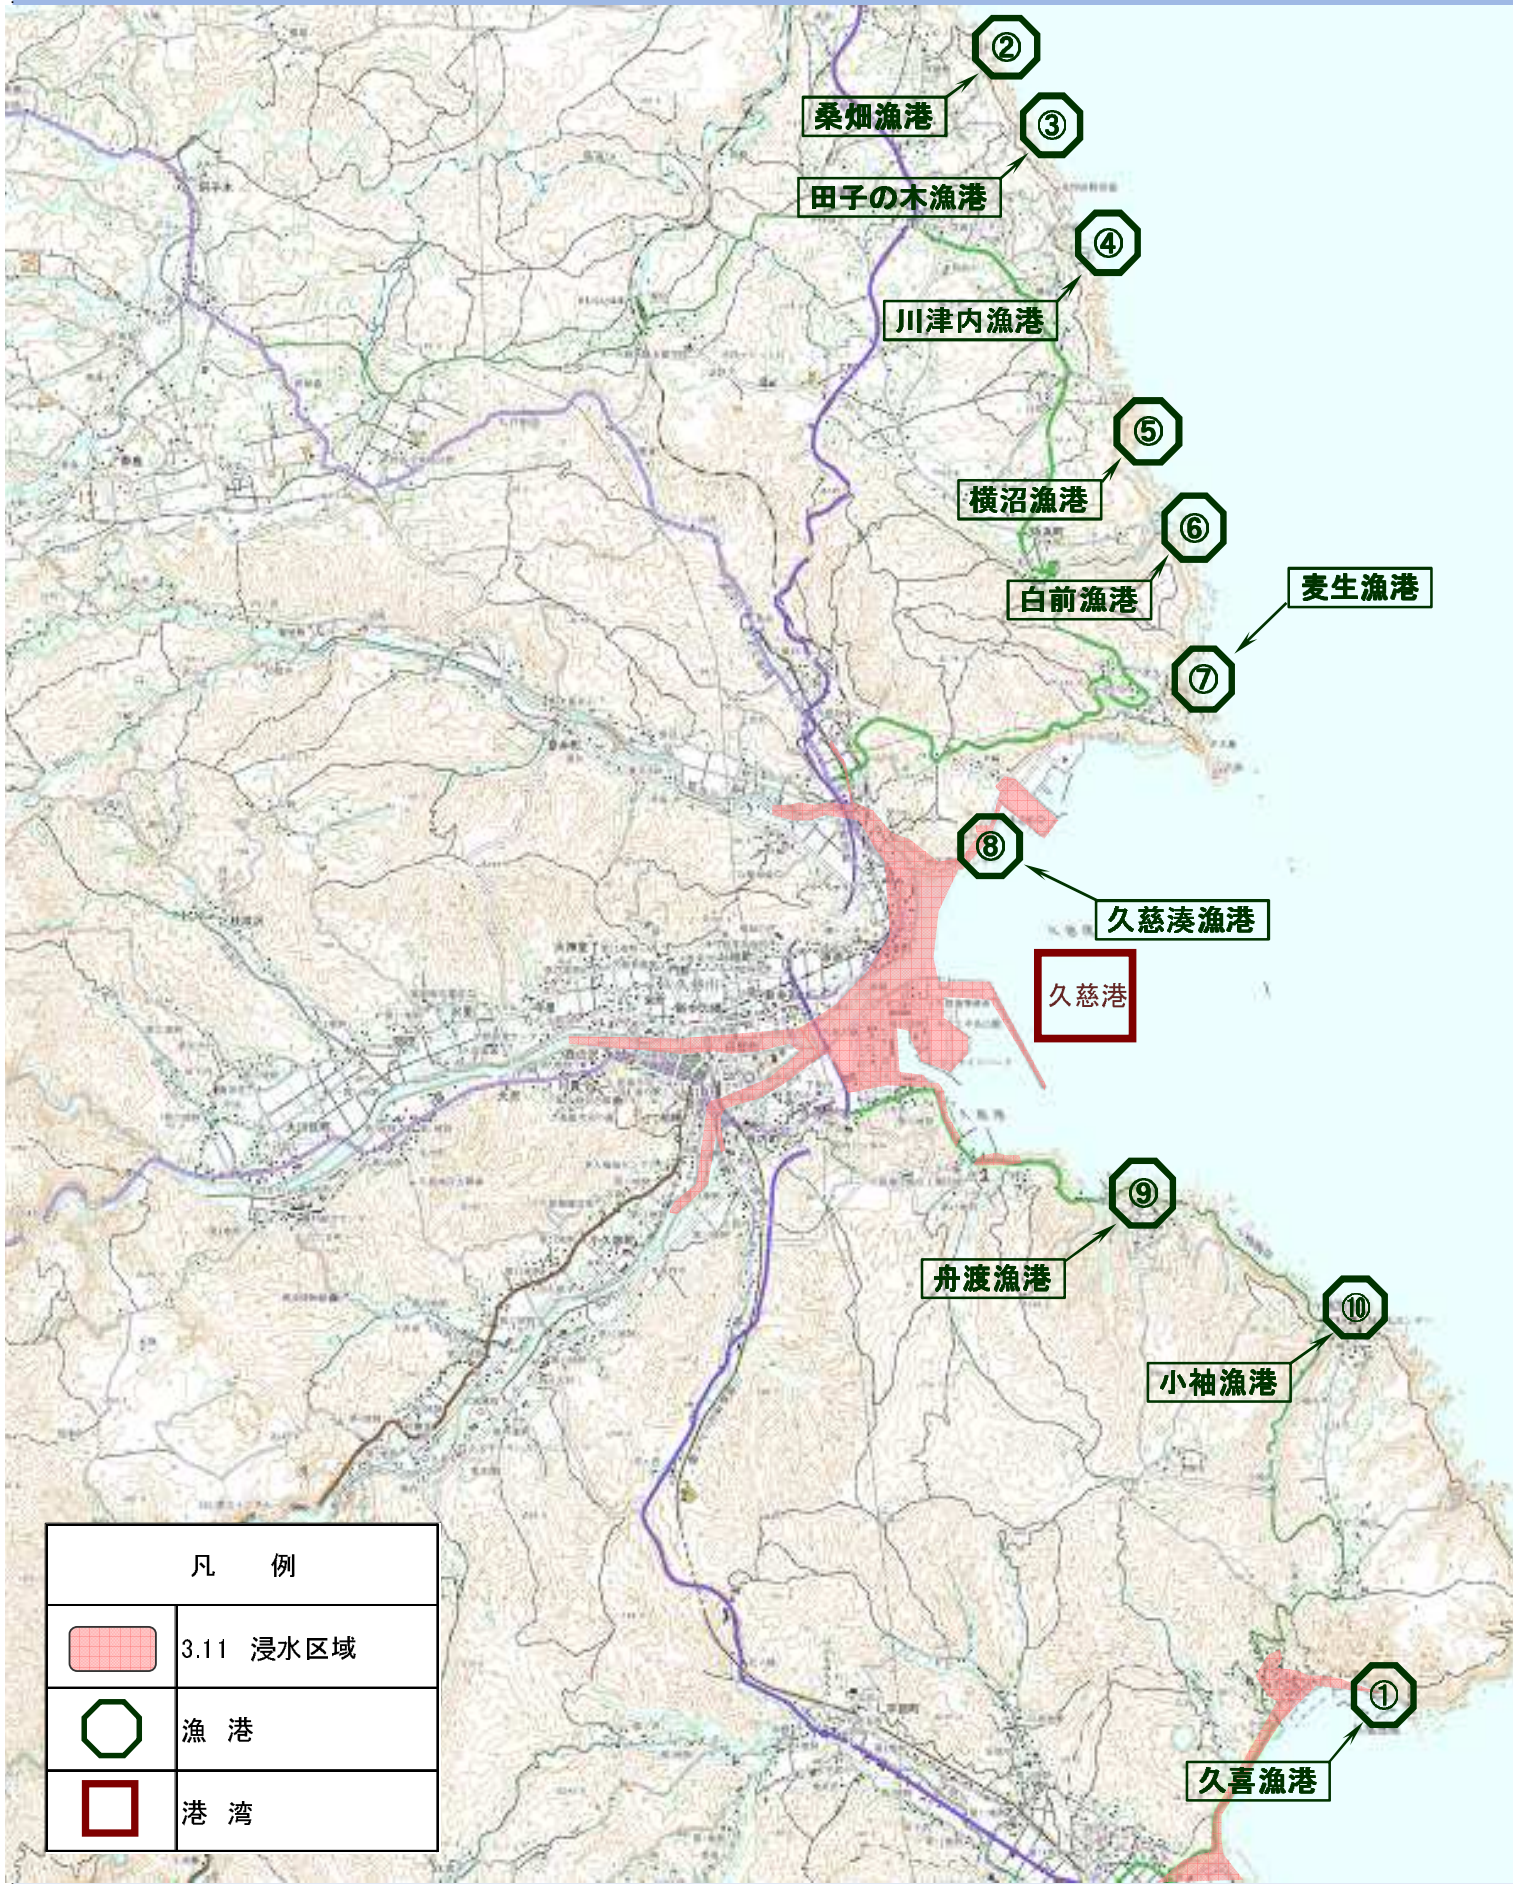

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
漁 港	漁 港	県	① 久喜漁港	(漁港災害) 防波堤L=162m、岸壁L=93m 他	施工準備 応急対策	☆工事		■H25.7完了						
			② 桑畑漁港	(漁港災害) 用地N=1式 他	施工準備 応急対策	☆工事	■H24.1完了							
		市	③ 田子の木漁港	(漁港災害) 護岸N=1式 他	施工準備 応急対策	☆工事	■H23.8完了							
			④ 川津内漁港	(漁港災害) 防波堤L=11m 他	施工準備 応急対策	☆工事	■H24.3完了							
			⑤ 横沼漁港	(漁港災害) -3m岸壁N=1式 他	施工準備 応急対策	☆工事	■H24.3完了							
			⑥ 白前漁港	(漁港災害) 防波堤L=29m 他	施工準備 応急対策	☆工事	■H24.3完了							
			⑦ 麦生漁港	(漁港災害) 物揚場N=1式 他	施工準備 応急対策	☆工事	■H24.3完了							
			⑧ 久慈湊漁港	(漁港災害) 航路N=1式	施工準備 ☆応急対策		■H23.9完了							
			⑨ 舟渡漁港	(漁港災害) 護岸L=64m 他	施工準備 応急対策	☆工事		■H24.5完了						
			⑩ 小袖漁港	(漁港災害) 防波堤L=150m 他	施工準備 応急対策	☆工事		■H24.7完了						
港 湾	久 慈 港	国	湾口防波堤	(防波堤整備・直轄災害復旧) 防波堤L=3,800m		★工事(平成40年度完成目標)								
		県	堀込地区	(災害復旧) -4.5m岸壁L=180m、-6.0m岸壁L=497m、-2.0m物揚場L=105m	暫定供用	☆岸壁、☆物揚場		★航路・泊地浚渫						
			諏訪下地区	(災害復旧) 諏訪下防波堤L=5.0m、外防波堤L=293m、-7.5m岸壁L=281.6m、-10.0m岸壁L=23.7m	暫定供用	☆防波堤、☆岸壁、☆臨港道路		★航路・泊地浚渫						
			玉の脇地区	(災害復旧) 外防波堤L=297m、北防波堤L=152m、内防波堤L=95m、物揚場L=51m	暫定供用	☆防波堤、☆物揚場、☆臨港道路		★航路・泊地浚渫						
			半崎地区	(災害復旧) 半崎防波堤L=23m、波除堤L=40m、-4.0m物揚場L=69m 船揚場L=48m	暫定供用	☆防波堤、☆物揚場、☆臨港道路、☆船揚場		★航路・泊地浚渫						

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。




社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【県】県北広域振興局(0194-53-[以下のとおり])  
土木部(4990)、林務部(4984)、水産部(4985)  
農政部農村整備室(4988)  
【村】野田村復興むらづくり推進課(0194-78-2915)

安全・安心で活力あるむらづくり

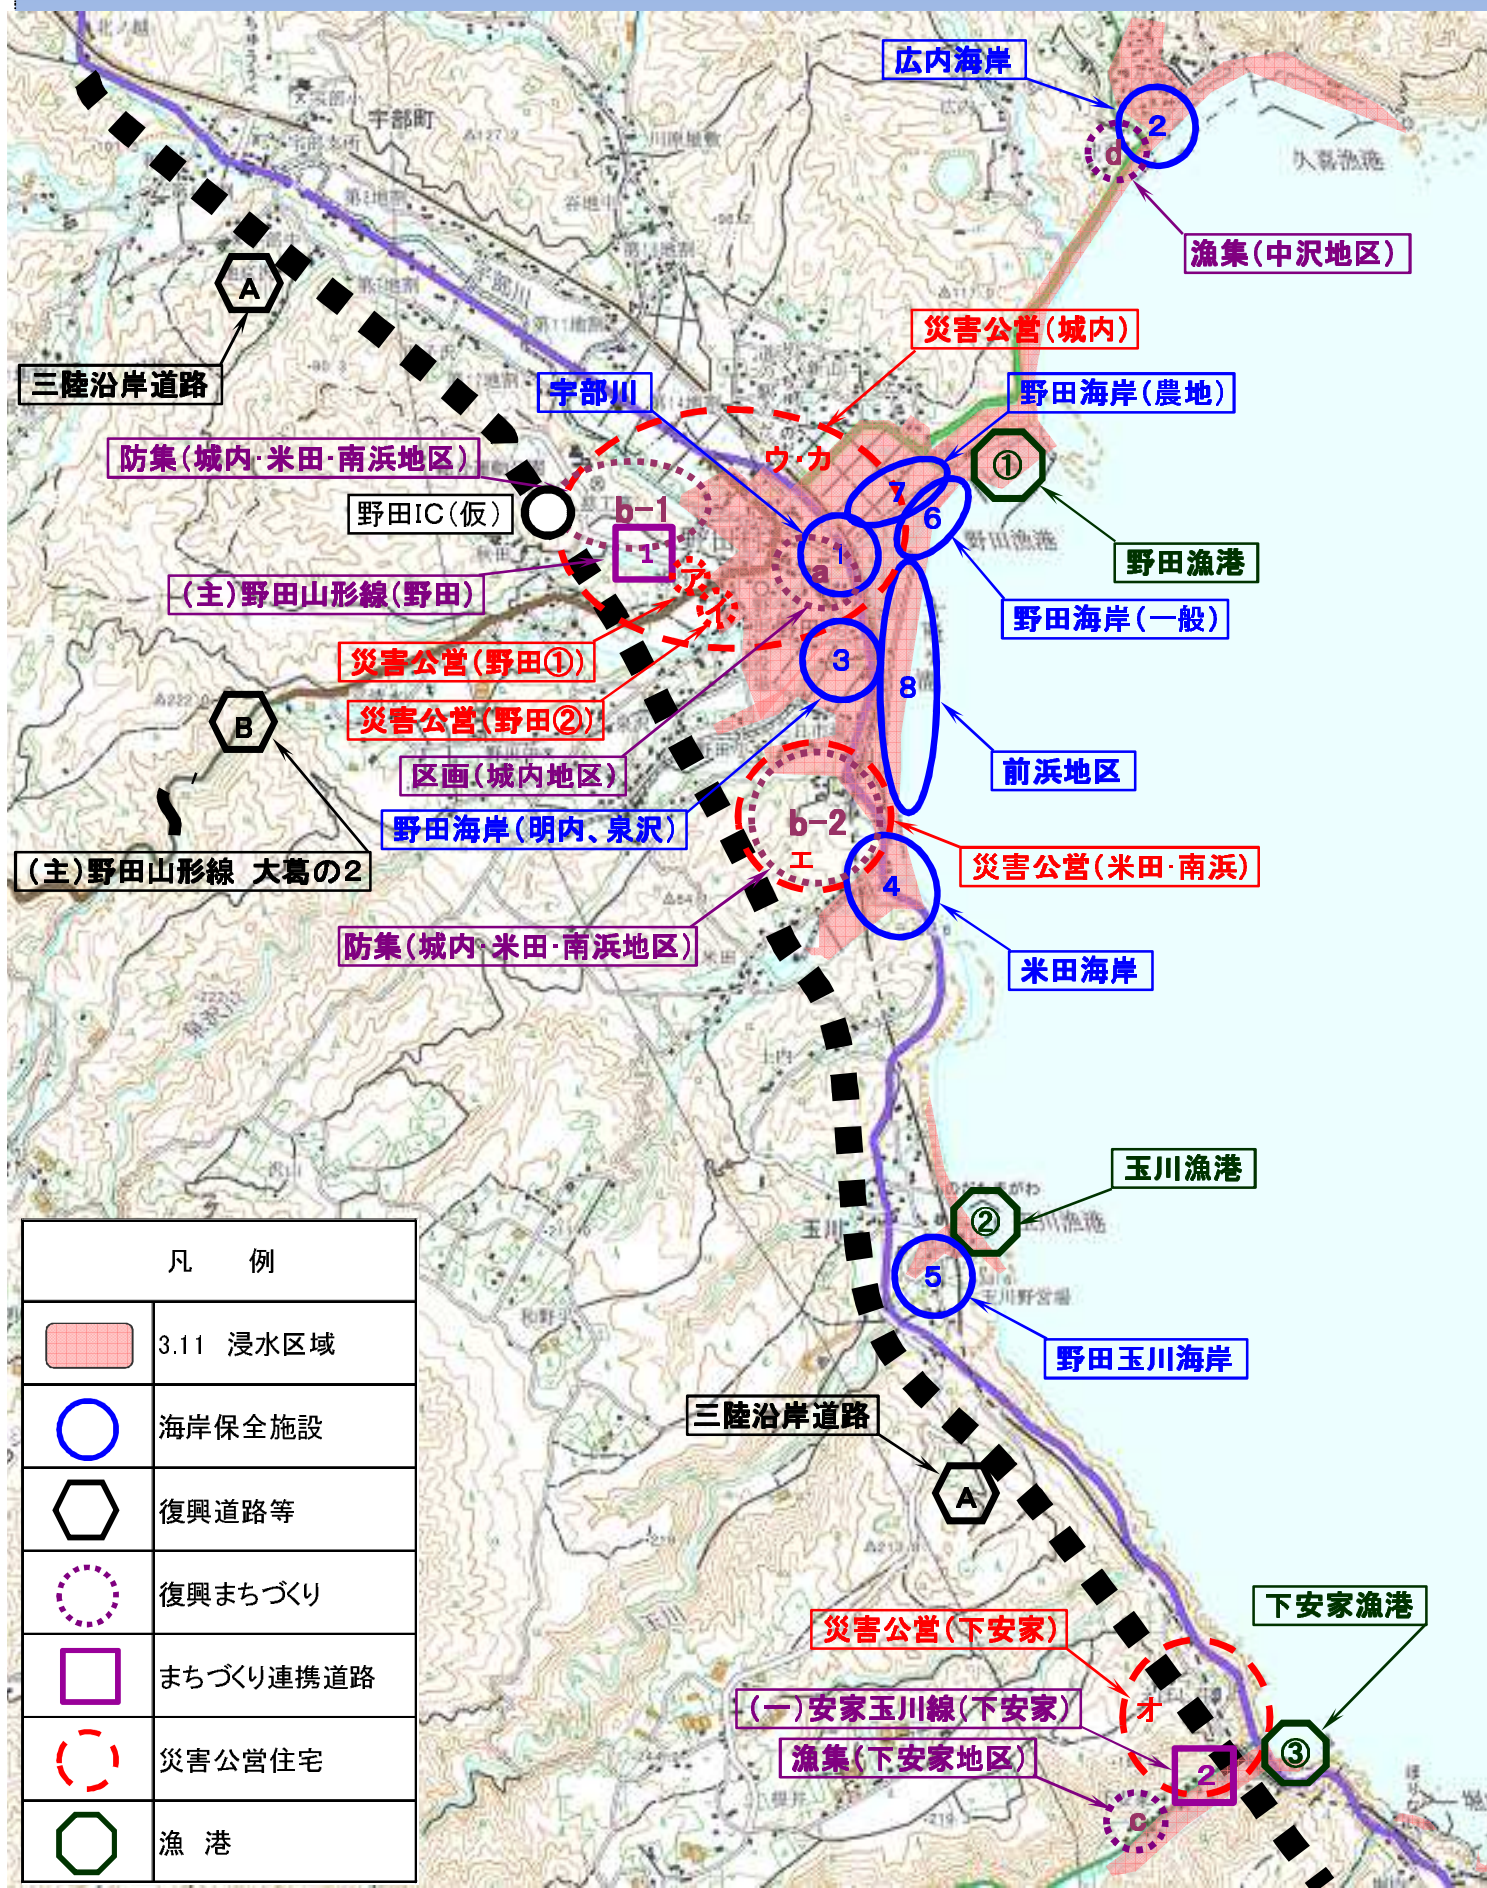

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇部川	(災害復旧) 水門設備1式他	施工準備		★工事								
			2 広内海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=4基他	施工準備			★工事							
			3 野田海岸 (明内、泉沢)	(災害復旧) 水門設備等1式他	施工準備	☆工事		■H25.3完了							
			4 米田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=2基他 (海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	施工準備		★工事								
			5 野田玉川海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.05km他 (海岸高潮)	施工準備	☆工事		■H25.5完了							
			6 野田海岸	防潮堤L=0.5km、 水門等N=1基	施工準備		★工事								
	農地海岸	県	7 野田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤裏法面 A=2,320㎡、 水門操作室N=1棟	施工準備	☆工事		■H24.8完了							
			林野海岸	8 前浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=1.3km	応急対策	施工準備		★工事						
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	野田久慈道路 (菅代～久慈)	(H23新規)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.27起工式									
	復興関連道路	県	B (主) 野田山形線	大葛の2	☆用地・工事の推進 (逐次供用開始)			■H25.7.2供用開始							
復興まちづくり	土地区画整理	村	a 城内地区	区域面積:12.9ha 対象戸数:135戸 (民124戸・公11戸)	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等			民71戸		民53戸 公11戸					
			b-1 城内・米田・ 南浜地区 (城内地区)	対象戸数:76戸 (民21戸・公55戸)	事業計画策定		民21戸		公55戸						
			b-2 城内・米田・ 南浜地区 (米田・南浜地区)	対象戸数:24戸 (民18戸・公6戸)	事業計画策定		民18戸		公6戸						
			c 下安家地区	集落道、用地造成 他 対象戸数:14戸 (民13戸・公1戸)	設計、用地等		民5戸		民8戸・公1戸						
			d 中沢地区	用地造成他 対象戸数:2戸 (民2戸)	設計、用地等		民2戸								
	漁業集落防災機能強化	村			事業準備		設計、用地等		工事						
			1 (主)野田山形線	野田	施工準備		★用地・工事の推進								
			2 (一)安家玉川線	下安家	施工準備		用地買収	★用地・工事の推進							
			災害公営住宅	直接建設	県	ア 野田① (単独)	木造2階 予定戸数:8戸	用地	設計 ☆工事		■H25.3完了				
						イ 野田② (単独)	木造平屋 予定戸数:18戸	用地	設計		★工事				
村	ウ-1 城内 (区:城内地区)	木造 予定戸数:11戸			用地・造成			設計		工事		11戸			
	ウ-2 城内 (防:城内地区)	木造 予定戸数:55戸			用地・造成			設計		工事		55戸			
	エ 米田・南浜 (防:米田・南浜地区)	木造 予定戸数:6戸			用地・造成			設計		工事		6戸			
	オ 下安家 (漁:下安家地区)	木造 予定戸数:1戸	用地・造成			設計		工事		1戸					
	カ 城内 (単独)	木造 予定戸数:2戸	用地		設計		工事		2戸						
漁港	漁港	県	① 野田漁港		(漁港災害) 防波堤L=125m、 崖壁L=307m 他	施工準備	★工事								
			② 玉川漁港		(漁港災害) 防波堤L=132m、 崖壁L=50m 他	施工準備	☆工事		■H24.9完了						
			③ 下安家漁港		(漁港災害) 防波堤L=28m 他	施工準備	☆工事		■H24.9完了						

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。




# 社会資本の復旧・復興ロードマップ

## 【普代村】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【県】県北広域振興局土木部(0194-53-4990)  
同 水産部(0194-53-4985)  
【村】普代村建設水産課 (0194-35-2116)

### あすへの一步 青い海(水産業)の復興へ

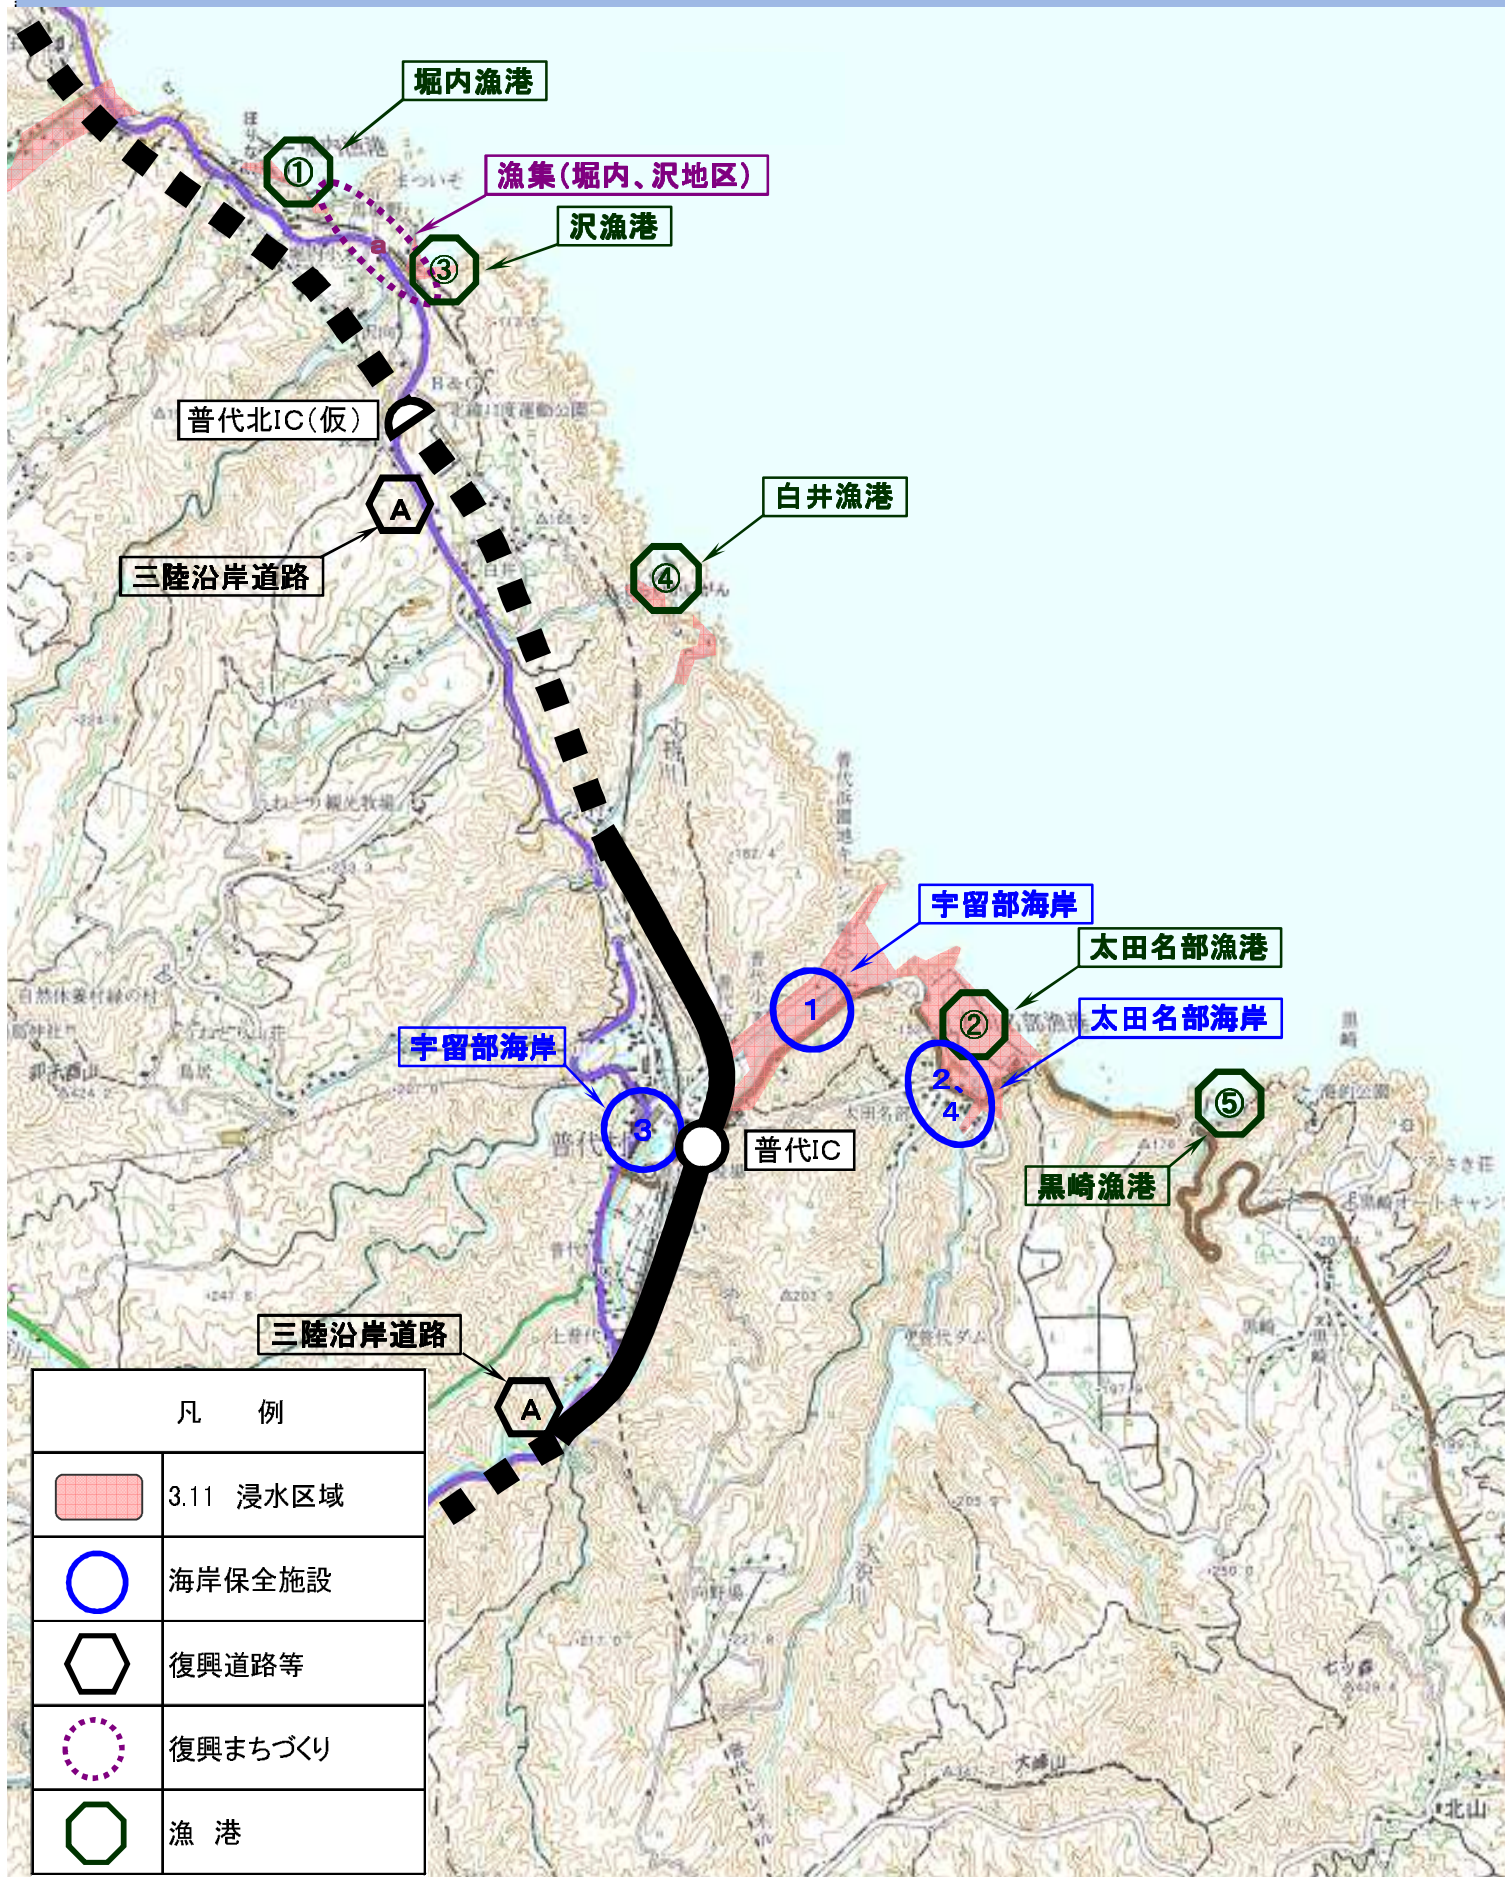

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇留部海岸	(災害復旧) 水門設備1式 他	施工準備	☆工事		■H25.10完了						
			2 太田名部海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km 他	施工準備	☆工事	■H24.10完了							
			3 宇留部海岸	(県単治水事業) 陸閘N=1基	施工準備	☆工事		■H25.10完了						
			4 太田名部海岸	(海岸危機) 陸閘等遠隔操作化 N=2基	施工準備				工事					
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	野田久慈道路 (普代～久慈)	(H23 新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.27起工式								
				普代道路 (普代バイパス)	(事業中)	☆用地・工事の推進		■H25.10.13供用開始						
				尾肝要普代道路 (尾肝要～普代)	(H23 新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.11.18起工式								
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 堀内、沢地区	避難路		事業準備	設計等	工事						
漁 港	漁 港	県	① 堀内漁港	(漁港災害) 防波堤N=1式 他	施工準備			■H25.10完了						
			② 太田名部漁港	(漁港災害) 防波堤L=285m、岸壁L=36m 他	施工準備			■H25.10完了						
		村	③ 沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=77m 他	施工準備			■H25.7完了						
			④ 白井漁港	(漁港災害) 防波堤L=89m、岸壁L=7m 他	施工準備		■H24.6完了							
			⑤ 黒崎漁港	(漁港災害) 泊地N=1式	施工準備		■H23.9完了							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。




# 社会資本の復旧・復興ロードマップ【田野畑村】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【県】岩泉土木センター (0194-22-3116)  
宮古水産振興センター (0193-64-2216)  
【村】田野畑村建設第二課 (0194-34-2111)

## 心をひとつに 未来に向けた復興

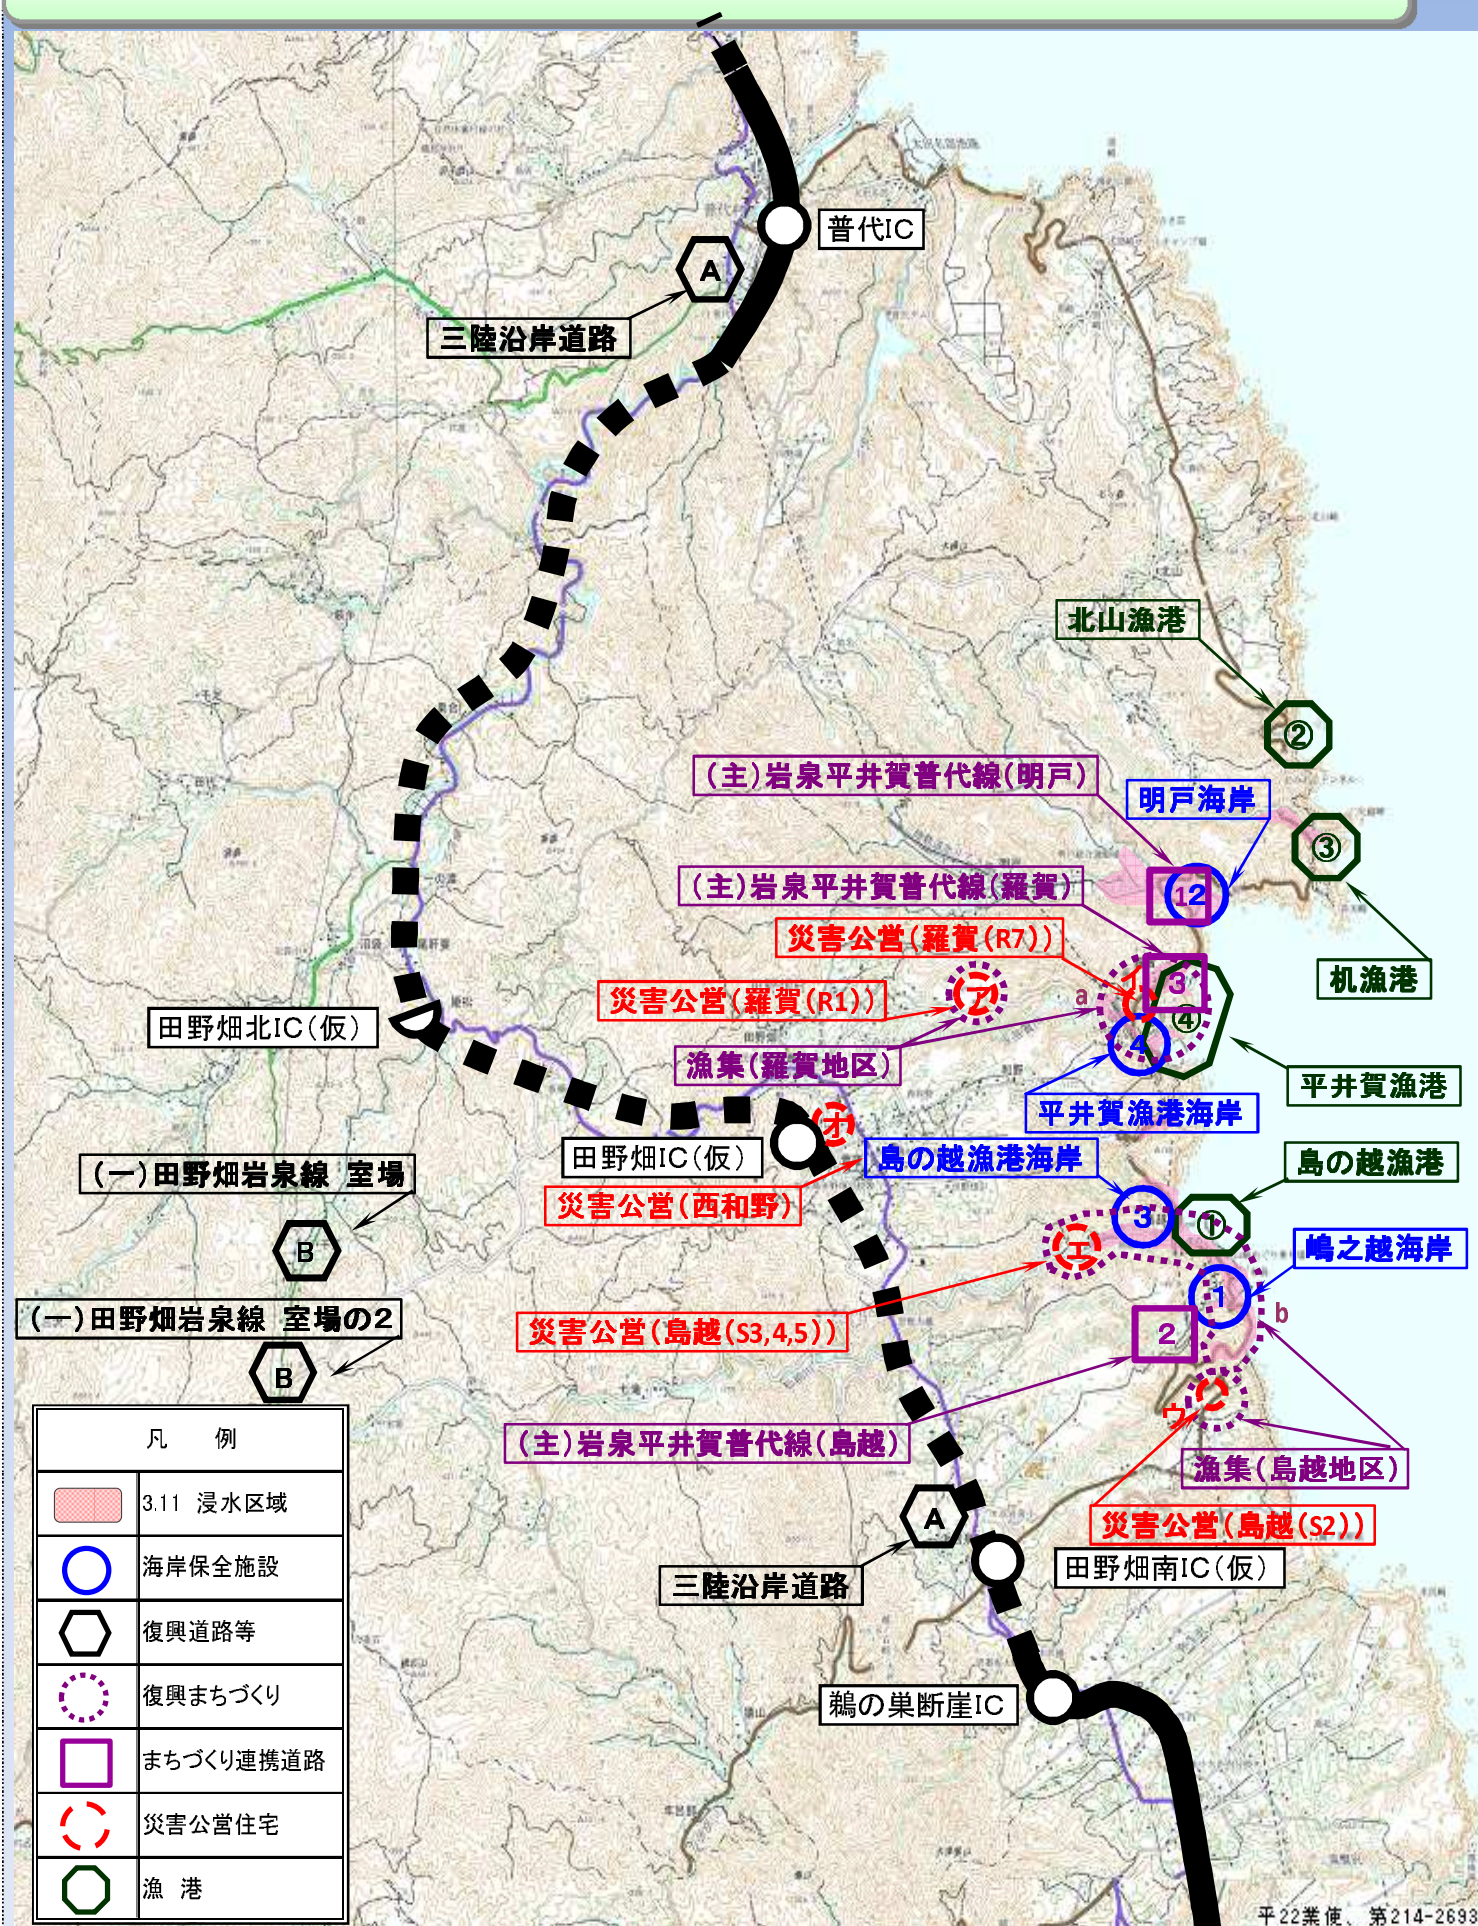

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 嶋之越海岸	(海岸危機) 防潮堤L=0.04km、 水門等N=2基	★工事 (防潮堤・水門)					工事 (遠隔設備)				
			2 明戸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	施工準備			★工事						
	漁港海岸	村	3-1 島の越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km 他	施工準備			工事						
			3-2 島の越(松前川地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.03km 水門N=1基 他			施工準備	工事						
	4 平井賀漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基 他	施工準備			工事								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	尾肝要普代道路 (尾肝要～普代)	(H23新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.11.18起工式								
				尾肝要道路	(事業中)	★用地・工事の推進								
				田野畑道路 (田野畑南～尾肝要)	(H23新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.11.7起工式								
	復興関連道路	県	B (一) 田野畑岩泉線	室場	☆工事の推進	■H24.3.27供用開始								
室場の2				(事業中)	★用地・工事の推進(逐次供用開始)									
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 羅賀地区	集落道、用地造成 他 対象戸数:45戸 (民18戸・公27戸)	事業準備	設計、用地等		民6戸・公7戸	民12戸・公20戸					
				★宅地造成工事	集落道工事等									
	b 島越地区	集落道、用地造成 他 対象戸数:69戸 (民35戸・公34戸)	事業準備	設計、用地等		民6戸・公10戸	民29戸・公24戸							
		★宅地造成工事	集落道工事等											
	まちづくり連携道路	県	1 (主)岩泉平井賀普代線	明戸		施工準備		用地買収	★用地・工事の推進					
				2 (主)岩泉平井賀普代線	島越		施工準備			用地買収	用地・工事の推進			
					3 (主)岩泉平井賀普代線	羅賀		施工準備			用地買収	用地・工事の推進		
	災害公営住宅	買取	村	ア 羅賀R1地区(漁:羅賀地区)		木造 予定戸数:20戸		用地・造成		設計	20戸			
				イ 羅賀R7地区(漁:羅賀地区)	木造 予定戸数:7戸		用地・造成		設計	7戸				
				ウ 島越S2地区(漁:島越地区)	木造 予定戸数:24戸		用地・造成		設計	24戸				
エ 島越S3.4.5地区(漁:島越地区)				木造 予定戸数:10戸		用地・造成		設計	10戸					
オ 西和野地区(単独)				木造 予定戸数:2戸		用地			設計	2戸				
漁港	漁港	県	① 島の越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,002m、 岸壁L=561m 他	施工準備	★工事								
			② 北山漁港	(漁港災害) 臨港道路L=155m	施工準備	★工事		■H25.3完了						
		村	③ 机漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=101m 他	施工準備	★工事								
			④ 平井賀漁港	(漁港災害) 防波堤L=666m、 岸壁L=193m 他	施工準備	★工事								

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。




社会資本の復旧・復興ロードマップ【岩泉町】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先  
【県】岩泉土木センター(0194-22-3116)、  
宮古水産振興センター(0193-64-2216)  
【町】岩泉町地域整備課、教育委員会事務局(0194-22-2111)

心はひとつ いのちの海に 未来を拓く岩泉

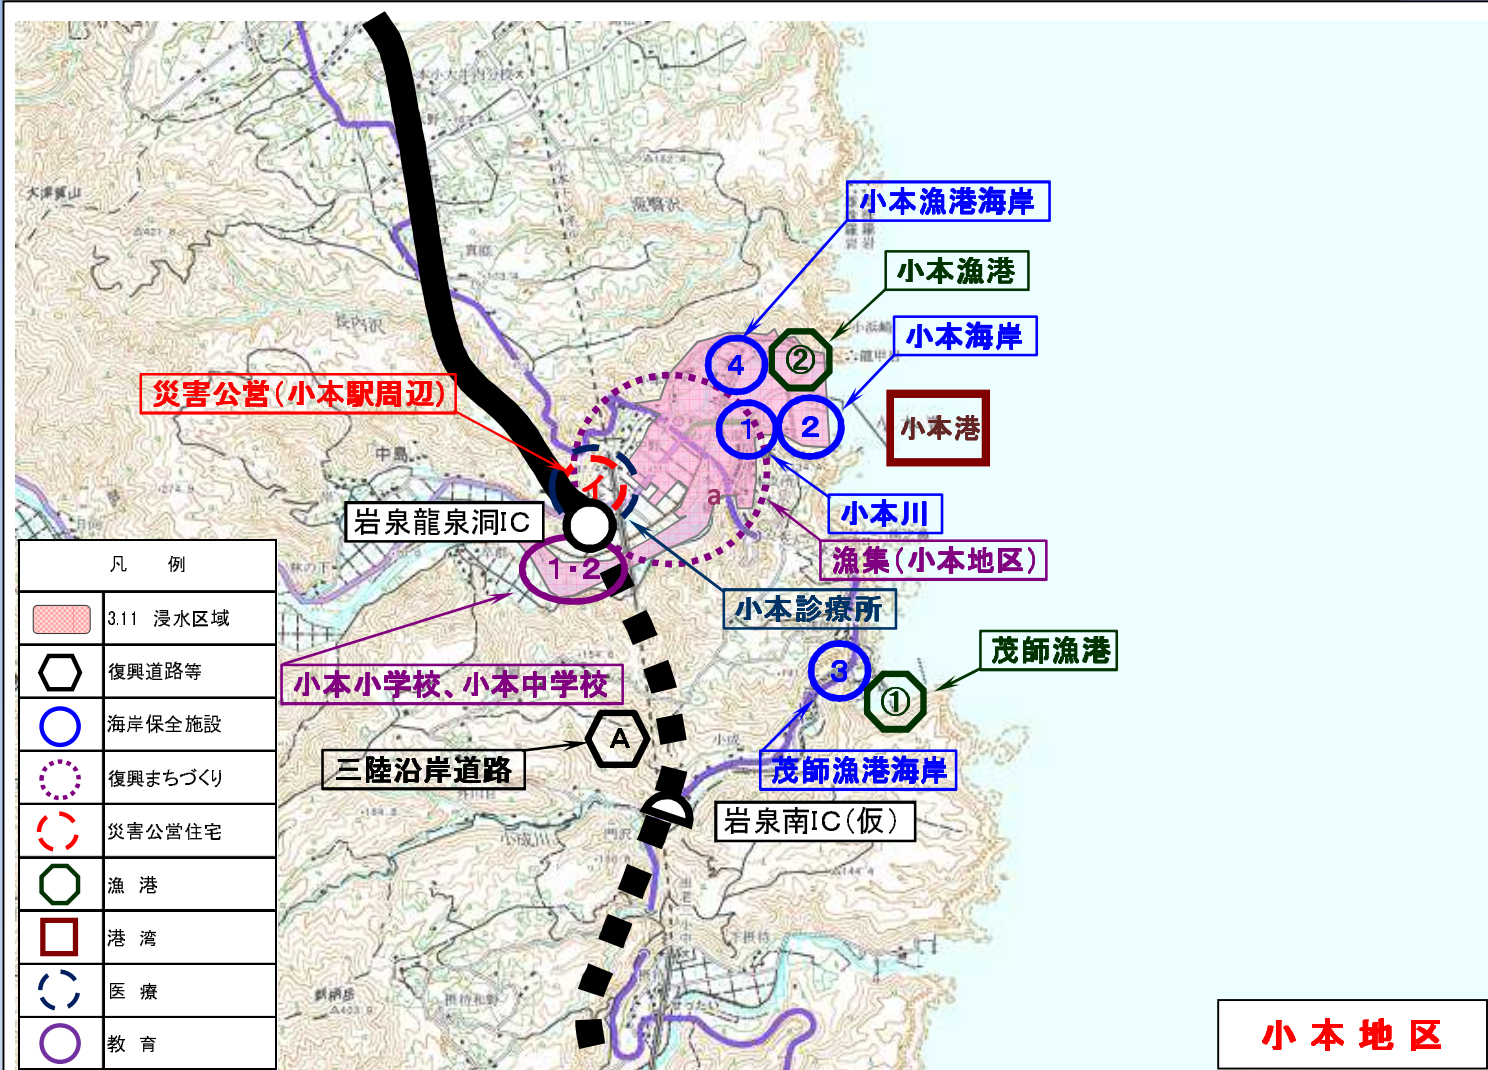


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 小本川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.2km	施工準備			★工事						
			2 小本海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km	施工準備	☆工事	■H25.3完了							
	漁港海岸	町	3 茂師漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、水門N=1基 他	施工準備			★工事						
			4 小本漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	応急対策	施工準備	☆工事	■H25.3完了						
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	田老岩泉道路 (田老～岩泉)	(H23新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.3.27起工式								
	復興支援道路	県	B (主) 久慈岩泉線	龍泉洞 大月峠	☆用地・工事の推進 (逐次供用開始)	■H24.8.28供用開始		★用地・工事の推進 (逐次供用開始)						
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	町	a 小本地区	集落道、用地造成 他 対象戸数: 60戸 (民60戸)	事業準備	設計・用地等	★工事							
災害公営住宅	直接建設	町	A 森の越 (単独)	木造 予定戸数: 15戸		設計	☆工事	■H25.5完了						
			I 小本駅周辺 (単独)	木造 予定戸数: 20戸 RC造 予定戸数: 16戸		用地・造成	設計	★工事						
漁港	漁港	県	① 茂師漁港	(漁港災害) 防波堤L=493m、岸壁L=280m 他	施工準備	★工事								
		町	② 小本漁港	(漁港災害) 防波堤L=103m、岸壁L=844m 他	施工準備	★工事								
港湾	小本港	県	小本浜地区	(港湾災害復旧) 防波堤L=871m、岸壁L=119m、物揚場L=105m他	施工準備	★工事								
医療	医科診療所	町	小本診療所	診療所施設整備		設計	★工事							
教育	小学校	町	1 小本小学校	(災害復旧) 移転	事業準備・住民合意	用地取得・設計	★造成工事	移転完了まで仮設校舎を使用			校舎・体育館等建設			
	中学校		2 小本中学校	(災害復旧) 移転	事業準備・住民合意	用地取得・設計	★造成工事	移転完了まで仮設校舎を使用			校舎・体育館等建設			

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。



市民生活の安定と再建

安全で快適な生活環境の実現

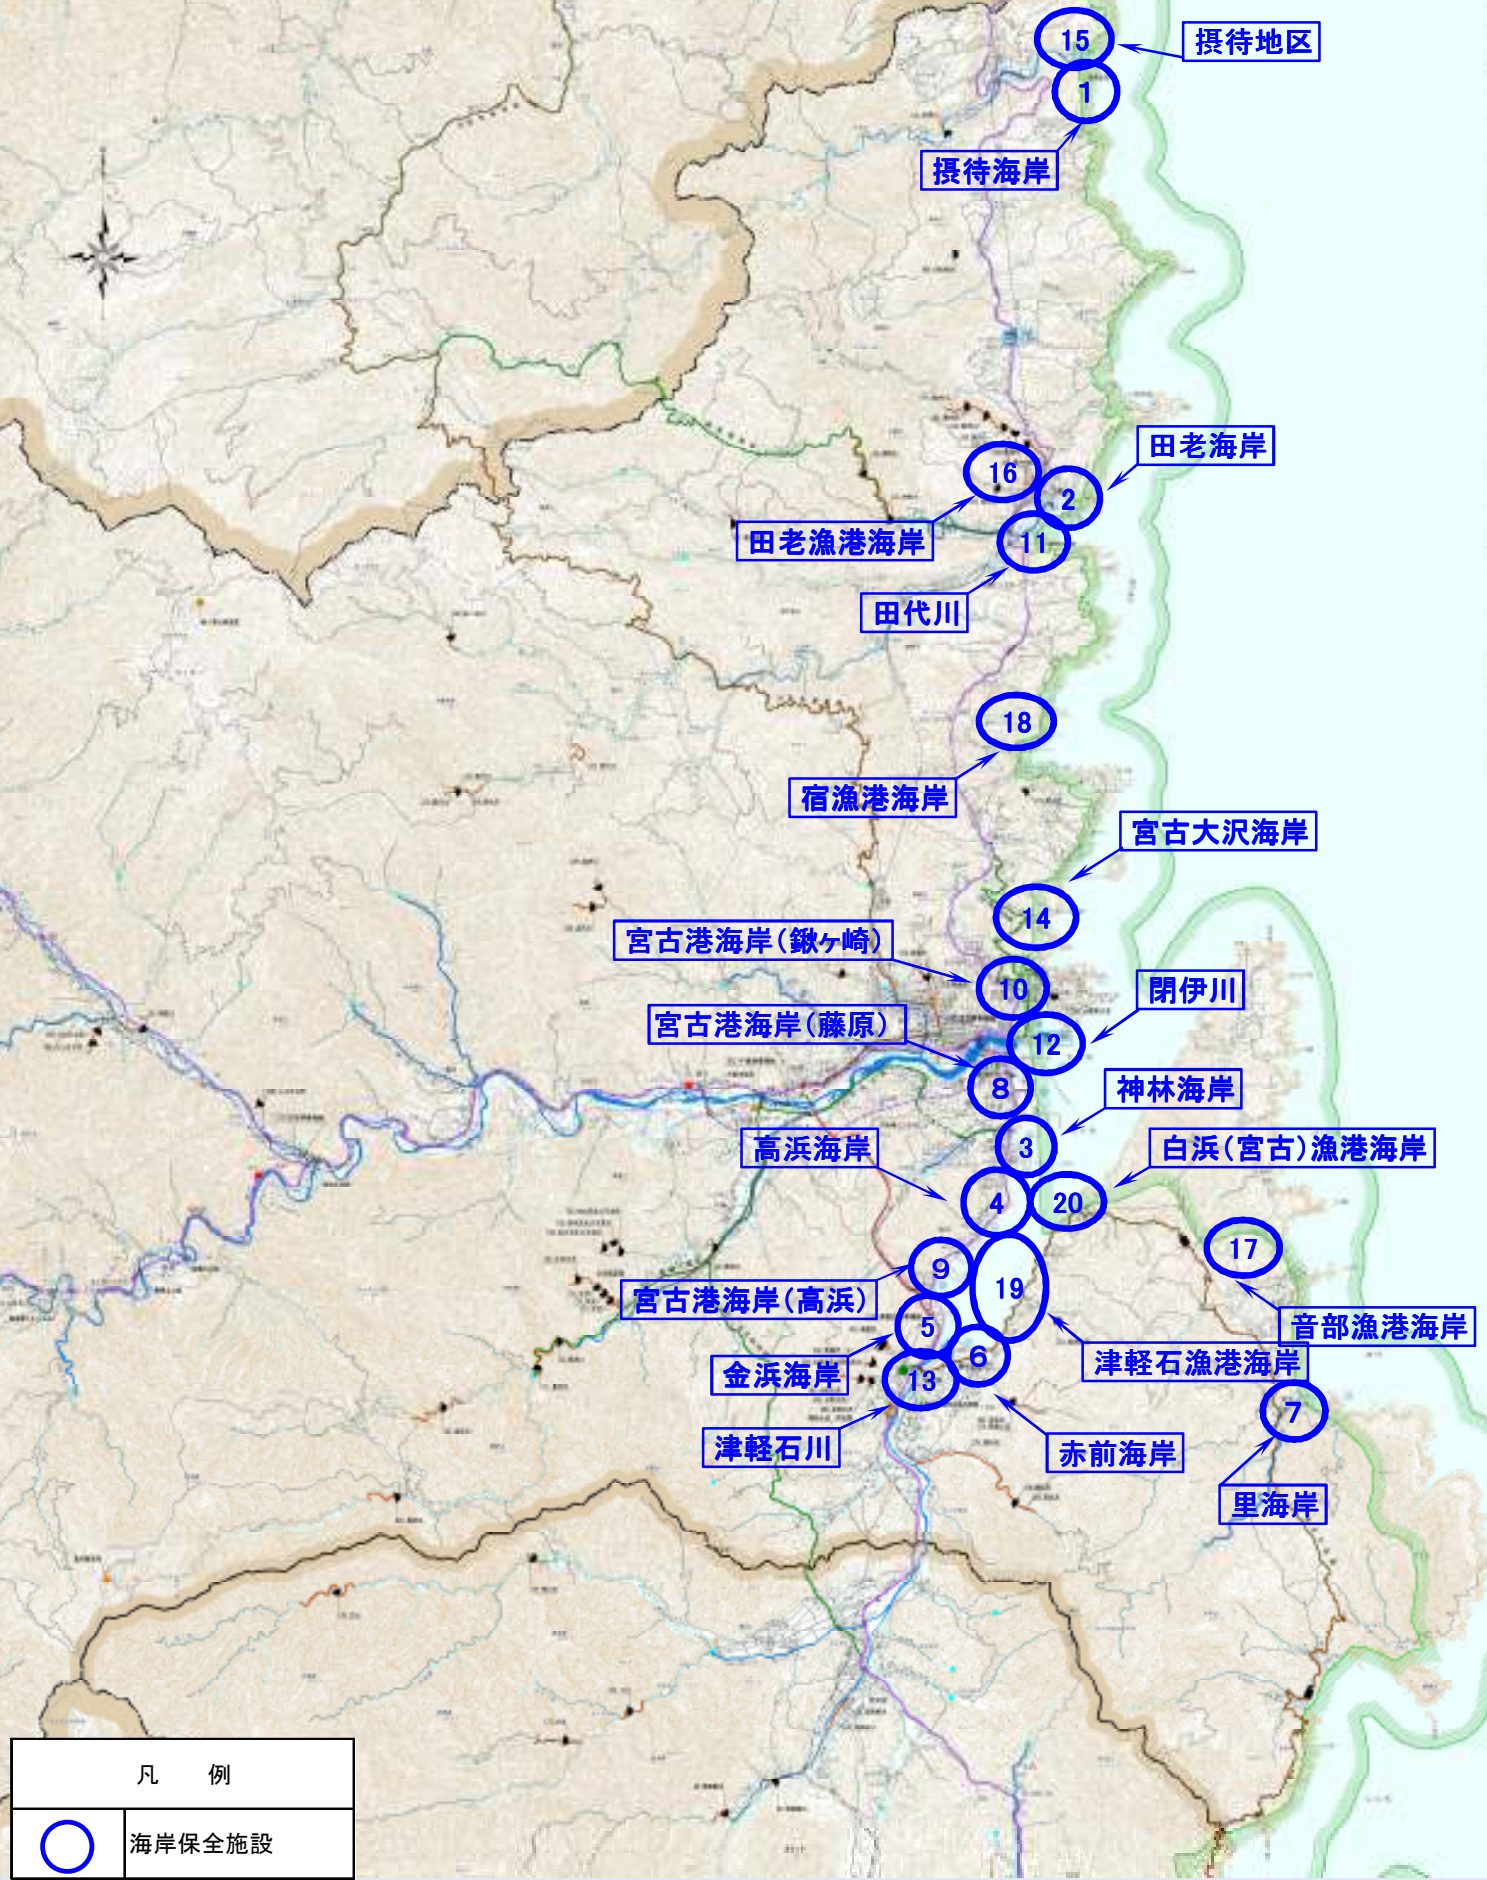

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 摂待海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基	施工準備					工事					
			2 田老海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門等N=4基 (海岸危機) 水門等遠隔操作化N=1基	施工準備		★工事								
			3 神林海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門等N=7基 (海岸危機) 陸間等遠隔操作化N=1基	施工準備			★工事		工事					
			4 高浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 陸間等N=4基	施工準備		★工事								
				(港湾高潮) 防潮堤L=0.9km	施工準備			★工事							
				(海岸危機) 陸間等遠隔操作化N=4基	施工準備			工事							
			5 金浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、 陸間等N=5基	施工準備				★工事						
			6 赤前海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 樋門N=1基	施工準備		★工事								
			7 里海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 樋門N=1基	施工準備		★工事								
			8 宮古港海岸 (藤原)	(港湾高潮・災害) 防潮堤L=2.2km、 陸間N=4基	施工準備			工事							
			9 宮古港海岸 (高浜)	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 陸間N=1基	施工準備			工事							
			10 宮古港海岸 (鍛ヶ崎)	(港湾高潮) 防潮堤L=0.7km	施工準備				工事						
			11 田代川	(災害復旧) 水門N=1基	施工準備			★工事							
	12 閉伊川	(災害復旧) 水門N=1基	施工準備				★工事								
	13 津軽石川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.9km	施工準備			★工事									
	農地海岸	市	14 宮古大沢海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.1km 水門等N=3基	施工準備		★工事								
	林野海岸		15 摂待地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=0.3km	施工準備		★工事								
	漁港海岸		16 田老漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門N=4基 他	施工準備		★工事								
			17 音部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基 他	施工準備			工事							
			18 宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	施工準備		★工事								
19 津軽石 漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=1基 他	施工準備			★工事								
20 白浜(宮古) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他		施工準備			★工事									

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。




社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市 2/4】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【県】宮古土木センター(0193-64-2221)  
【市】宮古市都市計画課、水産課(0193-62-2111)

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

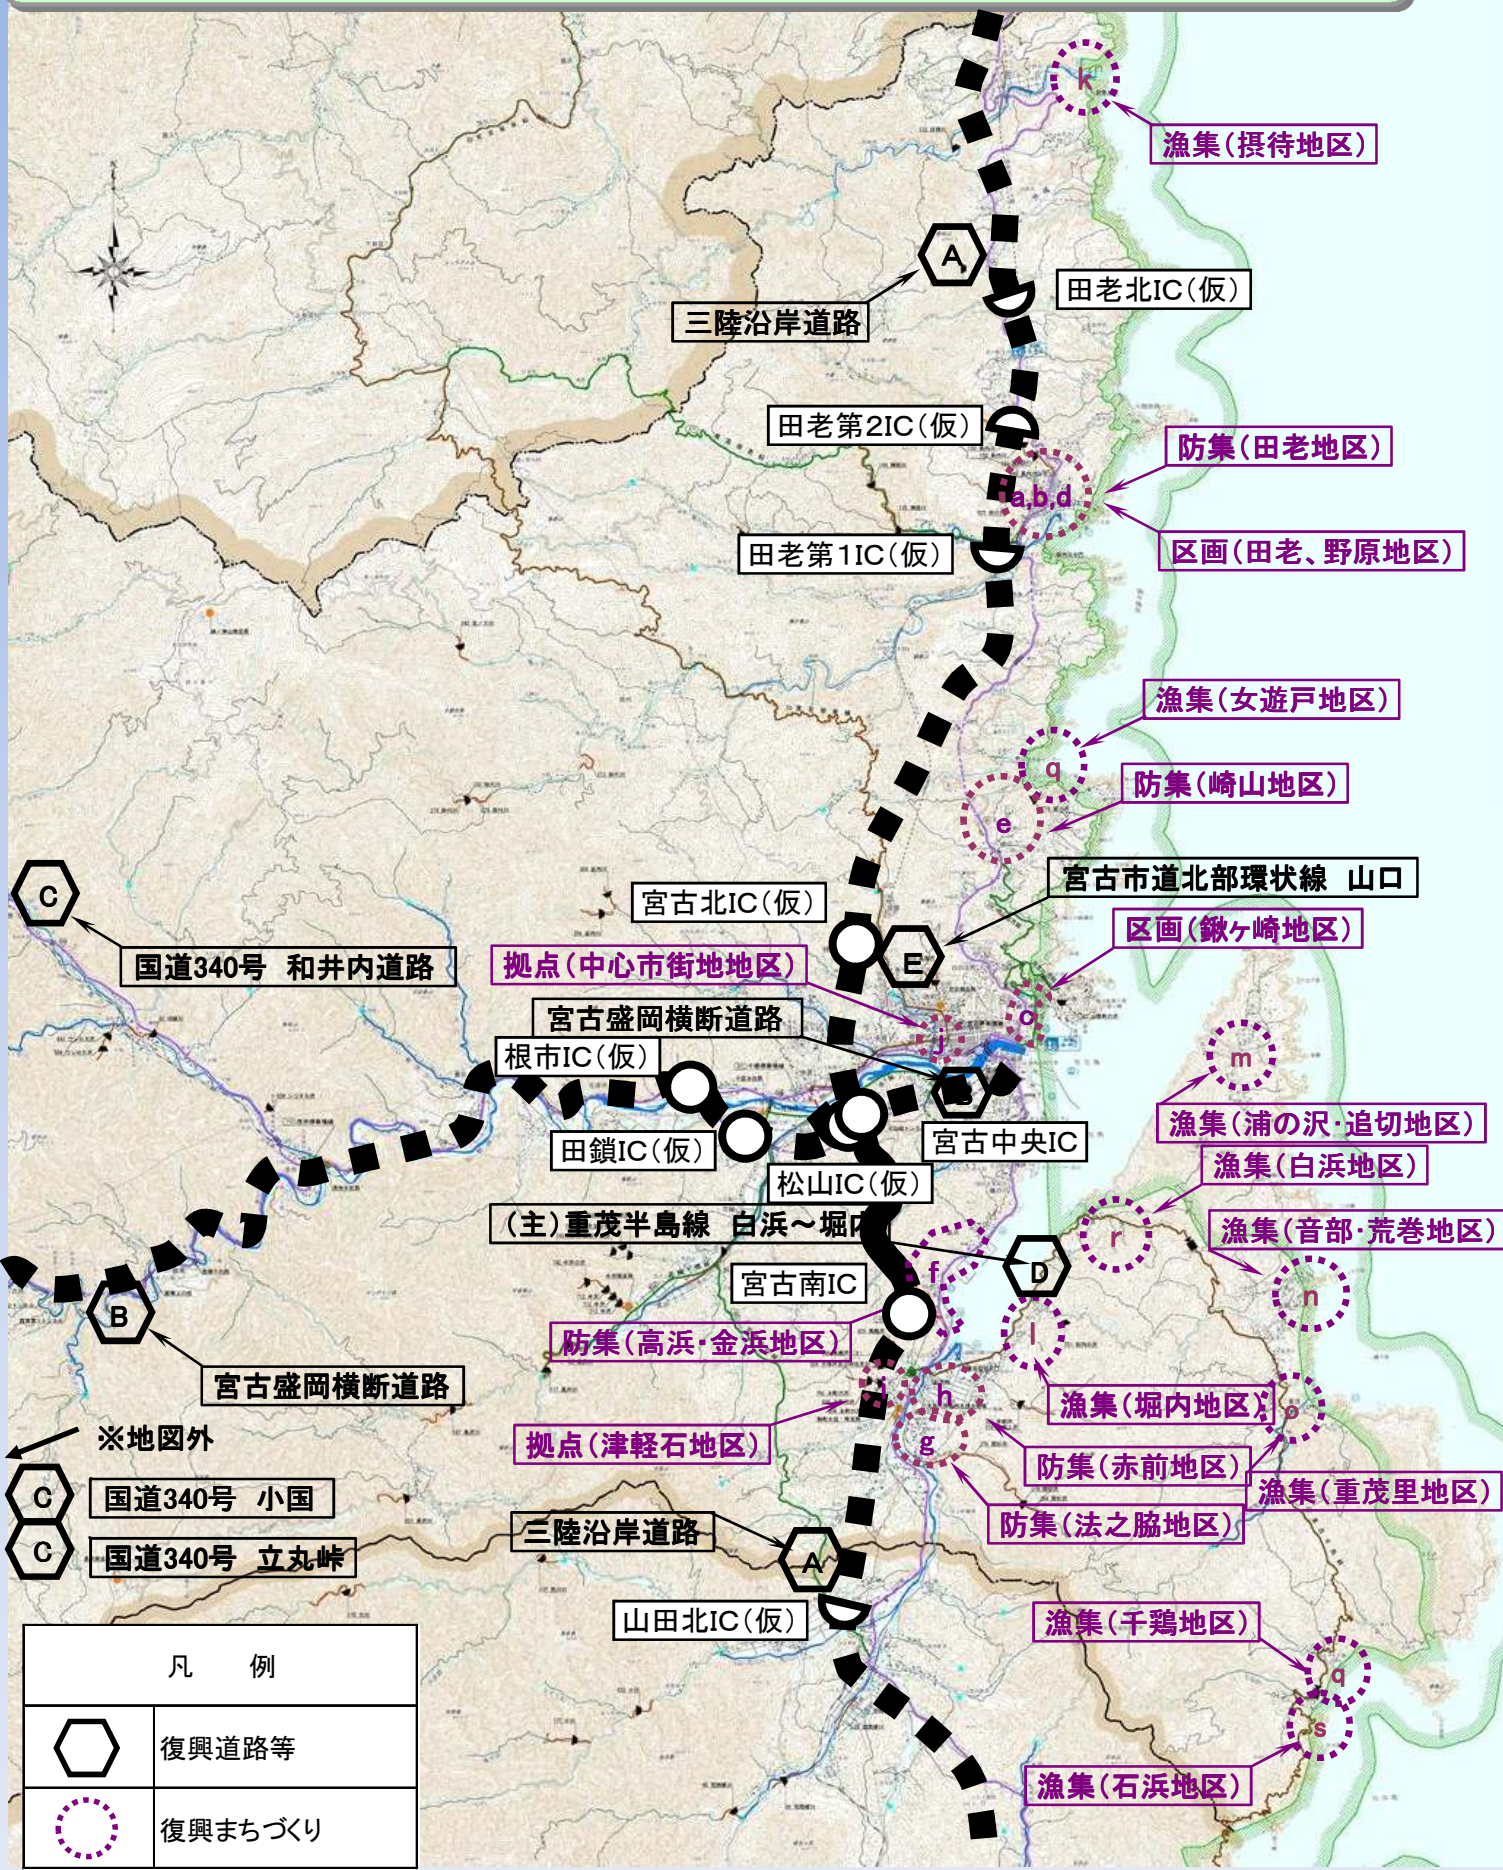


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	田老岩泉道路(田老～岩泉)	(H23新規)事業準備		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H23.3.27起工式							
				宮古田老道路(宮古中央～田老)	(H23新規)事業準備		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H24.11.18起工式							
				宮古道路(宮古中央インター線)	(事業中)	★用地・工事の推進	■H25.3.23「宮古中央インター線(千徳大橋)」供用開始							
				山田宮古道路(山田～宮古南)	(H23新規)事業準備		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.17起工式							
				宮古箱石道路(宮古～箱石)	(H23新規)事業準備		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.11.30起工式							
	復興支援道路	県	B 宮古盛岡横断道路	平津戸松草道路(平津戸・岩井～松草)	(H23新規)事業準備		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
				区界道路(区界～築川)	(H23新規)事業準備		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
				宮古西道路	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
				小国	(事業中)★用地・工事の推進 (逐次供用開始)			■H25.11.29供用開始						
				和井内道路	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
復興まちづくり	復興関連道路	市	C 国道340号	立丸峠		(H24新規)施工準備	用地買収	用地・工事の推進 (逐次供用開始)						
				D (主)重茂半島線	白浜～堀内	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)							
				E 宮古市道北部環状線	山口	(事業中)	★工事の推進							
				a 田老地区	区域面積：19.0ha 対象戸数：220戸 (民180戸・公40戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	★造成工事	順次住宅建設					
				b 野原地区	区域面積：15.8ha	事業準備・住民合意	都市計画決定等	造成工事	順次産業系の土地利用					
	土地区画整理	市	c 鎌ヶ崎・光岸地区	区域面積：23.8ha 対象戸数：270戸 (民230戸・公40戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	★造成工事	順次住宅建設						
				d 田老地区	対象戸数：285戸 (民203戸・公82戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★移転先造成工事	順次住宅建設					
				e 崎山地区	対象戸数：約30戸 (民6戸・公24戸)	事業準備・住民合意	事業計画、★工事	順次住宅建設	■H25.12完了					
				f 高浜・金浜地区	対象戸数：63戸 (民47戸・公16戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★移転先造成工事	順次住宅建設					
				g 法之脇地区(津軽石)	対象戸数：12戸 (民12戸)	事業準備・住民合意	事業計画、設計、用地取得	★造成工事	順次住宅建設					
				h 赤前地区	対象戸数：56戸 (民56戸)	事業準備・住民合意	事業計画、設計、用地取得	★移転先造成工事	順次住宅建設					
				i 津軽石地区	区域面積：約1.2ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業認可・調査設計	用地取得	造成工事・建築工事					
				j 中心市街地地区	区域面積：検討中	事業準備・住民合意								
				k 摂待地区	集落道、用地造成他 対象戸数：3戸 (民3戸)	事業準備・住民合意	事業計画、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設	■H25.7完了				
				l 堀内地区(小堀内)	集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
	津波復興拠点	市	m 浦の沢・追切地区	集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	事業準備・住民合意	事業計画、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設	■H25.3完了					
				n 音部地区	集落道、用地造成他 対象戸数：3戸 (民3戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				o 重茂里地区	集落道、用地造成他 対象戸数：20戸 (民16戸・公4戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				p 千鶴地区	集落道、用地造成他 対象戸数：3戸 (民3戸)	事業準備・住民合意	事業計画、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設	■H25.12完了				
				q 女遊戸地区	集落道他	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				r 白浜地区	集落道他	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				s 石浜地区	集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
	漁業集落防災機能強化	市	漁集(千鶴地区)	集落道、用地造成他 対象戸数：3戸 (民3戸)	事業準備・住民合意	事業計画、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設						
				漁集(石浜地区)	集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				漁集(浦の沢・追切地区)	集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	事業準備・住民合意	事業計画、設計、用地取得	★造成工事	順次住宅建設					
				漁集(白浜地区)	集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	事業準備・住民合意	事業計画、設計、用地取得	★造成工事	順次住宅建設					
				漁集(音部・荒巻地区)	集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	事業準備・住民合意	事業計画、設計、用地取得	★造成工事	順次住宅建設					

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。



市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

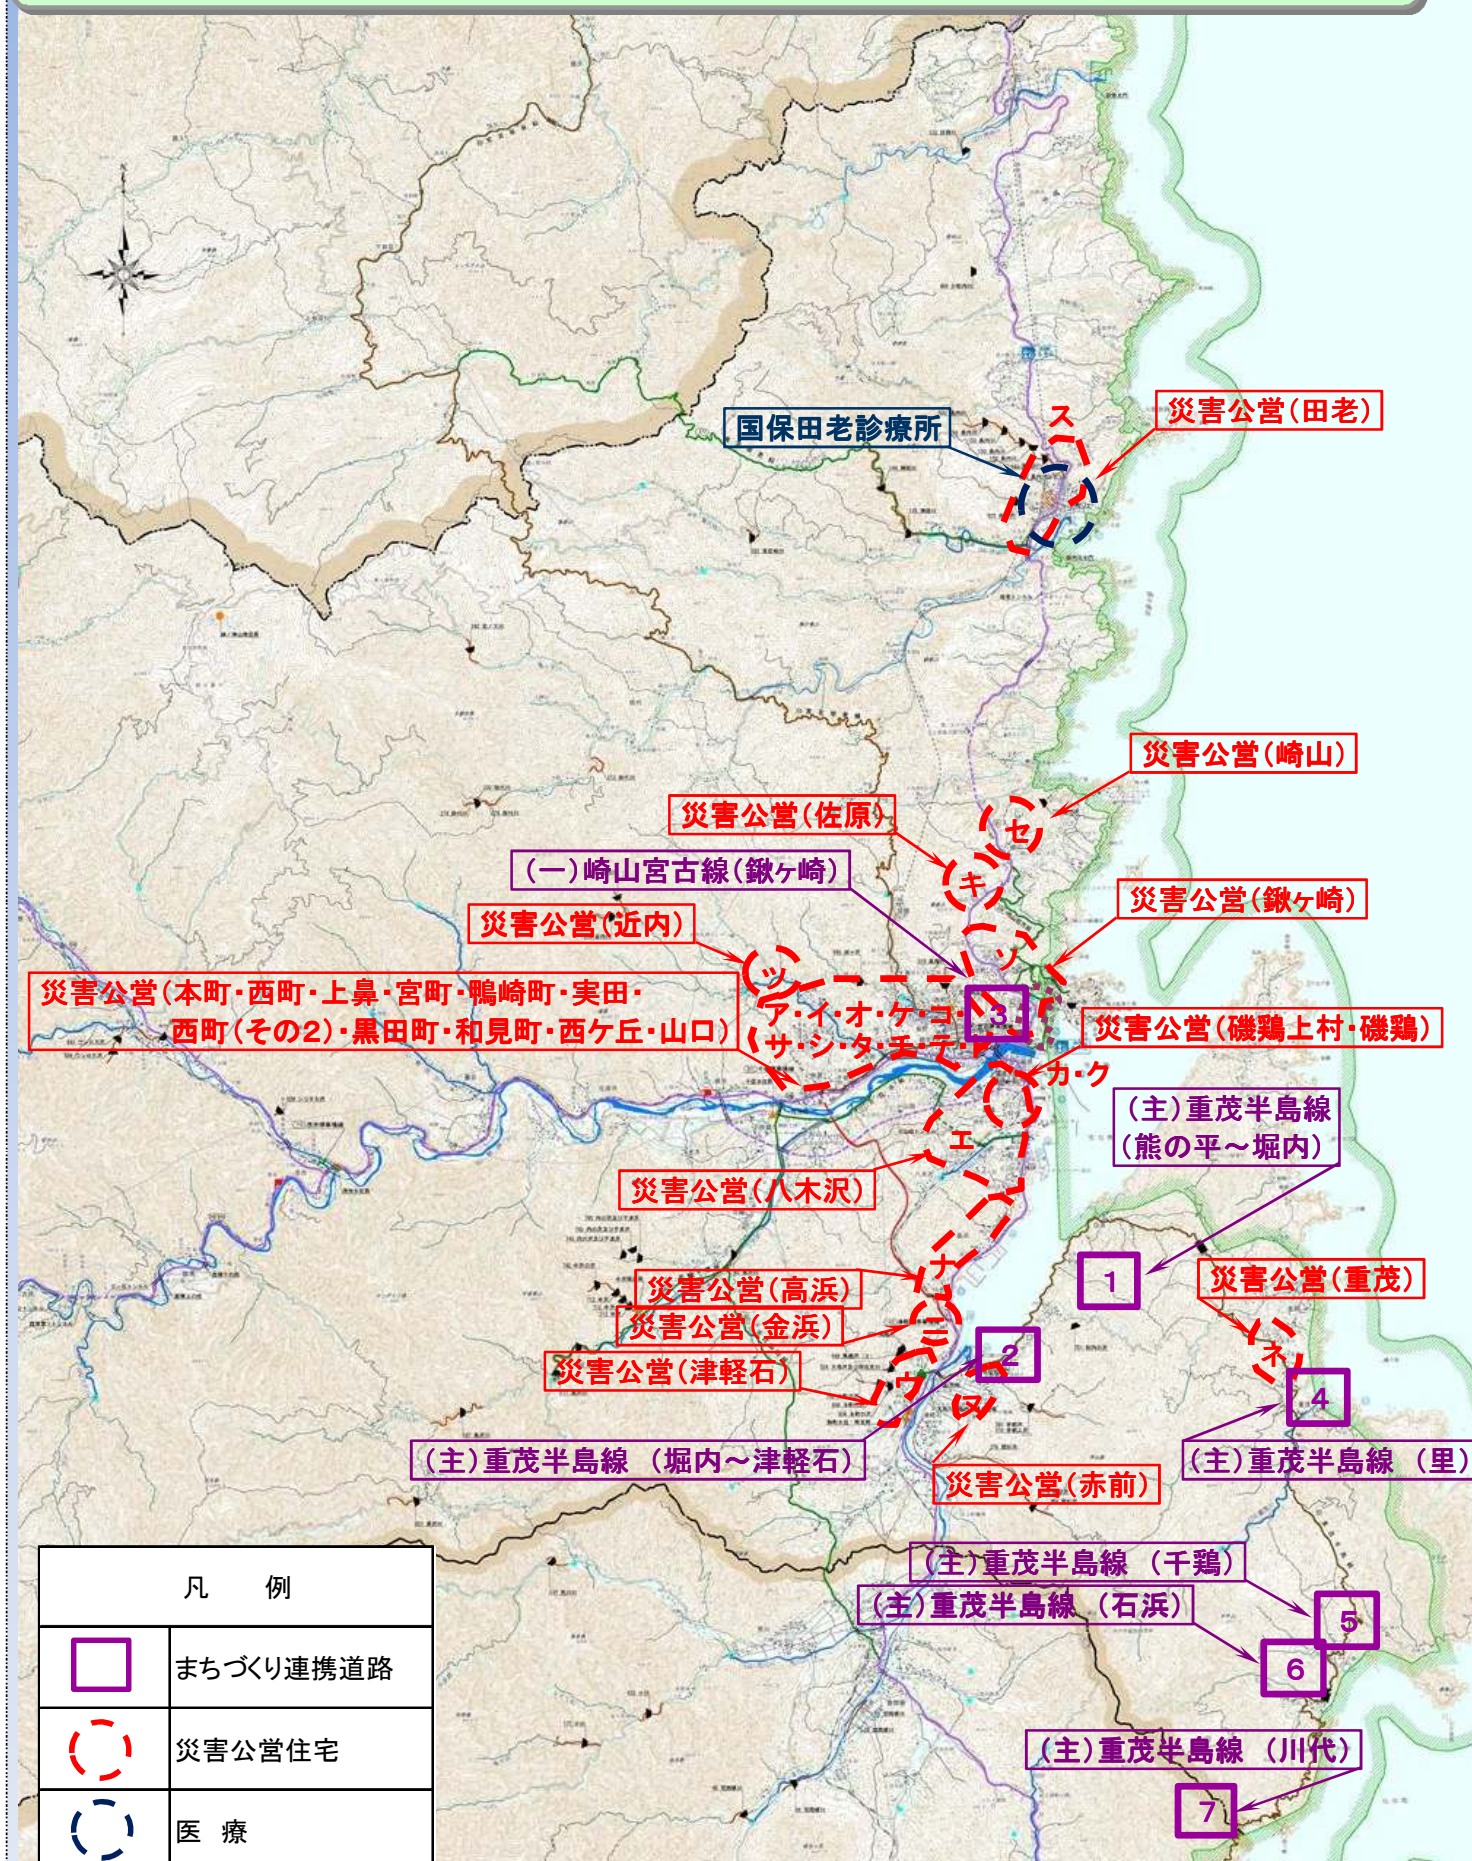


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1 (主)重茂半島線	熊の平～堀内		施工準備	用地	用地・工事の推進							
			2 (主)重茂半島線	堀内～津軽石		施工準備	用地	用地・工事の推進							
			3 (一)崎山宮古線	鍛ヶ崎		施工準備	用地	用地・工事の推進							
			4 (主)重茂半島線	里		施工準備	用地	用地・工事の推進							
			5 (主)重茂半島線	千鷲		施工準備	用地	用地・工事の推進							
			6 (主)重茂半島線	石浜		施工準備	用地	用地・工事の推進							
			7 (主)重茂半島線	川代		施工準備	用地	用地・工事の推進							
災害公営 住宅	直接建設	県	ア 本町 (単独)	RC造8階 予定戸数:34戸		用地	設計	34戸 工事							
			イ 西町 (単独)	RC造4階 予定戸数:23戸		用地	設計	23戸 工事							
			ウ 津軽石 (単独)	RC造5階 予定戸数:35戸		用地	35戸 設計・工事								
	設計・施工 一括選定	県	エ 八木沢 (単独)	RC造5階 予定戸数:50戸		用地	50戸 設計・工事								
			オ 上鼻 (単独)	RC造5階 予定戸数:30戸		用地	30戸 設計・工事								
			カ 磯鷲上村 (単独)	予定戸数:24戸		用地	24戸 設計・工事								
	敷地提案型 買収	県	キ 佐原 (単独)	RC造 予定戸数:50戸		用地・造成	設計	50戸 工事							
			ク 磯鷲 (単独)	S造 予定戸数:30戸		用地・造成	設計	30戸 工事							
			ケ 宮町 (単独)	S造 予定戸数:20戸		用地・造成	設計	20戸 工事							
			コ 鴨崎町 (単独)	S造3階 予定戸数:20戸			設計	20戸 工事							
			サ 実田 (単独)	S造3階 予定戸数:17戸			設計	17戸 工事							
			シ 西町(その2) (単独)	RC造5階 予定戸数:30戸		設計	30戸 工事								
	直接建設	市	ス-1 田老(高台) (防:田老地区)	RC造 予定戸数:82戸		用地・造成	設計	82戸 工事							
			ス-2 田老 (区:田老地区)	予定戸数:40戸		用地	設計	40戸 工事							
			セ 崎山 (防:崎山地区)	予定戸数:24戸		用地	設計	24戸 工事							
			ソ-1 鍛ヶ崎 (単独)	予定戸数:26戸		用地・造成	設計	26戸 工事							
			ソ-2 鍛ヶ崎 (区:鍛ヶ崎地区)	予定戸数:40戸		用地	設計	40戸 工事							
			タ 黒田町 (単独)	予定戸数:24戸		用地	設計	24戸 ★工事							
			チ 和見町 (単独)	予定戸数:23戸		用地	設計	23戸 ★工事							
			ツ-1 近内 (単独)	RC造 予定戸数:40戸		用地	設計	40戸 ★工事							
			ツ-2 近内 (単独)	RC造 予定戸数:40戸		用地	設計	40戸 工事							
			テ 西ヶ丘 (単独)	予定戸数:24戸		用地	設計	24戸 工事							
			ト 山口 (単独)	予定戸数:21戸			用地	設計	21戸 工事						
			ナ 高浜 (単独)	予定戸数:12戸		用地	設計	12戸 ★工事							
			ニ 金浜 (防:金浜地区)	予定戸数:16戸		用地	16戸 設計 工事								
			ヌ 赤前 (単独)	予定戸数:14戸		用地	設計	14戸 ★工事							
			ノ 重茂 (漁:重茂里地区)	予定戸数:4戸		用地	設計	4戸 工事							
	医 療	医科診療所	市	国保田老診療所	診療所施設整備				用地・設計・工事						
	教 育	小学校	市	1 鶴磯小学校	学校統合(予定)		住民合意	統合準備	H26 重茂小学校に統合予定 統合までの期間、重茂小学校を使用						
2 千鷲小学校				学校統合(予定)		住民合意	統合準備	H26 重茂小学校に統合予定 統合までの期間、重茂小学校を使用							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。



市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

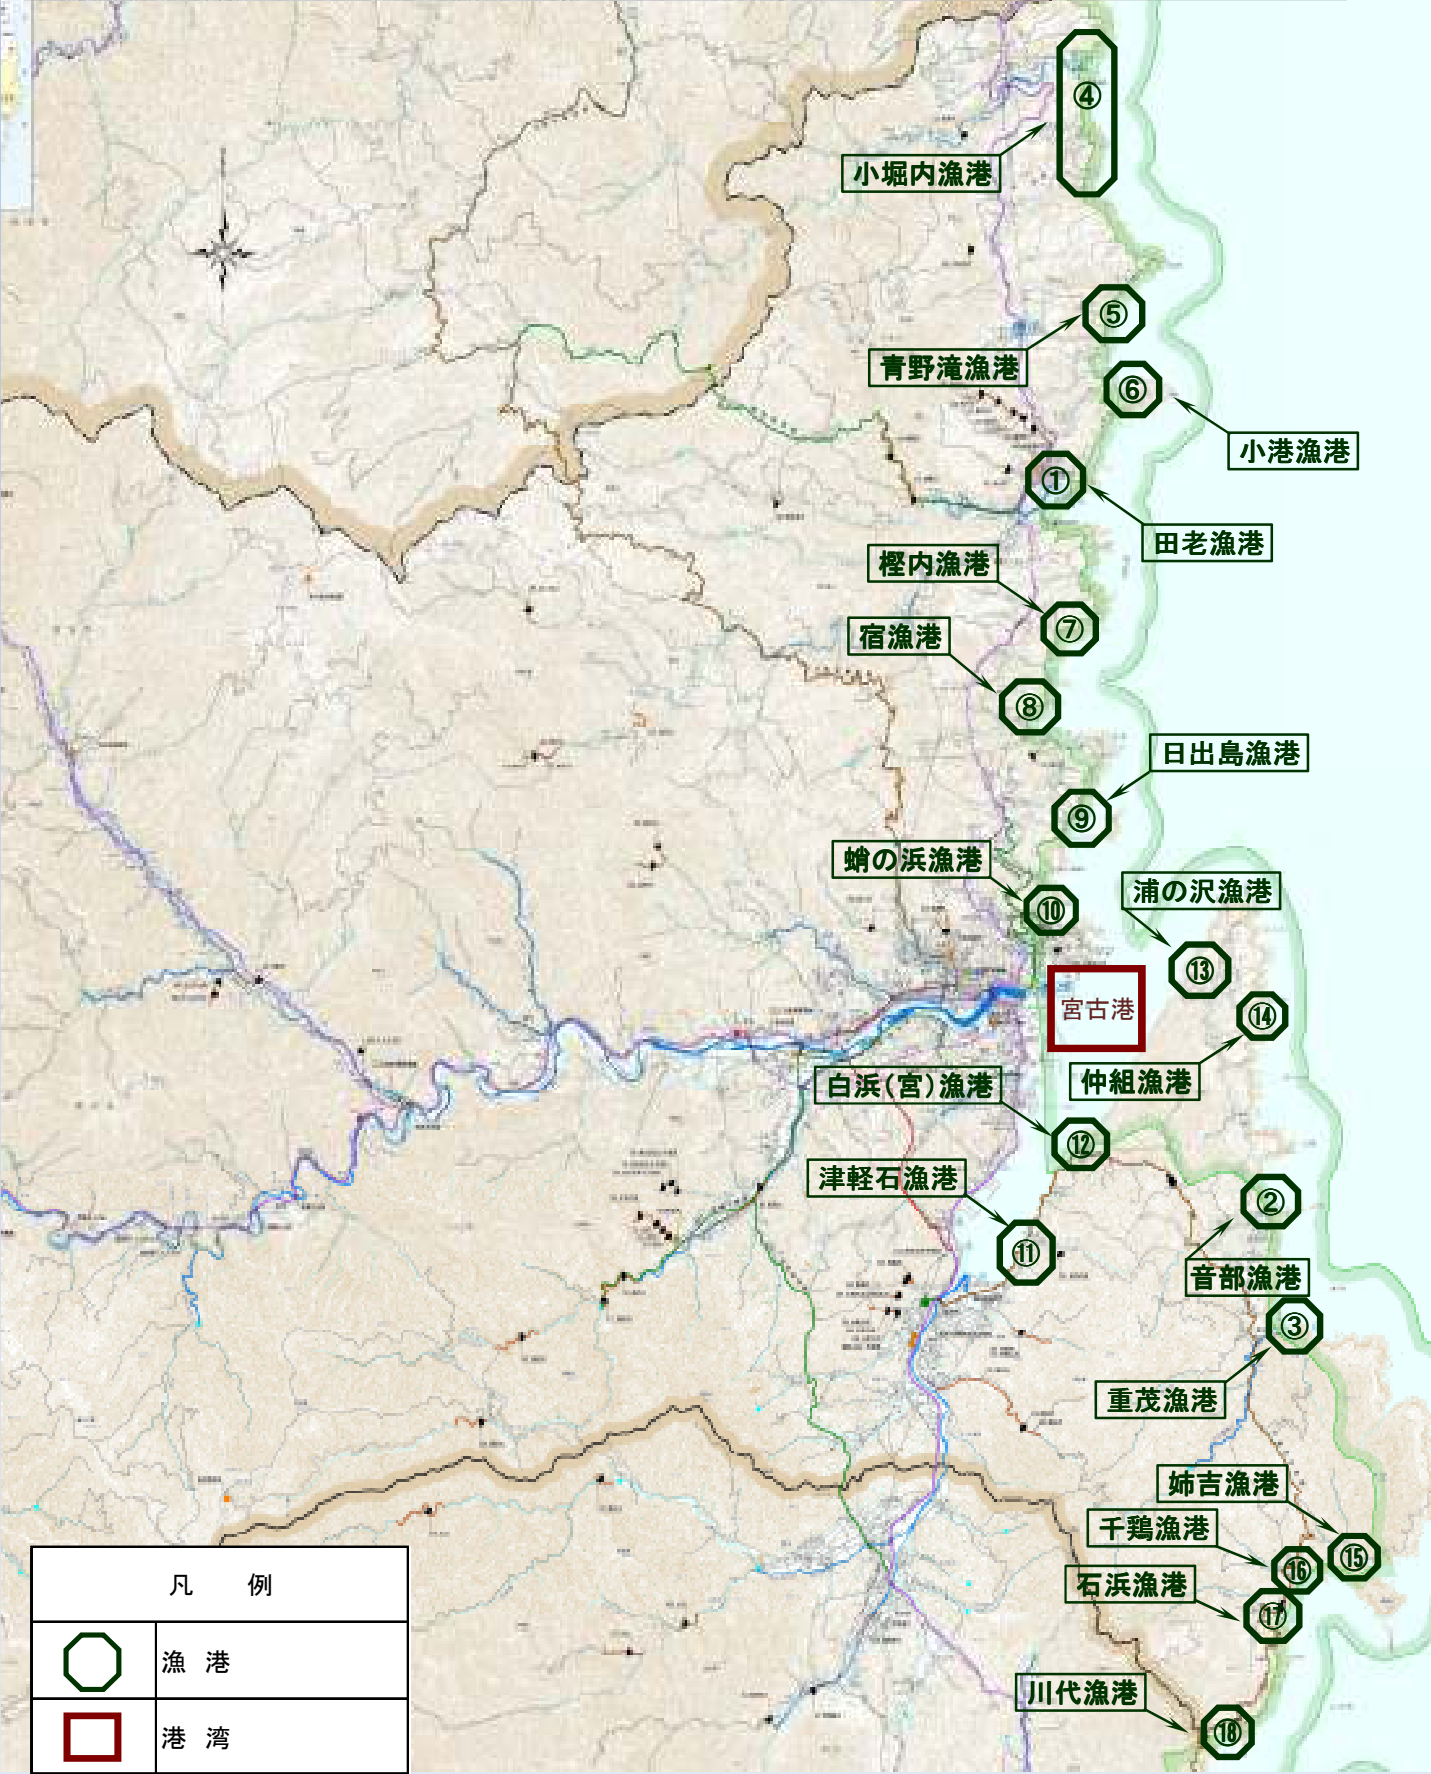

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
漁港	漁港	県	① 田老漁港	(漁港災害) 防波堤L=689m、岸壁L=1133m 他	施工準備 応急対策	★工事								
			② 音部漁港	(漁港災害) 防波堤L=352m、岸壁L=206m 他	施工準備 応急対策	★工事								
			③ 重茂漁港	(漁港災害) 防波堤L=373m、岸壁L=663m 他	施工準備 応急対策	★工事								
		市	④ 小堀内漁港	(漁港災害) 防波堤L=121m、岸壁L=127m 他	施工準備 応急対策	★工事								
			⑤ 青野漁港	(漁港災害) 防波堤L=46m 他	施工準備 応急対策	★工事		■H25.10完了						
			⑥ 小港漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m 他	施工準備 応急対策	★工事								
			⑦ 堀内漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、岸壁L=52m 他	施工準備 応急対策	★工事		■H25.10完了						
			⑧ 宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m、岸壁L=215m 他	施工準備 応急対策	★工事								
			⑨ 日出色漁港	(漁港災害) 防波堤L=526m、岸壁L=320m 他	施工準備 応急対策	★工事								
			⑩ 蛸の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=260m 他	施工準備 応急対策	★工事								
			⑪ 津軽石漁港	(漁港災害) 防波堤L=196m、岸壁L=50m 他	施工準備 応急対策	★工事								
			⑫ 白浜(宮)漁港	(漁港災害) 防波堤L=110m、岸壁L=200m 他	施工準備 応急対策	★工事								
			⑬ 浦の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m、岸壁L=101m 他	施工準備 応急対策					工事				
			⑭ 仲組漁港	(漁港災害) 防波堤L=157m、岸壁L=145m 他	施工準備 応急対策	★工事								
			⑮ 姉吉漁港	(漁港災害) 防波堤L=86m、岸壁L=40m 他	施工準備 応急対策				★工事					
			⑯ 千鷲漁港	(漁港災害) 防波堤L=428m、岸壁L=260m 他	施工準備 応急対策	★工事								
			⑰ 石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=345m、岸壁L=100m 他	施工準備 応急対策	★工事								
			⑱ 川代漁港	(漁港災害) 防波堤L=73m、岸壁L=45m 他	施工準備 応急対策	★工事								
港湾	宮古港	国	竜神崎防波堤	(防波堤整備・直轄災害復旧) 防波堤L=400m		★工事(平成29年度完成予定)								
		出崎地区	(災害復旧) 出崎防波堤(2)L=20m		暫定供用	★防波堤		★臨港道路		臨港道路の一部				
		鎌ヶ崎地区	(災害復旧) 閉伊川 -1.5m物揚場L=295m、-3.0m物揚場L=728m		暫定供用			物揚場		物揚場の一部				
		日立浜地区	(災害復旧) -4.5m岸壁L=240m、-2.0m物揚場L=101m、船揚場(1)L=228m、船揚場(2)L=84m		暫定供用	★船揚場、★岸壁		物揚場、船揚場、臨港道路						
		高浜地区	(災害復旧) 防波堤(北)L=250.2m、防波堤(南)L=200m、-2.0m物揚場(1)、(2)L=200m他		暫定供用	★防波堤、★物揚場、★船揚場		臨港道路						
		藤原地区	(災害復旧) 船揚場L=50m、埠頭保安設備L=1,250m		暫定供用	★公共上屋 ★埠頭保安設備、★臨港道路					船揚場			
		神林地区	(災害復旧) 南防波堤L=112m、防波堤L=31m、-2.0m物揚場L=181m 他		暫定供用	★防波堤、★船揚場、★浮桟橋、物揚場		臨港道路、船揚場						
港湾	宮古港	浄土ヶ浜地区	(災害復旧) 防波堤L=89m、-2.0m物揚場L=44m、さん徳L=70m		暫定供用	★防波堤、★臨港道路、★物揚場		■H25.7完了						

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。




# 社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町 1 / 3】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【県】宮古土木センター(0193-64-2221)、  
宮古農林振興センター(-2214)、同 林務室(-2215)、  
宮古水産振興センター(-2216)、医療局(019-629-6347)  
【町】山田町復興推進課 (0193-82-3111)

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、  
碧い海とともに暮らす町

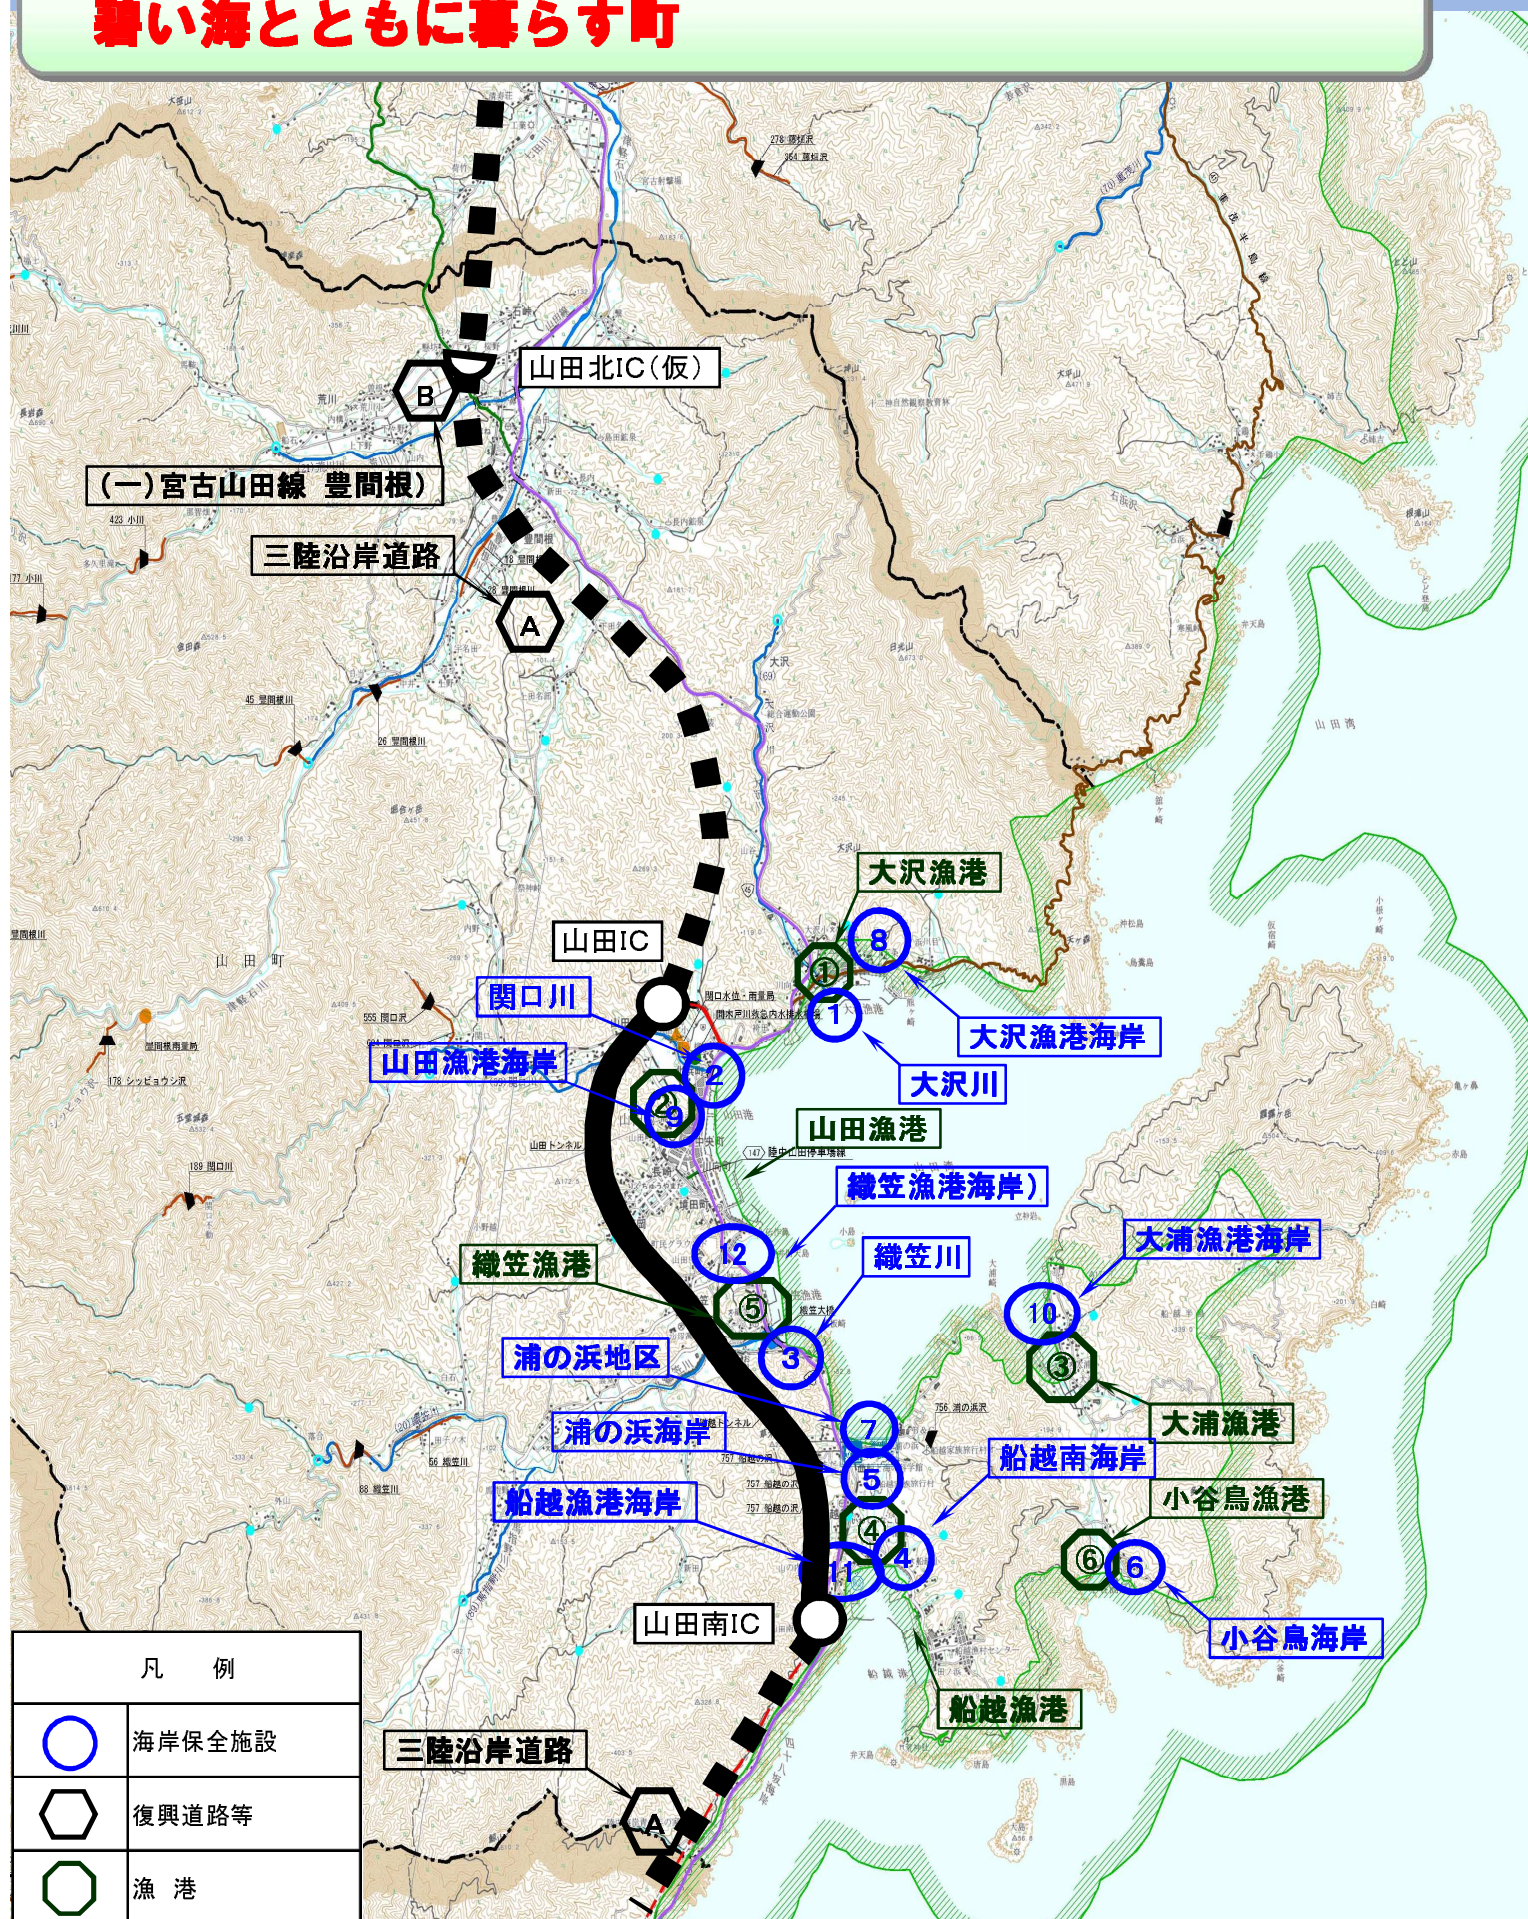

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	施工準備			工事							
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	施工準備			工事							
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	施工準備			★工事							
			4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	応急対策	施工準備			★工事						
	農地海岸		5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基	施工準備			★工事							
			6 小谷鳥海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基	施工準備			★工事							
	林野海岸		7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	施工準備	☆工事	■H25.3完了								
	漁港海岸		8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=9基 他	応急対策	施工準備			工事						
			8-2 大沢(熊ヶ崎地区)他	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km					施工準備	工事					
			9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=1基 他	応急対策	施工準備			★工事						
			9-2 山田(柳沢地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km					施工準備	★工事					
			10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、水門N=6基 他	施工準備			★工事							
			11-1 船越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=6基 他	施工準備			★工事							
	11-2 船越(山ノ内地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km					施工準備	工事							
	町	12 織笠漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備			工事							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	山田宮古道路(山田～宮古南)	(H23新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.17起工式									
			釜石山田道路	(事業中)	★用地・工事の推進										
	復興支援道路	県	B (一) 宮古山田線	豊間根			(H25新規)	施工準備	用地買収	用地・工事の推進					
漁港	漁港	県	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他	施工準備			★工事							
			② 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他	施工準備			★工事							
			③ 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他	施工準備			★工事							
			④ 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他	施工準備			★工事							
		町	⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、岸壁L=675m 他	施工準備			★工事							
			⑥ 小谷鳥漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、岸壁L=176m 他	施工準備			★工事							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。




社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町 2 / 3】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【県】宮古土木センター(0193-64-2221)  
水産振興センター(0193-64-2216)、医療局(019-629-6347)  
【町】山田町復興推進課(0193-82-3111)  
(教)学校教育課(0193-82-3111内312)

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、  
碧い海とともに暮らす町

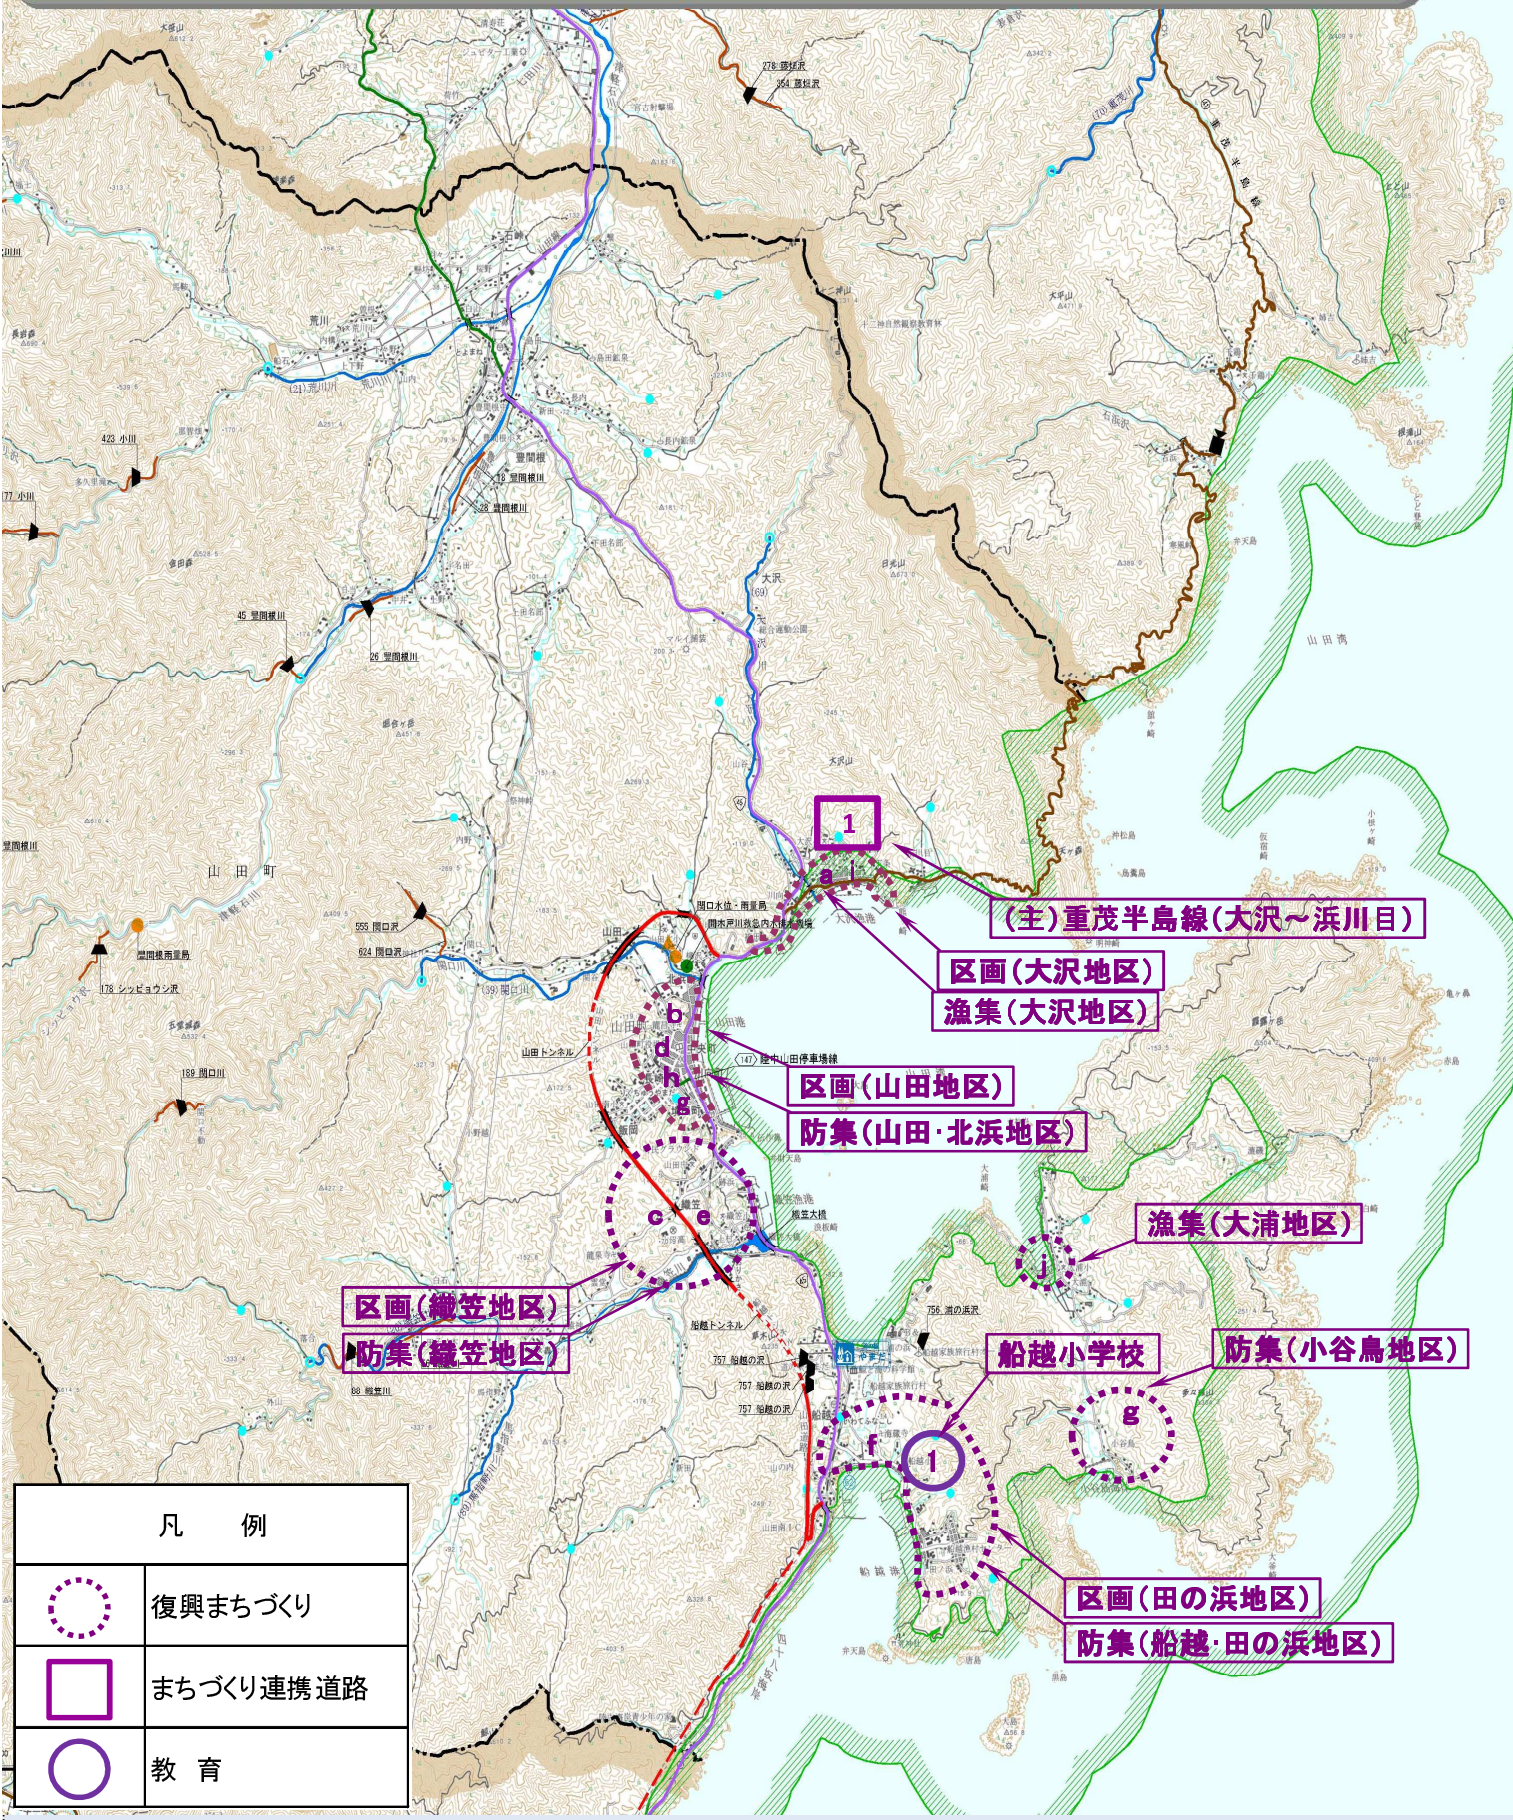

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興まちづくり	土地区画整理	町	a 大沢地区	区域面積: 6.5ha 対象戸数: 90戸 (民90戸)	事業準備・住民合意			工事			調整中 民90戸			
			b 山田地区	区域面積: 20.3ha 対象戸数: 345戸 (民205戸・公140戸)	事業準備・住民合意			工事			調整中 民205戸			
			c 織笠地区	区域面積: 2.5ha 対象戸数: 27戸 (民27戸)	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等									
			危険区域 (山田、織笠、 田の浜地区)	区域面積: 33.5ha (山田15.0ha、 織笠14.0ha、 田の浜4.5ha)	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等									
	防災集団移転	町	d 山田地区	対象戸数: 339戸 (民154戸・公185戸)	事業準備・住民合意									
			e 織笠地区	対象戸数: 165戸 (民143戸・公22戸)	事業計画策定									
			f 船越・ 田の浜地区	対象戸数: 224戸 (民160戸・公64戸)	調査・設計等									
			g 小谷鳥地区	対象戸数: 4戸 (民4戸)	調査・設計等									
	津波復興拠点	町	h-1 山田地区 (中心市街地エリア)	区域面積: 2.3ha	事業準備・住民合意									
			h-2 山田地区 (公共防災エリア)	区域面積: 2.7ha	調査・設計等									
	漁業集落防災機能強化	町	i 大沢地区	集落道、用地造成他 対象戸数: 177戸 (民144戸・公33戸)	事業準備・住民合意									
			j 大浦地区	集落道、用地造成他 対象戸数: 30戸 (民8戸・公22戸)	事業計画策定									
医療	病院	県	1 (主)重茂半島線	大沢～浜川目	施工準備									
					用地買収									
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧) 移転	建設場所選定									
					用地・設計・工事									

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。




社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町 3／3】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先 【県】宮古土木センター(0193-64-2221)  
【町】山田町復興推進課 (0193-82-3111)

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、  
碧い海とともに暮らす町

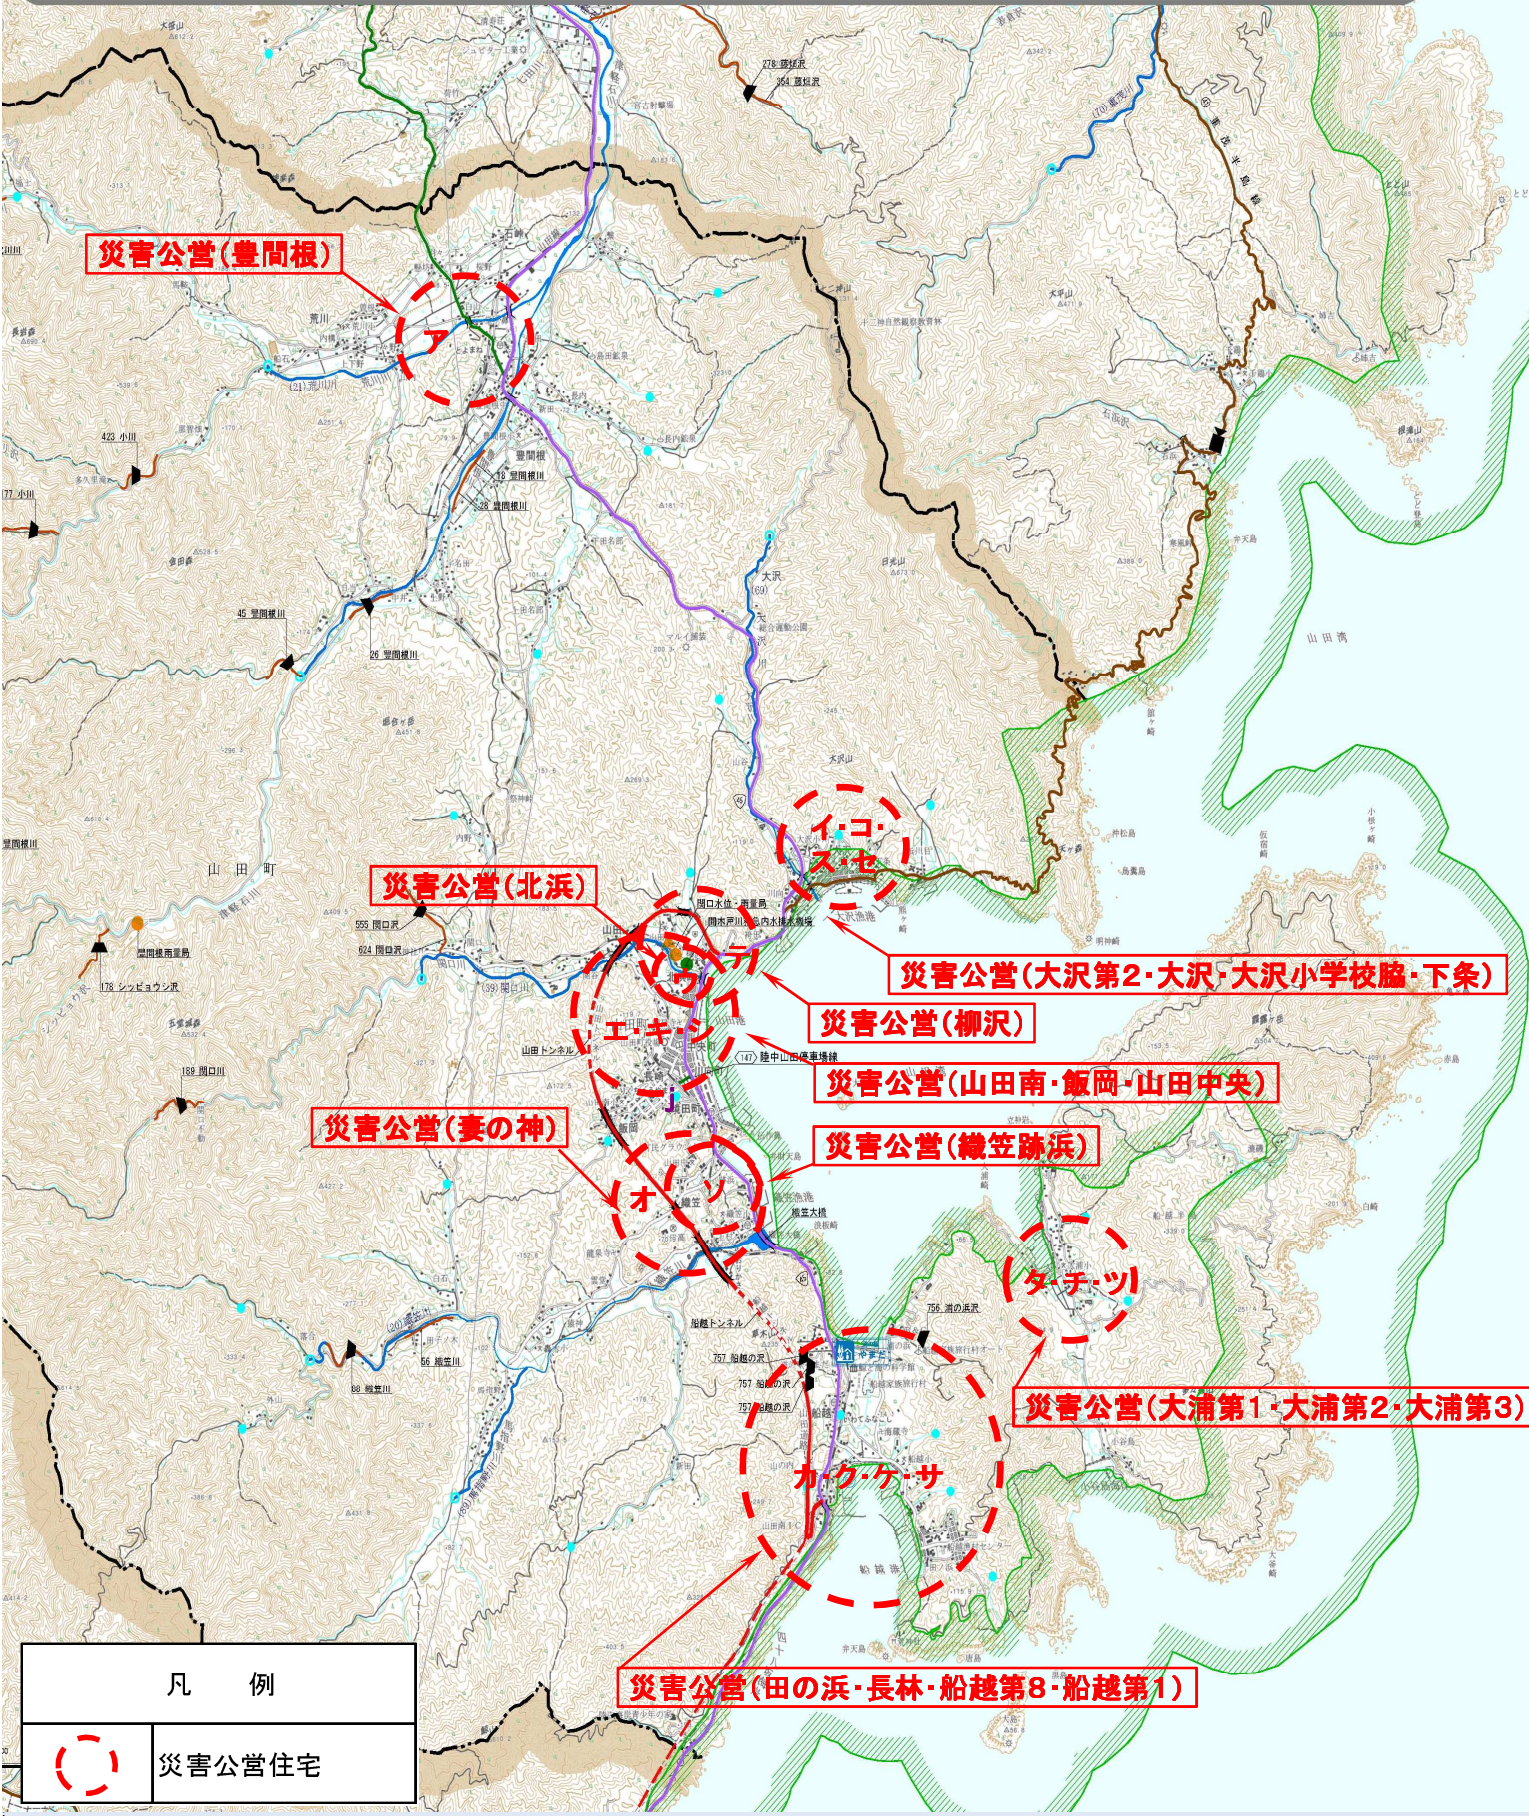

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 豊間根(単独)	S造3階 予定戸数:72戸		用地	設計	★工事	72戸					
			イ 大沢第2(単独)	RC造 予定戸数:20戸				用地・設計・工事		20戸				
			ウ 北浜(単独)	RC造5階 予定戸数:90戸		用地	設計		工事	90戸				
			エ 山田南(防:山田地区)	RC造 予定戸数:70戸				用地・設計・工事		70戸				
	設計・施工一括選定		オ 妻の神(単独)	RC造 予定戸数:70戸		用地	設計		工事	70戸				
			カ 田の浜(単独)	予定戸数:20戸				用地・設計・工事		20戸				
	直接建設		キ 飯岡(防:山田地区)	予定戸数:115戸				用地・設計・工事		115戸				
			ク 長林(防:船越・田の浜地区)	予定戸数:21戸				用地・設計・工事		21戸				
			ケ 船越第8(防:船越・田の浜地区)	予定戸数:13戸				用地・設計・工事		13戸				
			コ 大沢(単独)	RC造5階 予定戸数:35戸		用地		設計・工事	35戸					
			サ 船越第1(防:船越地区)	予定戸数:30戸				用地・設計・工事		30戸				
			シ 山田中央(区:山田地区)	RC造 予定戸数:140戸				用地・設計・工事		140戸				
			ス 大沢小学校脇(漁:大沢地区)	予定戸数:17戸			用地		設計	工事	17戸			
	直接建設	町	セ 下条(漁:大沢地区)	予定戸数:16戸			用地		設計	工事	16戸			
			ソ 織笠跡浜(防:織笠地区)	予定戸数:22戸			用地		設計	工事	22戸			
			タ 大浦第1(単独)	予定戸数:9戸		用地	設計	工事	9戸					
			チ 大浦第2(漁:大浦地区)	予定戸数:11戸			用地		設計	工事	11戸			
			ツ 大浦第3(漁:大浦地区)	予定戸数:11戸			用地		設計	工事	11戸			
			テ 柳沢(単独)	予定戸数:49戸			設計	工事	49戸					
			改修											

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。




社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町1／3】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先  
【県】沿岸広域振興局(0193-25-〔以下のとおり〕)土木部(2714)、  
農林部(2704)、水産部(2706)、 医療局(019-629-6347)  
【町】大槌町都市整備課 (0193-42-8723)、(教)学務課 (0193-42-6100)

海の見えるつい散歩したくなる  
こだわりのある「美しいまち」

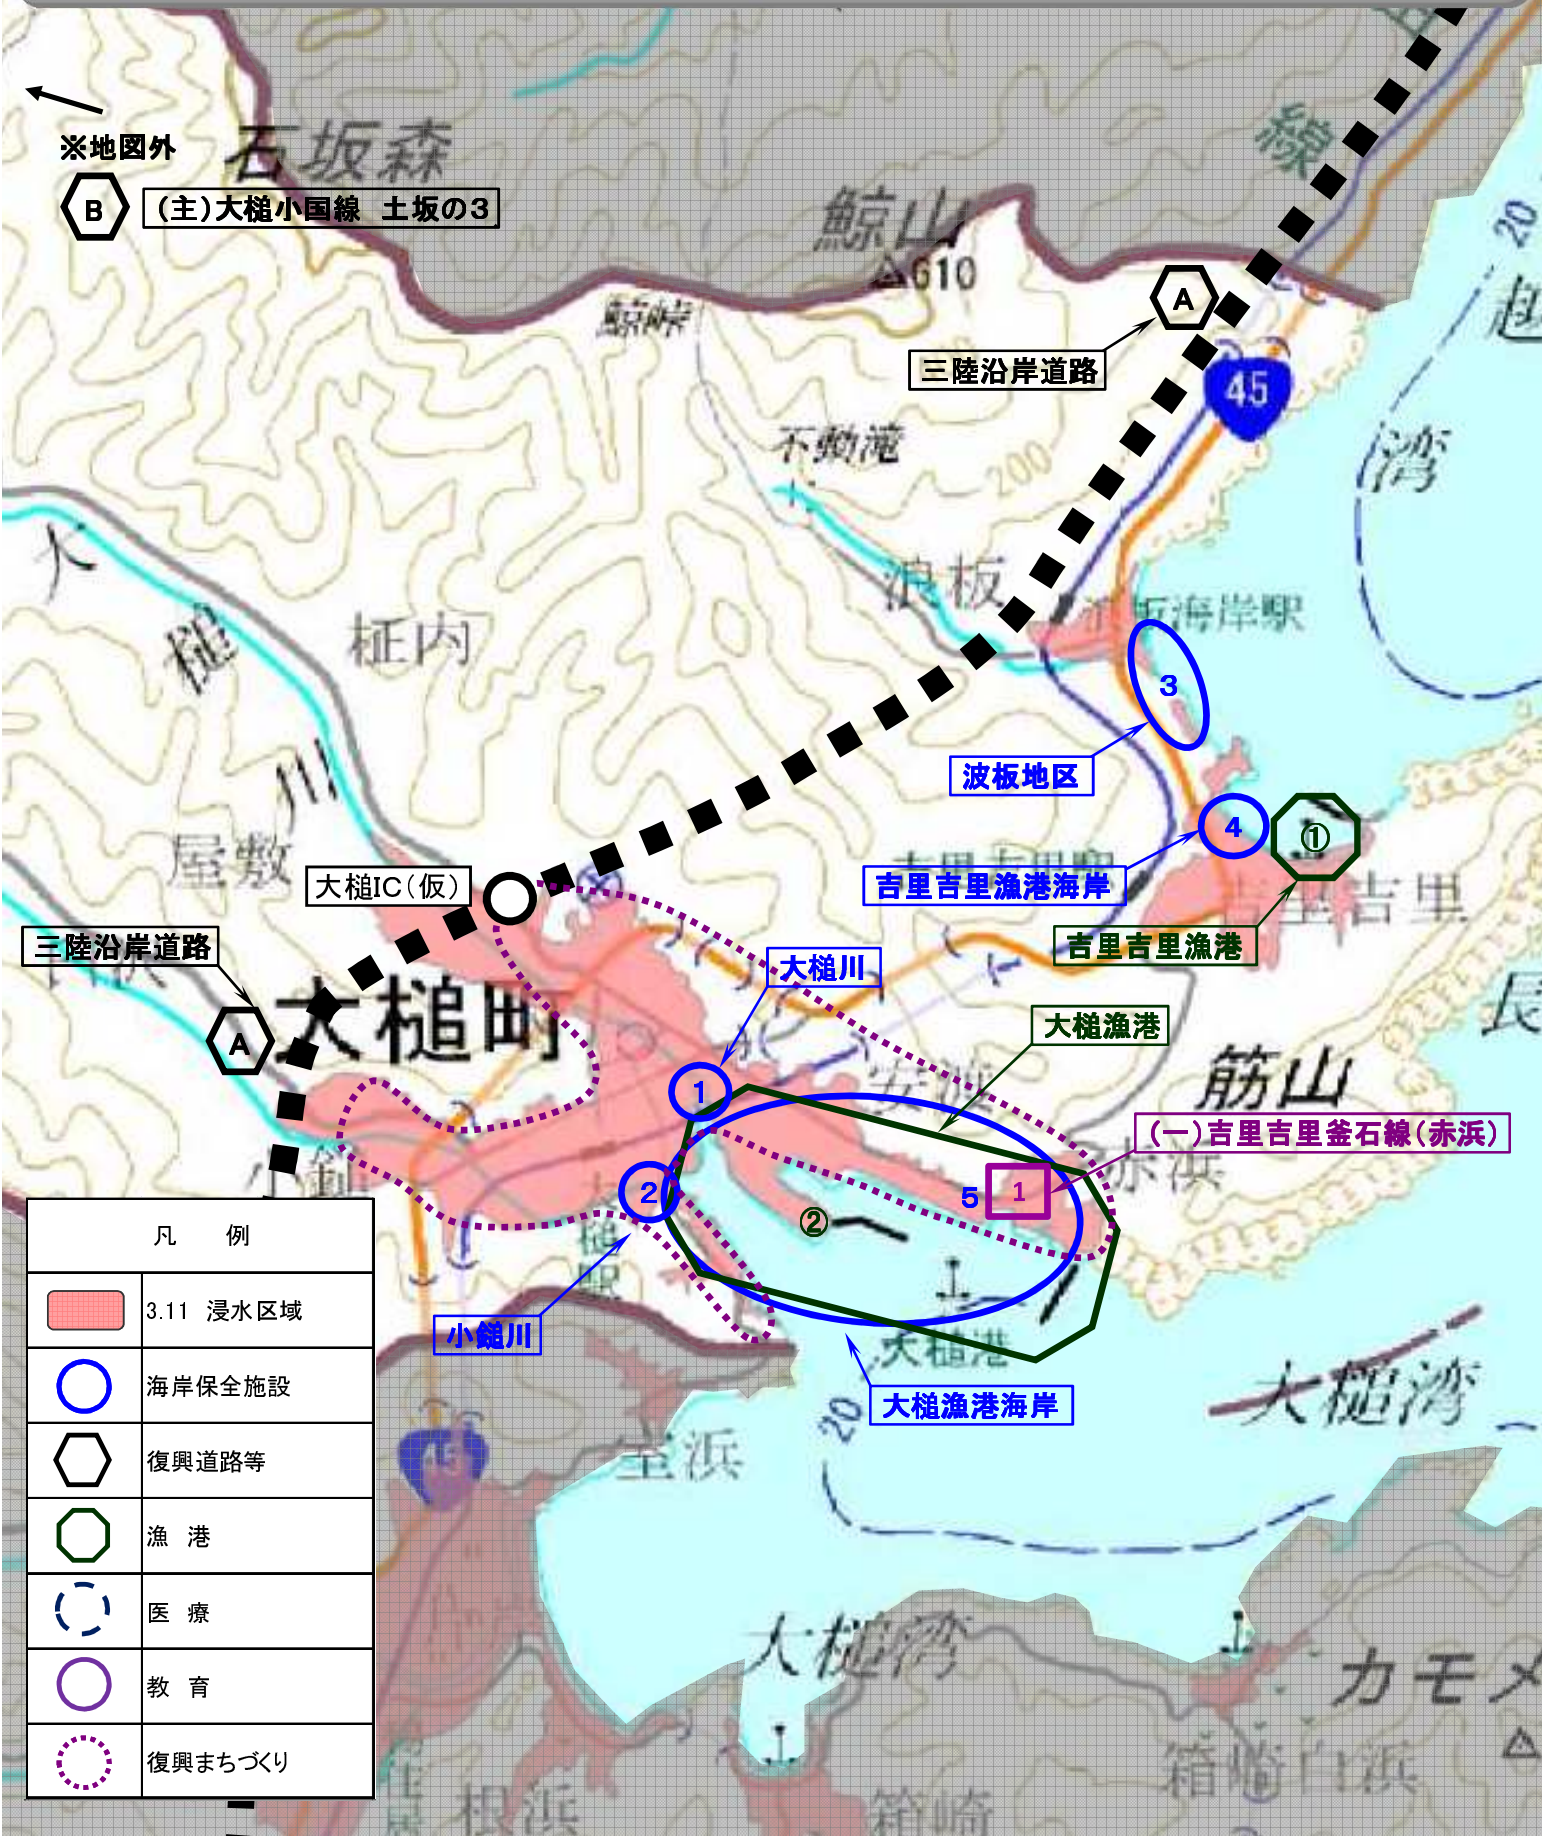

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=1基	応急対策	施工準備			★工事					
			2 小槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=1基		施工準備			工事					
	林野海岸		3 浪板地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	施工準備	☆工事	■H24.10完了							
	漁港海岸		4 吉里吉里 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=4基 他	応急対策	施工準備			工事					
			5 大槌漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、 水門N=3基 他	応急対策	施工準備	★工事							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路	(事業中) ★用地・工事の推進									
	復興関連道路	県	B (主) 大槌小国線	土坂の3	(事業中) ★工事の推進 (逐次供用開始)									
漁 港	漁 港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=753m 他	施工準備				★工事					
			② 大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1.486m、 岸壁L=2.582m 他	施工準備				★工事					
医 療	病院	県	県立大槌病院	寺野地区ふれあい運動公園内	建設場所選定	用地・設計・工事			1病棟一般病床50床程度、診療科は内科・外科を基本にこれまでの外来診療機能を維持 他					
教 育	小学校	町	大槌小学校 安渡小学校 赤浜小学校 大槌北小学校	(災害復旧) 移転	事業準備・住民合意	H25 小学校4校統合(新校名:大槌小学校) 移転場所について、協議・調整中であるため、大よその予定を掲載。 移転完了まで仮設校舎を使用。			用地取得・設計	造成工事				
	中学校		大槌中学校	(災害復旧) 移転	事業準備・住民合意	移転場所について、協議・調整中であるため、大よその予定を掲載。 移転完了まで仮設校舎を使用。			用地取得・設計	造成工事				
復興まちづくり	まちづくり連携道路	県	1 (一)吉里吉里 釜石線	赤浜		施工準備			用地買収	用地・工事の推進				

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。



社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町 2／3】

基準日：平成25年12月31日見込み  
（平成25年12月27日公表）

問い合わせ先  
【町】大槌町都市整備課（0193-42-8723）

海の見えるつい散歩したくなる  
こだわりのある「美しいまち」



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期（基盤復興期間）			第2期（本格復興期間）			第3期（更なる展開への道筋期間）			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興まちづくり	土地区画整理		a 町方地区	区域面積：29.7ha 対象戸数：808戸 （民651戸・公157戸）	事業準備・住民合意	都市計画決定 事業計画策定・変更 仮換地手続き等		★工事	民651戸 公52戸	公38戸	公67戸			
			b 安渡地区	区域面積：6.0ha 対象戸数：226戸 （民139戸・公87戸）	事業準備・住民合意	都市計画決定 事業計画策定・変更 仮換地手続き等		工事	民139戸	公66戸	公21戸			
			c 赤浜地区	区域面積：7.6ha 対象戸数：150戸 （民150戸）	事業準備・住民合意	都市計画決定・変更 事業計画策定・変更 仮換地手続き等		工事		民150戸				
			d 吉里吉里地区	区域面積：9.1ha 対象戸数：292戸 （民263戸・公29戸）	事業準備・住民合意	都市計画決定・変更 事業計画策定・変更 仮換地手続き等		工事	民263戸	公29戸				
	津波復興拠点		町方地区 安渡地区	区域面積 町方地区（3.0ha） 安渡地区（18.7ha）	事業準備・住民合意	都市計画決定 事業計画策定		調査・設計等						
								用地・工事						
	防災集団移転		e-1 赤浜地区 （赤浜①団地）	対象戸数：42戸 （民28戸・公14戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等				民28戸 公14戸				
			e-2 赤浜地区 （赤浜②団地）	対象戸数：40戸 （民34戸・公6戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等				民34戸 公6戸				
			e-3 赤浜地区 （赤浜③団地）	対象戸数：44戸 （民25戸・公19戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等				民25戸 公19戸				
			f-1 吉里吉里地区 （吉里吉里①団地）	対象戸数：21戸 （民21戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等	民21戸	★工事	民19戸					
			f-2 吉里吉里地区 （吉里吉里②団地）	対象戸数：38戸 （民38戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等		工事	民38戸					
			f-3 吉里吉里地区 （吉里吉里③団地）	対象戸数：16戸 （民16戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等		工事	民16戸					
			g 浪板地区 （浪板①団地）	対象戸数：13戸 （民13戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等		工事	民13戸					
			h-1 安渡地区 （安渡①団地）	対象戸数：77戸 （民77戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等		★工事	民77戸					
			h-2 安渡地区 （安渡②団地）	対象戸数：18戸 （民18戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等		★工事	民18戸					
			h-3 安渡地区 （安渡③団地）	対象戸数：27戸 （民27戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等		★工事	民27戸					
			h-4 安渡地区 （安渡④団地）	対象戸数：19戸 （民19戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等		★工事	民19戸					
			i-1 町方・小枕・ 伸松地区 （大ヶ口①団地）	対象戸数：3戸 （民3戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等		★工事	民3戸					
			i-2 町方・小枕・ 伸松地区 （小枕団地）	対象戸数：36戸 （民36戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等			民36戸					
			i-3 町方・小枕・ 伸松地区 （寺野①団地）	対象戸数：166戸 （民159戸・公27戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等		★工事	民159戸 公27戸					
			i-4 町方・小枕・ 伸松地区 （町方団地）	対象戸数：100戸 （民100戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等		★工事	民100戸					
			i-5 町方・小枕・ 伸松地区（大ヶ口・ 沢山・榎内団地）	対象戸数：95戸 （民95戸）	事業準備・住民合意	事業計画策定 設計・用地等		★工事	民95戸					
漁業集落防災機能強化			j 吉里吉里地区	漁業集落排水施設、 集落道他	事業準備	設計・用地等								
			k 浪板地区	漁業集落排水施設、 用地造成、集落道他	事業準備	事業計画策定、設計、用地等								
			l 安渡地区 （安渡①団地）	対象戸数：27戸 （民27戸）	事業準備	設計、用地等				民27戸				
			m 赤浜地区	用地造成、集落道他 対象戸数：2戸 （民2戸）	事業準備	設計、用地等				民2戸				

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。



社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町 3／3】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先  
【県】沿岸広域振興局 土木部 (0193-25-2714)  
【町】大槌町用地建築課 (0193-42-8719)

海が見えるつい散歩したくなる  
こだわりのある「美しいまち」



凡 例	
	3.11 浸水区域
	災害公営住宅


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
直接建設	県		ア 吉里吉里(単独)	RC造5階 予定戸数:34戸		設計	☆工事	34戸	■H25.8完了					
			イ 桎内(単独)	RC造 予定戸数:90戸		用地	設計		90戸					
			ウ 屋敷前(単独)	RC造5階 予定戸数:151戸		用地	設計		151戸					
			エ 安渡二丁目(区:安渡地区)	予定戸数:46戸				用地・設計・工事		46戸				
			オ 大槌(その他地区)	予定戸数:179戸				用地・設計・工事		179戸				
			カ 大ケロ(単独)	木造 予定戸数:70戸		用地	設計	70戸	■H25.8完了					
			キ 屋敷前(単独)	木造 予定戸数:21戸		用地	設計	21戸	■H25.11完了					
			ク 大ケロ二丁目(単独)	木造 予定戸数:23戸			用地	造成	23戸					
			ケ 桎内地区(単独)	木造 予定戸数:31戸			用地	造成	13戸	18戸				
			コ 三枚堂(単独)	木造 予定戸数:27戸			用地		27戸					
買取	町		サ 町方(区:町方地区)	予定戸数:157戸			用地	設計	工事	52戸	38戸	67戸		
			シ 吉里吉里(区:吉里吉里地区)	予定戸数:29戸			用地		設計	工事	29戸			
			ス 赤浜(防:赤浜地区)	予定戸数:39戸			用地		設計	工事	39戸			
			セ 浪板(単独)	予定戸数:15戸			用地		設計	工事	5戸	10戸		
			ソ 安渡(区:安渡地区)	予定戸数:41戸			用地		設計	工事	20戸	21戸		
			タ 町方(防:寺野地区)	予定戸数:27戸			用地		設計	工事	27戸			
									設計	工事				
									設計	工事				

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。



問い合わせ先【県】沿岸広域振興局(0193-25-[次のとおり])  
土木部(2714)、水産部(2706)、農林部(2704)、  
大船渡農林振興センター(0192-27-8541)  
【市】釜石市水産農林課(0193-22-2111)

三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石

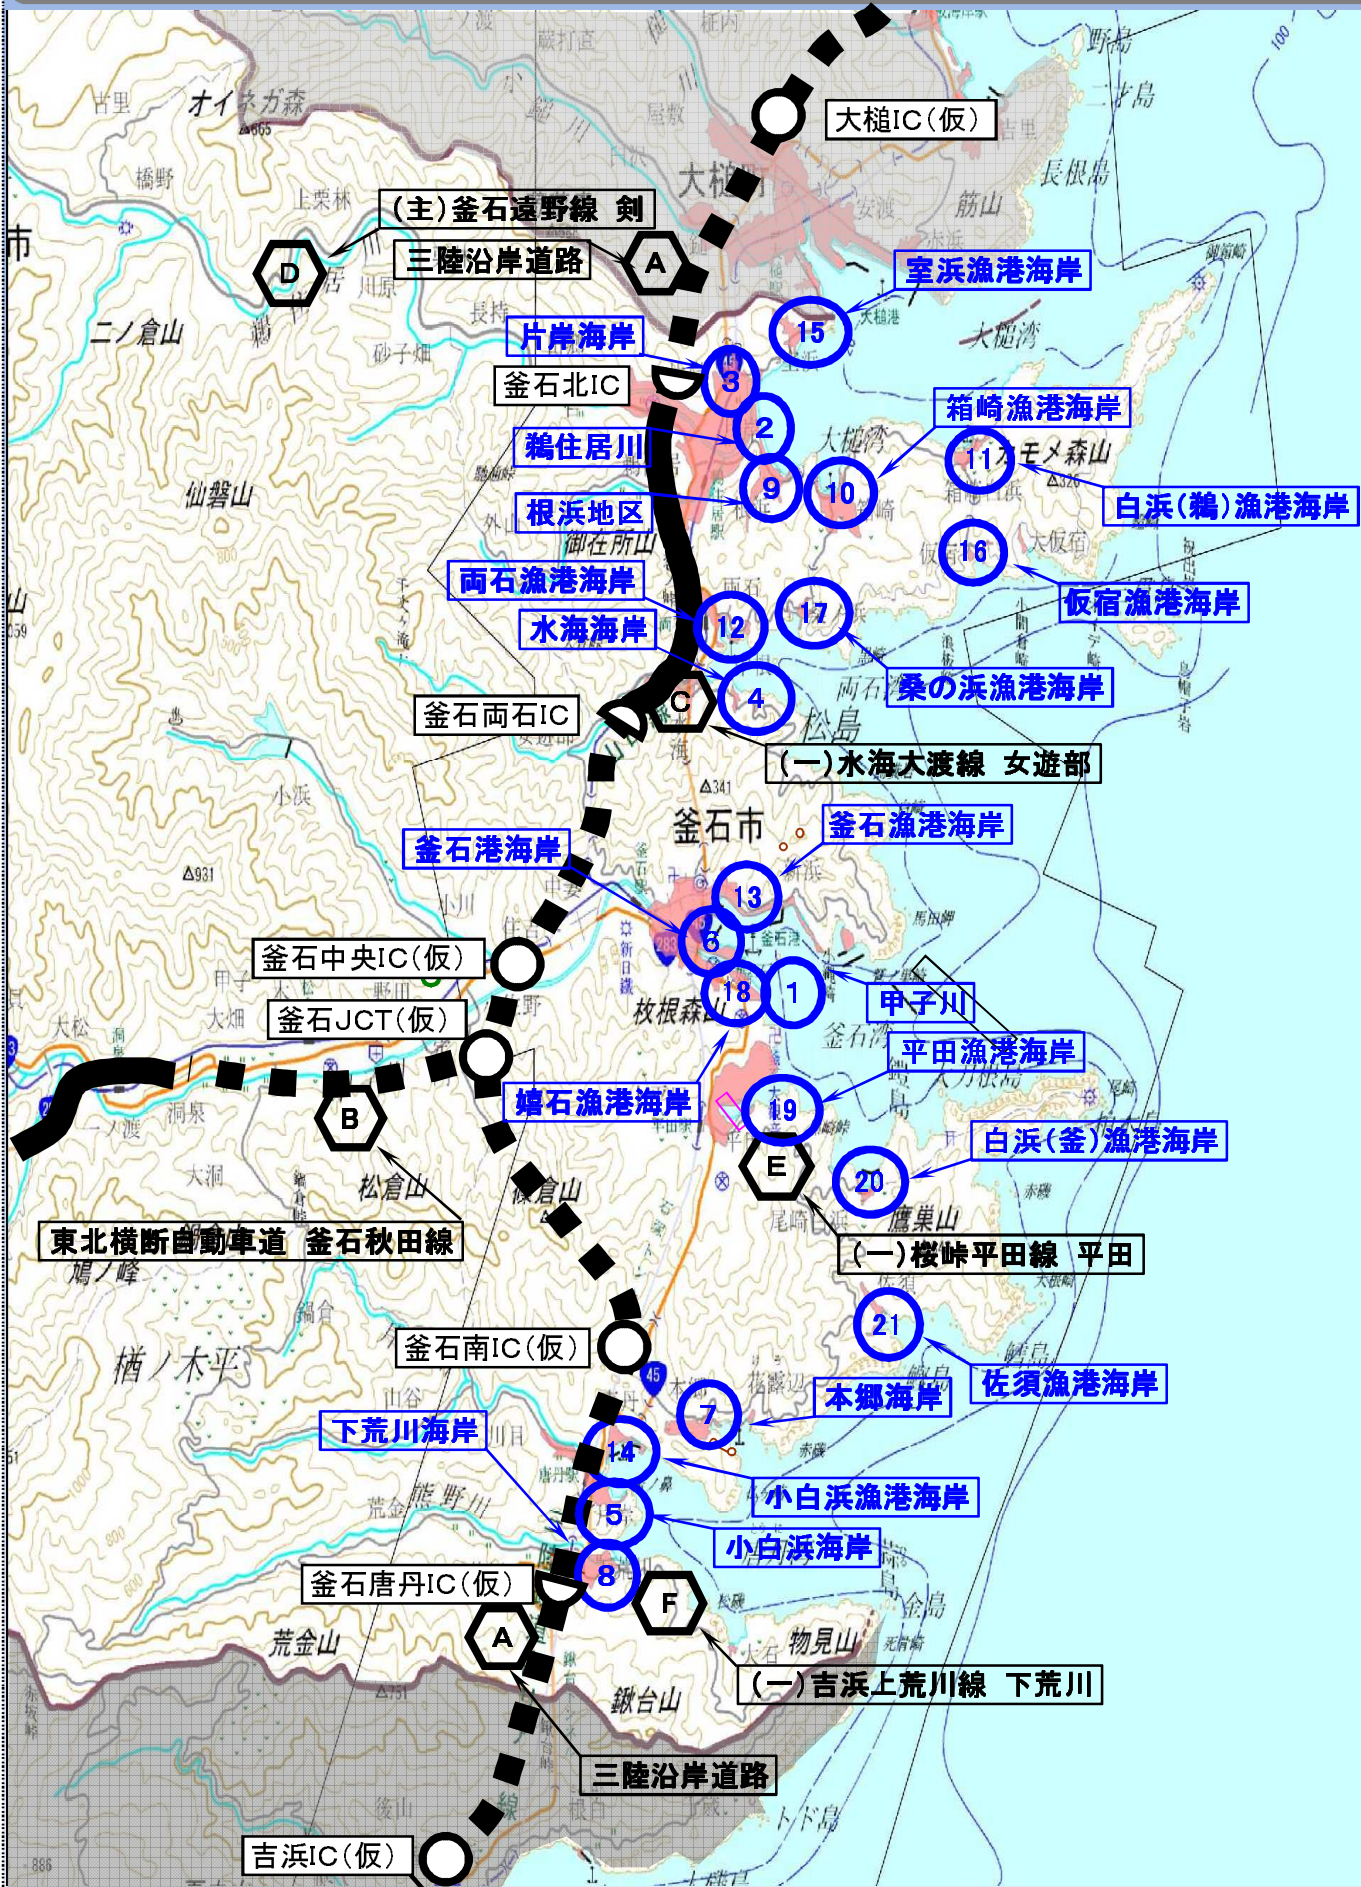


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 甲子川	(三陸高潮) 水門N=1基	施工準備				★工事					
			2 鵜住居川	(災害復旧) 水門等N=1基	施工準備				★工事					
			3 片岸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、陸間等N=1基	施工準備				★工事					
			4 水海海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基、離岸堤L=280m	施工準備				★工事					
			5 小白浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門等N=2基	施工準備				★工事					
			6 釜石港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.1km、水門等N=19基	施工準備				★工事					
	農地海岸	県	7 本郷海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km、水門等N=3基	施工準備				★工事					
			8 下荒川海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km、水門等N=3基	応急対策	施工準備			★工事					
	林野海岸	県	9 根浜地区	(治山施設災害復旧) 防潮堤L=0.6km	応急対策	施工準備			★工事					
			10 箱崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備			工事					
	漁港海岸	市	11 白浜(鵜)漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=3基 他		施工準備			工事					
			12 両石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=1基 他	応急対策	施工準備			工事					
			13 釜石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.8km、水門N=6基 他	応急対策	施工準備			★工事					
			14 小白浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=1基 他	応急対策	施工準備			★工事					
			15 室浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他		施工準備			工事					
			16 仮宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km		施工準備			工事					
			17 桑の浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他		施工準備			工事					
			18 罾石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他		施工準備			工事					
			19 平田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=1基 他		施工準備			工事					
			20 白浜(釜石)漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他		施工準備			工事					
			21 佐須漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他		施工準備			工事					
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路 吉浜釜石道路(吉浜～釜石)	(事業中)	★用地・工事の推進								
			B 東北横断自動車道 釜石秋田線	釜石道路(釜石～釜石西)	(H23新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.2.25起工式								
	復興支援道路	県	C (一) 水海大渡線	女遊部	(事業中) ☆工事の推進	■H24.3完了								
			D (主) 釜石遠野線	刺	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
	復興関連道路	県	E (一) 桜峠平田線	平田	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
			F (一) 吉浜上荒川線	下荒川	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。



三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石

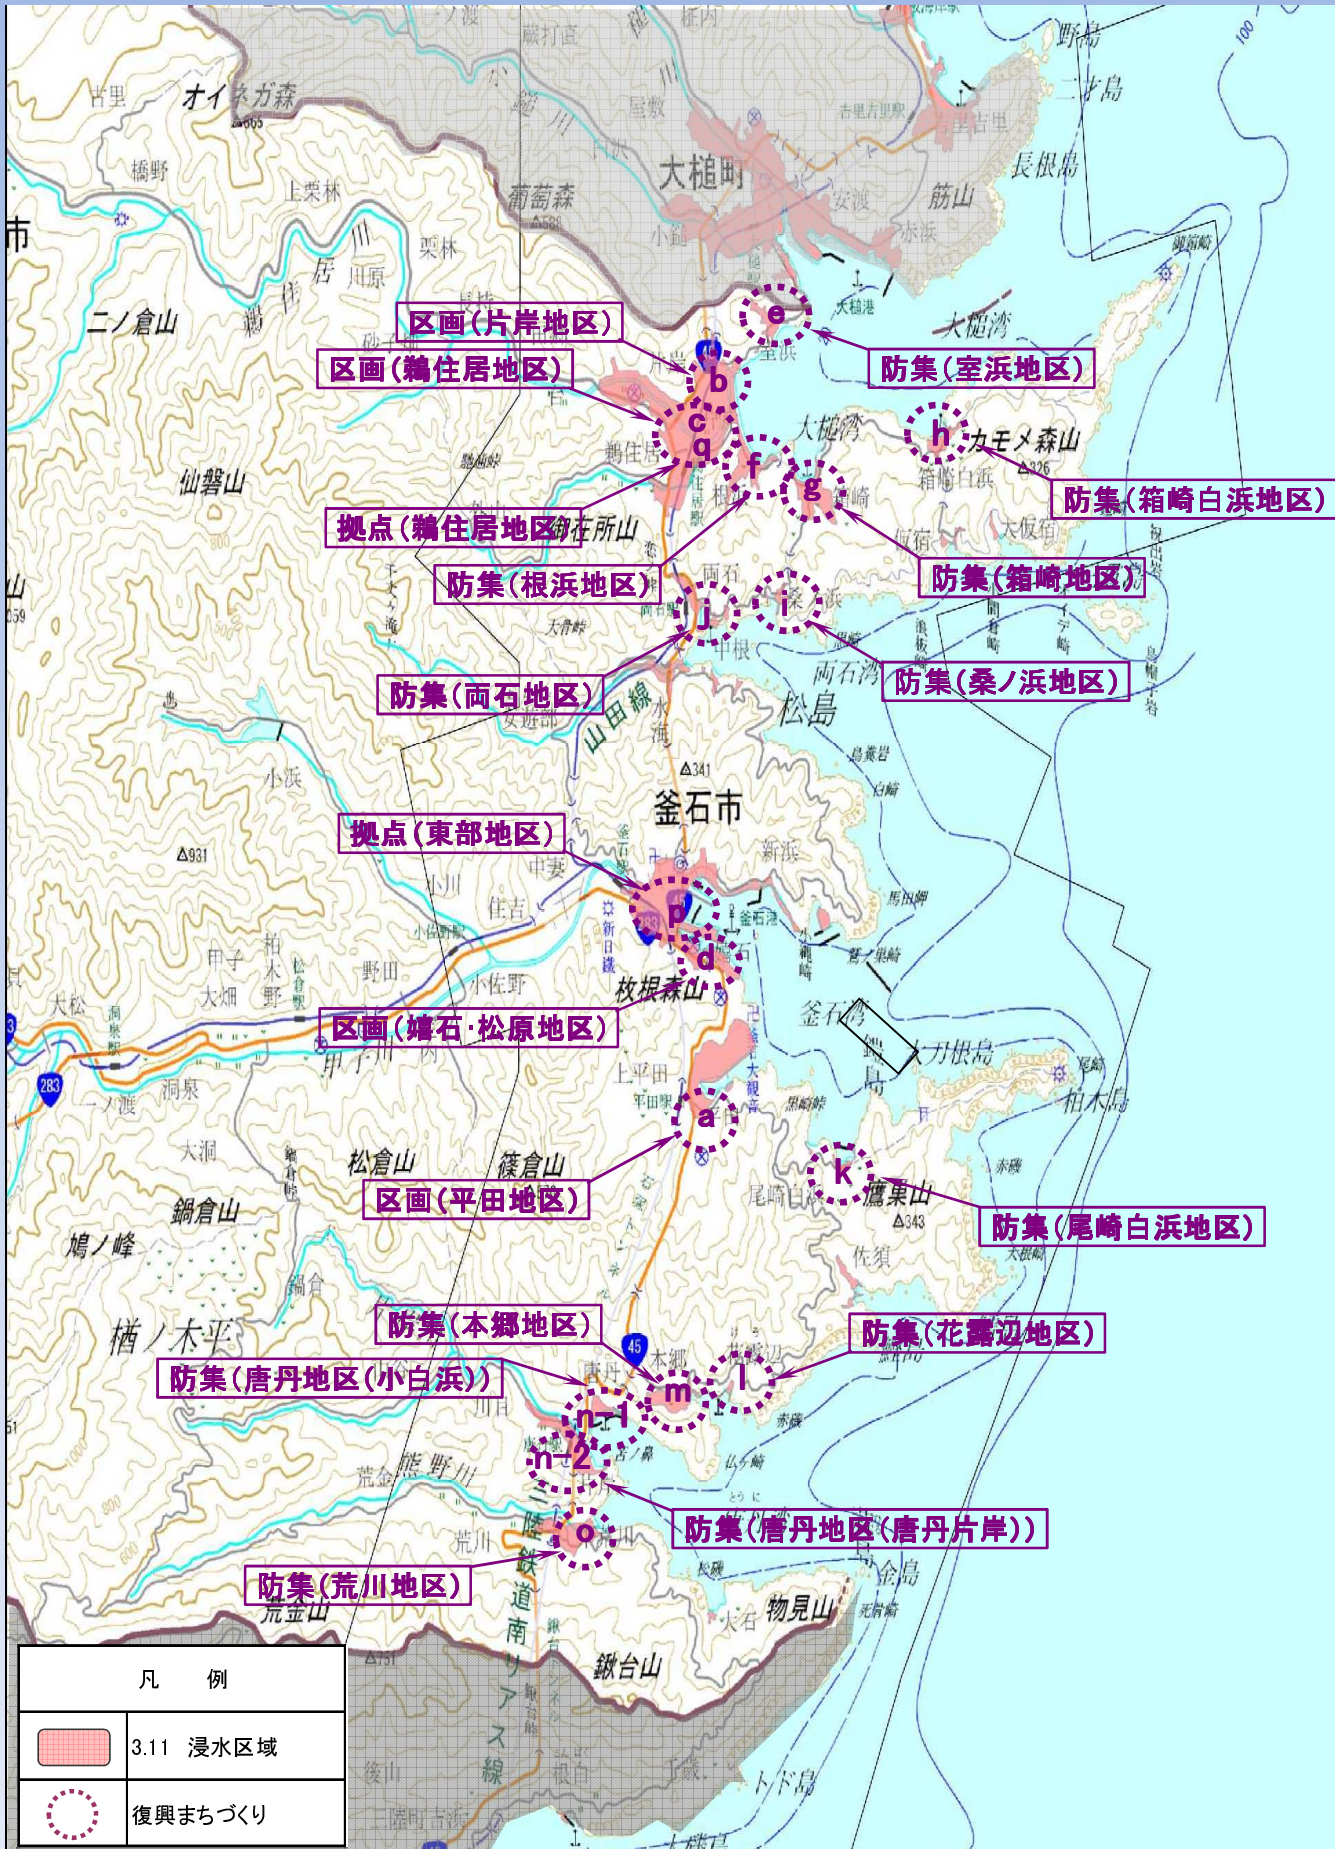

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
土地区画整理			a 平田地区	区域面積:22.7ha 対象戸数:288戸 (民288戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等		民55戸 民70戸	順次住宅建設					
			b 片岸地区	区域面積:22.7ha 対象戸数:144戸 (民144戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等			民98戸 民25戸 民21戸	順次住宅建設				
			c 鶴住居地区	区域面積:49.1ha 対象戸数:700戸 (民565戸・公135戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等		民170戸・公135戸 民140戸	順次住宅建設					
			d 礪石・松原地区	区域面積:12.9ha 対象戸数:400戸 (民245戸・公155戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等		民70戸・公155戸 民90戸 民85戸	順次住宅建設					
復興まちづくり	市	防災集団移転	e 室浜地区	対象戸数:36戸 (民17戸・公19戸)	事業計画策定			民17戸 公19戸	順次住宅建設					
			f 根浜地区	対象戸数:39戸 (民21戸・公18戸)	事業計画策定				民21戸 公18戸	順次住宅建設				
			g 箱崎地区	対象戸数:54戸 (民17戸・公37戸)	事業計画策定			公19戸 民17戸	順次住宅建設					
			h 箱崎白浜地区	対象戸数:11戸 (民11戸)	事業計画策定				民11戸	順次住宅建設				
			i 桑ノ浜地区	対象戸数:33戸 (民17戸・公16戸)	事業計画策定			民17戸 公16戸	順次住宅建設					
			j 両石地区	対象戸数:155戸 (民69戸・公86戸)	事業計画策定			民69戸 公86戸	順次住宅建設					
			k 尾崎白浜地区	対象戸数:5戸 (民5戸)	事業計画策定			民5戸	順次住宅建設					
			l 花露辺地区	対象戸数:17戸 (民4戸・公13戸)	事業計画策定			民4戸・公13戸	順次住宅建設					
			m 本郷地区	対象戸数:32戸 (民16戸・公16戸)	事業計画策定				民16戸 公16戸	順次住宅建設				
			n 唐丹地区(小白浜)	対象戸数:51戸 (民31戸・公20戸)	事業計画策定			公20戸 民31戸	順次住宅建設					
			o 荒川地区	対象戸数:14戸 (民3戸・公11戸)	事業計画策定			民3戸 公11戸	順次住宅建設					
			p 東部地区	区域面積:26.8ha	事業準備・住民合意									
			q 鶴住居地区	区域面積:18.4ha	事業準備・住民合意									
			津波復興拠点		調査・設計等	用地								

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。



三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	r 室浜地区	集落道 他 対象戸数: 4戸 (民4戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			s 仮宿地区	集落道、用地造成 他 対象戸数4戸 (民4戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			t 桑ノ浜地区	集落道 他	事業準備	設計、用地等				工事				
			u 花露辺地区	集落道 他	事業準備	設計、用地等		★工事						
			v 大石地区	集落道 他	事業準備	設計、用地等				工事				
			w 新浜町地区	用地造成他	事業準備	設計、用地等		工事						
			x 佐須地区	用地造成他 対象戸数: 6戸 (民4戸・公2戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			y 根浜地区	用地造成他 対象戸数: 2戸 (民2戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			z 箱崎地区	用地造成他 対象戸数: 21戸 (民21戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			aa 箱崎白浜地区	集落道 他 対象戸数: 4戸 (民4戸)	事業準備	設計、用地等		★工事						
			ab 両石地区	用地造成他	事業準備	設計、用地等		工事						
			ac 尾崎白浜地区	避難路 他	事業準備	設計、用地等		工事						
			ad 本郷地区	用地造成他 対象戸数3戸 (民3戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			ae 唐丹地区	集落排水施設整備 L=3.353m 処理施設整備1式				調査・測量・設計		工事				
	まちづくり連携道路	県	1 (一) 吉里吉里釜石線	室浜の2		施工準備		用地	用地・工事の推進					
			2 (一) 桜峠平田線	平田の2		施工準備			用地・工事の推進					
			3 (一) 吉浜上荒川線	下荒川の2		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
			4 (一) 吉里吉里釜石線	室浜		施工準備			用地	用地・工事の推進				
			5 (一) 唐丹日頃市線	荒川		施工準備		用地買収		工事の推進				
			6 (国)283号	松原		施工準備				★用地・工事の推進				
			7 (主)釜石遠野線	鶴住居				施工準備			用地・工事の推進			

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。



三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石

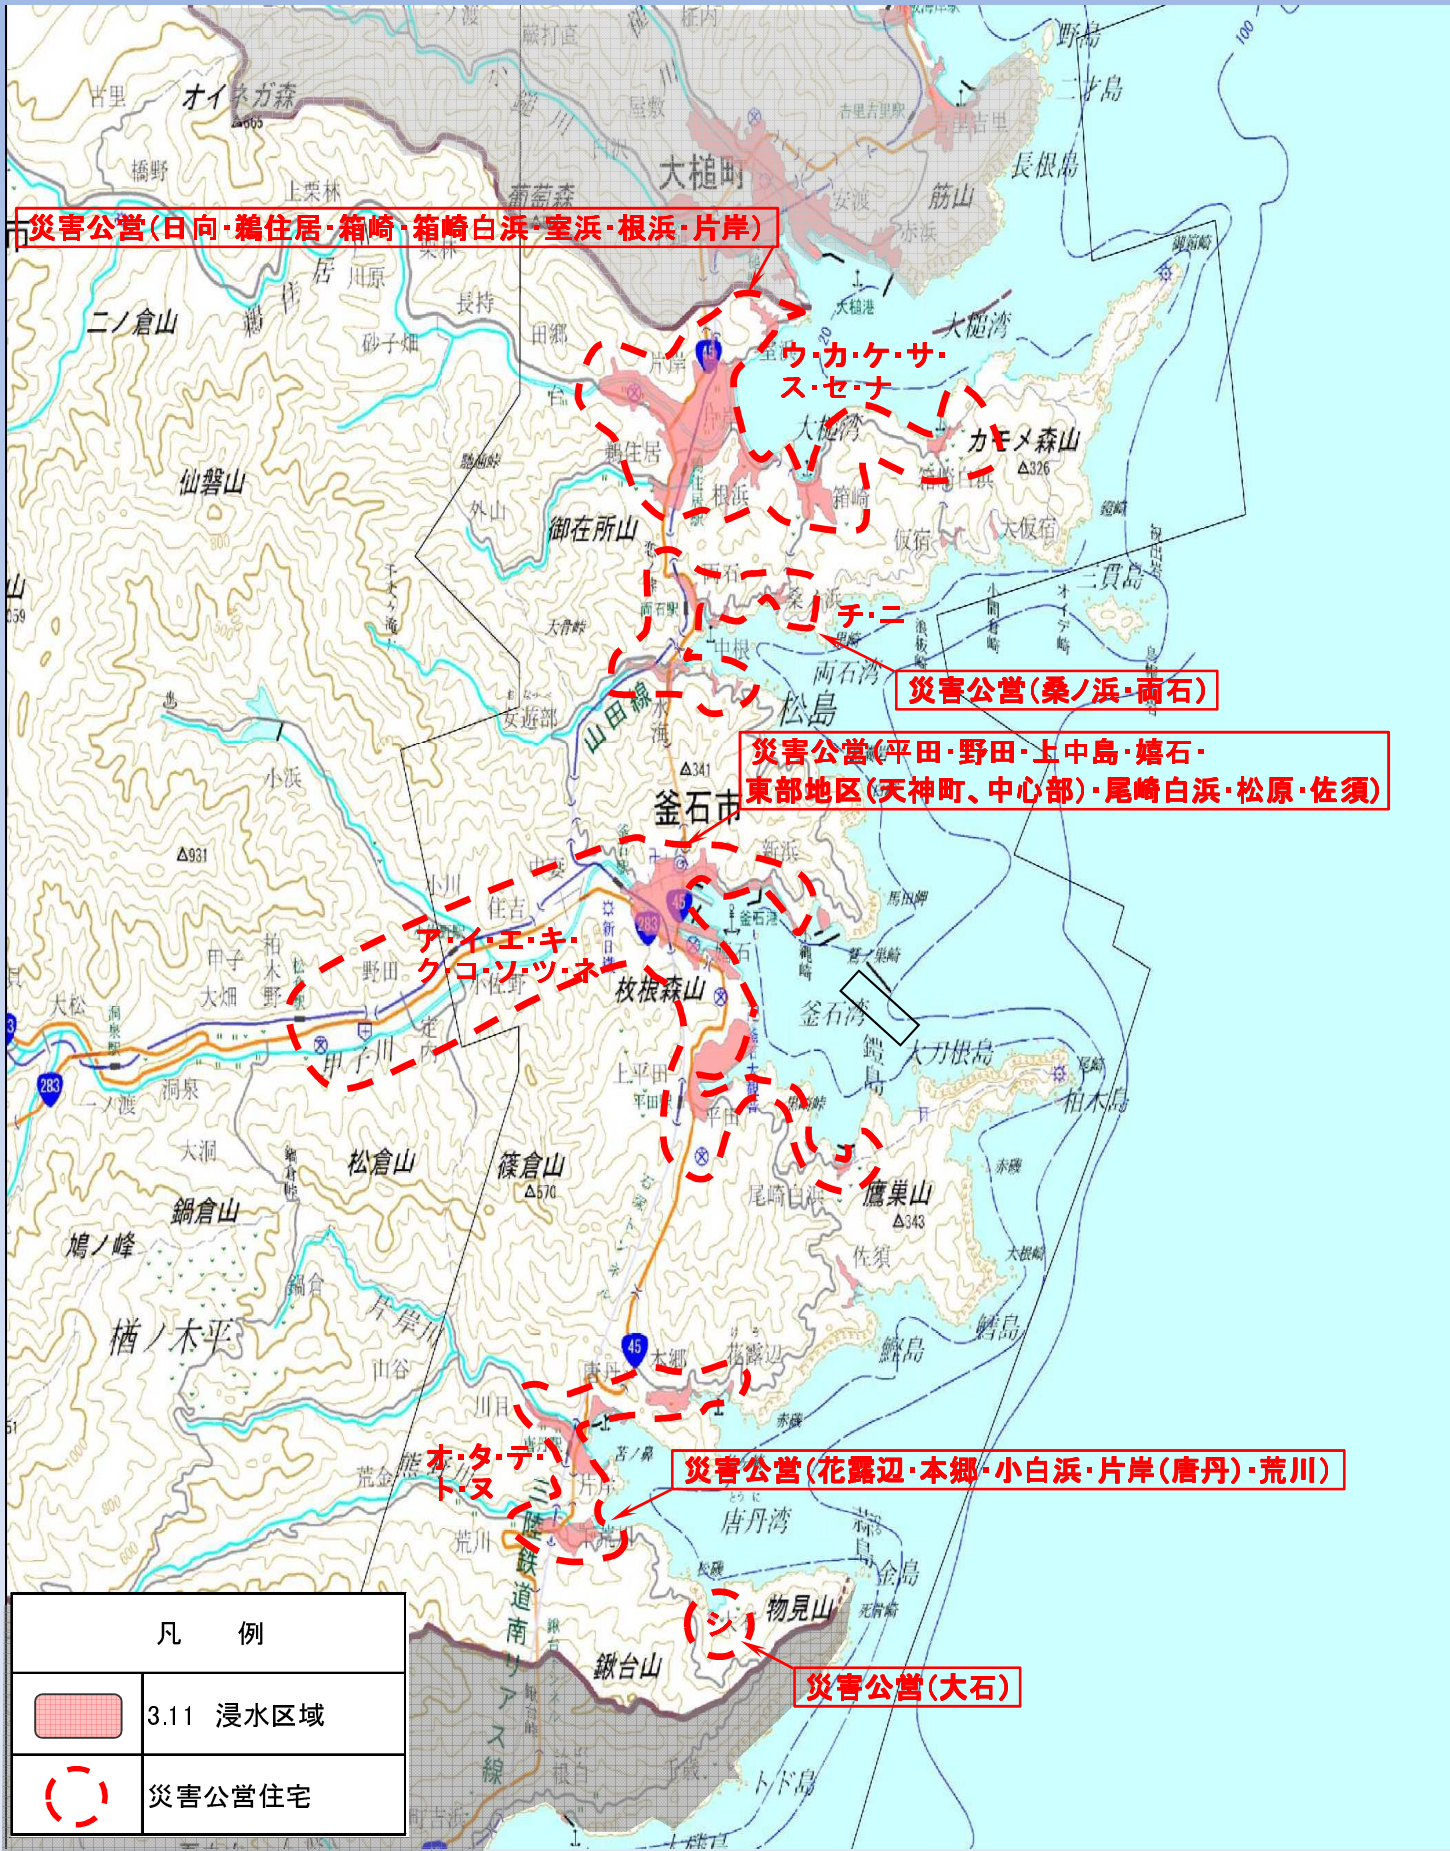


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期（基盤復興期間）			第2期（本格復興期間）			第3期（更なる展開への連結期間）			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 平田（単独）	RC造7階 予定戸数：126戸	設計	★工事	126戸							
			イ 野田（単独）	RC造5階 予定戸数：32戸	設計	☆工事	32戸	■H25.10完了						
			ウ 日向（単独）	RC造5階 予定戸数：30戸		用地	設計	30戸	工事					
			その他	予定戸数：10戸			用地・設計・工事	10戸						
	買収		エ-1 上中島（単独）	S造 予定戸数：54戸	設計 ☆工事	54戸	■H25.3完了							
			エ-2 上中島（単独）	S造 予定戸数：156戸		用地	設計	156戸	工事					
			オ 花露辺（防：花露辺地区）	RC造 予定戸数：13戸	用地	設計 ☆工事	13戸	■H25.12完了						
			カ 鶴住居（区：鶴住居地区）	RC造 予定戸数：135戸		用地	設計	135戸	工事					
	直接建設	市	キ 嬉石（区：嬉石・松原地区）	RC造 予定戸数：100戸		用地	設計	100戸	工事					
			ク 東部地区（天神町）（単独）	RC造 予定戸数：40戸		用地	設計	40戸	工事					
			ケ 箱崎（防：箱崎地区）	木造 予定戸数：37戸		用地	設計	19戸	工事	設計	工事			
			コ 尾崎白浜（単独）	木造 予定戸数：5戸		用地	設計	5戸	工事					
			サ 箱崎白浜（単独）	木造 予定戸数：10戸		用地	設計	10戸	★工事					
			シ 大石（単独）	木造 予定戸数：3戸		用地	設計	3戸	☆工事	■H25.12完了				
			ス 室浜（防：室浜地区）	木造 予定戸数：19戸		用地	設計	19戸	工事					
			セ 根浜（防：根浜地区）	木造 予定戸数：18戸		用地	設計	18戸	工事					
			ソ 東部地区（中心部）（単独）	RC造 予定戸数：310戸		用地	設計	310戸	工事					
			タ 本郷（防：本郷地区）	木造 予定戸数：16戸		用地	設計	16戸	工事					
			チ 桑ノ浜（防：桑ノ浜地区）	木造 予定戸数：16戸		用地	設計	16戸	工事					
			ツ 松原（区：嬉石・松原地区）	RC造 予定戸数：55戸		用地	設計	55戸	工事					
			テ-1 小白浜（単独）	RC造 予定戸数：20戸		用地	設計	20戸	工事					
			テ-2 小白浜（防：唐丹地区）	RC造 予定戸数：20戸		用地	設計	20戸	工事					
			ト 片岸（唐丹）（単独）	木造 予定戸数：10戸		用地	設計	10戸	工事					
			ナ 片岸（単独）	RC造 予定戸数：80戸		用地	設計	80戸	工事					
			ニ 両石（防：両石地区）	予定戸数：86戸		用地	設計	86戸	工事					
			ヌ 荒川（防：荒川地区）	木造 予定戸数：11戸		用地	設計	11戸	工事					
			ネ 佐須（漁：佐須地区）	木造 予定戸数：2戸		用地	設計	2戸	工事					
						用地	設計							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。



三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石

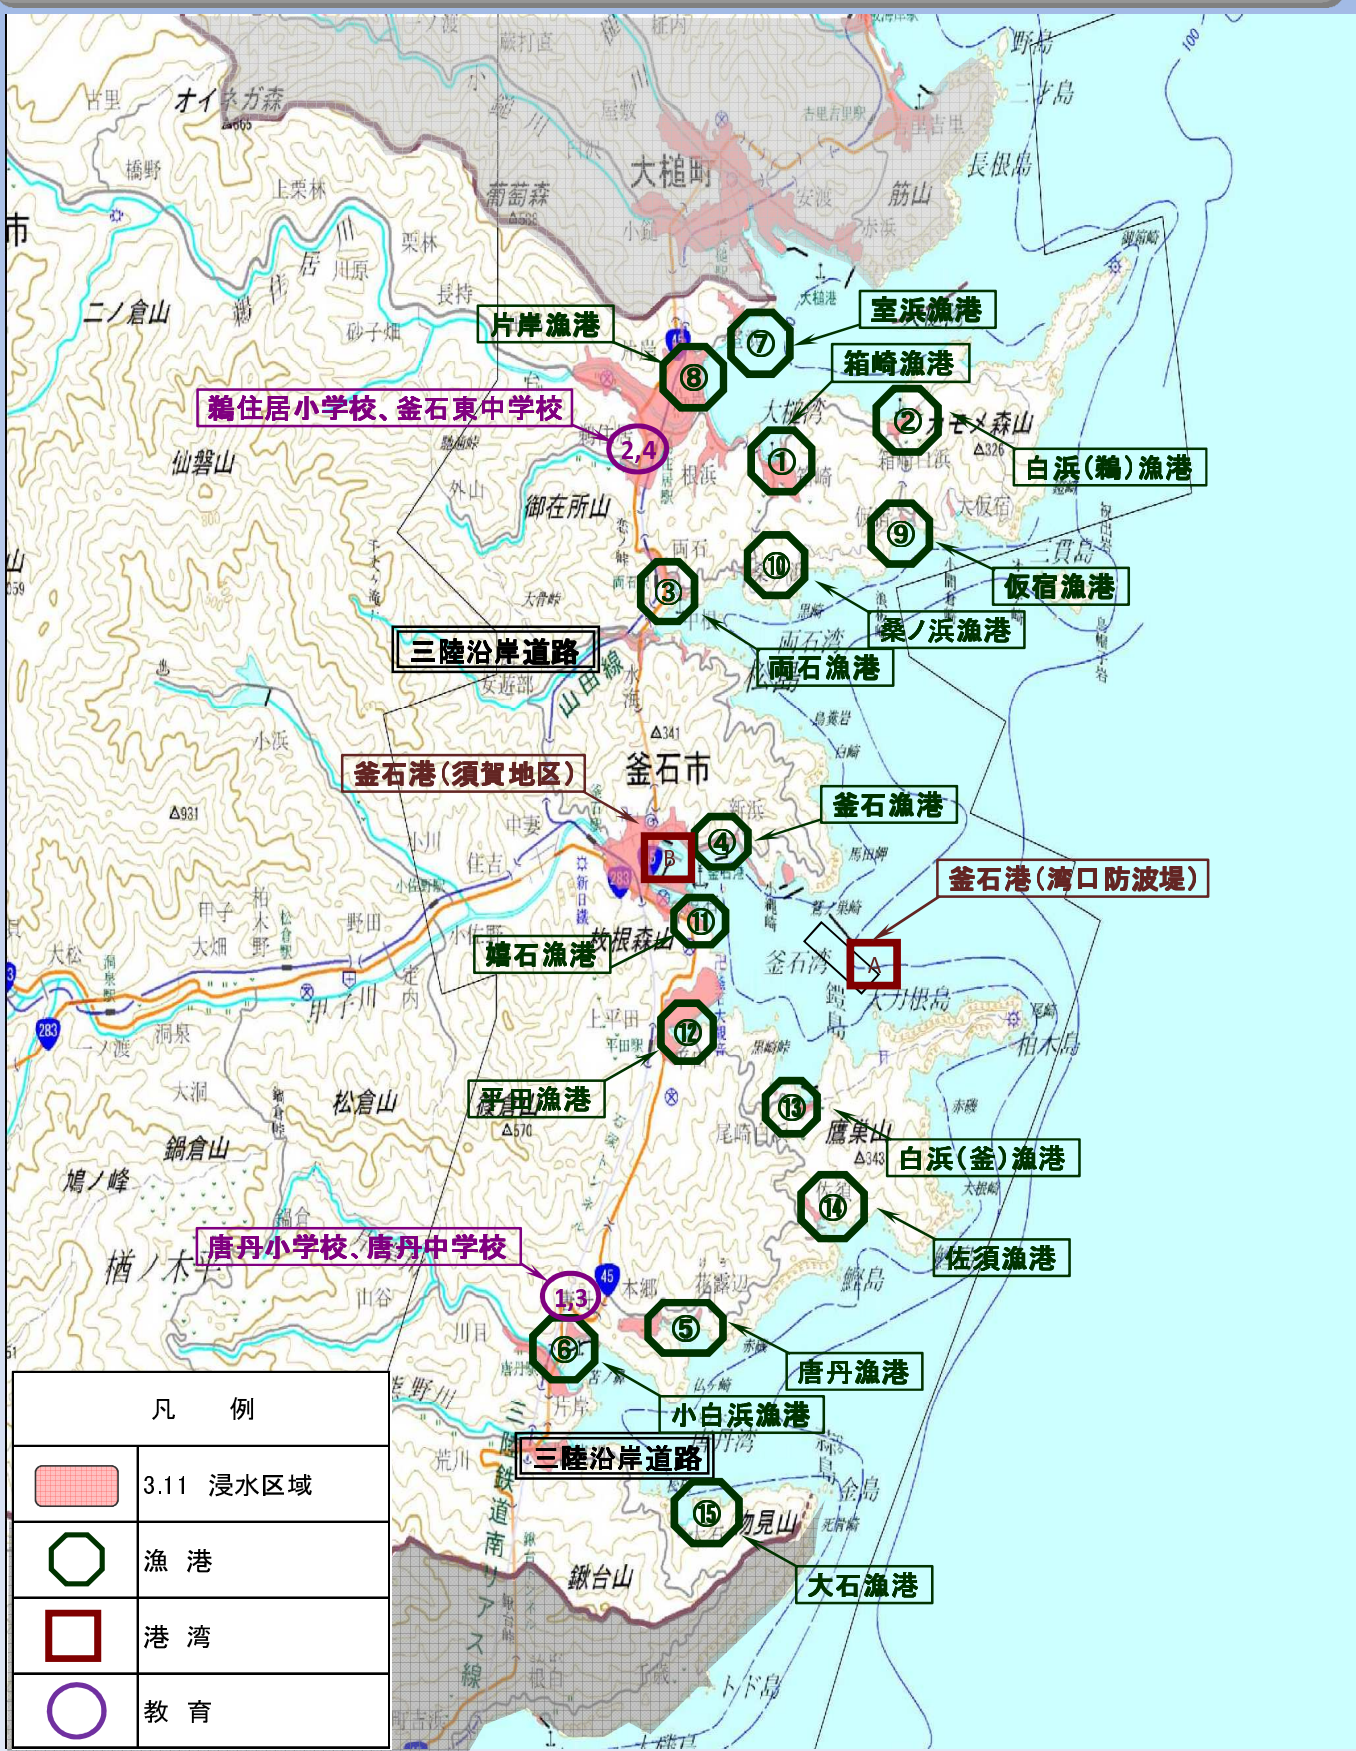

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
漁 港	漁 港	県	① 箱崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=624m、岸壁L=889m 他	施工準備	★工事								
			② 白浜(鵜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=505m、岸壁L=504m 他	施工準備	★工事								
			③ 両石漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、岸壁L=834m 他	施工準備	★工事								
			④ 釜石漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,120m、岸壁L=1,898m 他	施工準備	★工事								
			⑤ 唐丹漁港	(漁港災害) 防波堤L=623m、岸壁L=572m 他	施工準備	★工事								
			⑥ 小白浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=819m、岸壁L=834m 他	施工準備	★工事								
		市	⑦ 室浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=163m、岸壁L=190m 他	施工準備	★工事								
			⑧ 片岸漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、岸壁L=135m 他	施工準備	工事								
			⑨ 仮宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=130m、岸壁L=60m 他	施工準備	★工事								
			⑩ 桑ノ浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=209m、岸壁L=250m 他	施工準備	★工事								
			⑪ 嬉石漁港	(漁港災害) 防波堤L=76m、岸壁L=304m 他	施工準備	★工事								
			⑫ 平田漁港	(漁港災害) 防波堤L=215m、岸壁L=598m 他	施工準備	★工事								
			⑬ 白浜(釜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=449m、岸壁L=378m 他	施工準備	★工事								
			⑭ 佐須漁港	(漁港災害) 防波堤L=174m、岸壁L=103m 他	施工準備	★工事								
			⑮ 大石漁港	(漁港災害) 防波堤L=361m、岸壁L=233m 他	施工準備	★工事								
港 湾	釜石港	国	A 湾口防波堤	(直轄災害復旧) 防波堤L=1,660m	施工準備	★工事(平成27年度完成予定)								
		県	B 須賀地区	(災害復旧) 南防波堤L=266m、-4.0m1号物揚場L=200m、-7.5m岸壁L=152m他	暫定供用	公共上屋☆1号、☆2号 ☆防波堤、★岸壁、★臨港道路 ★物揚場								
教 育	小学校	市	1 唐丹小学校	(災害復旧) 移転	住民合意・事業準備	用地取得・設計	造成工事							4校とも移転完了まで仮設校舎を使用
			2 鵜住居小学校	(災害復旧) 移転	住民合意・事業準備	用地取得・設計	造成工事							校舎・体育館等建設
			3 唐丹中学校	(災害復旧) 現敷地で新築	住民合意・事業準備	用地取得・設計	造成工事							校舎・体育館等建設
			4 釜石東中学校	(災害復旧) 移転	住民合意・事業準備	用地取得・設計	造成工事							校舎・体育館等建設


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。



**基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)**

大船渡農林振興センター(0192-41-0567)  
大船渡水産振興センター(0192-27-5081)  
【市】大船渡市水産課 (0192-27-3111)

**命を守り、夢を育むまちづくりと  
防災に協働するまち大船渡**

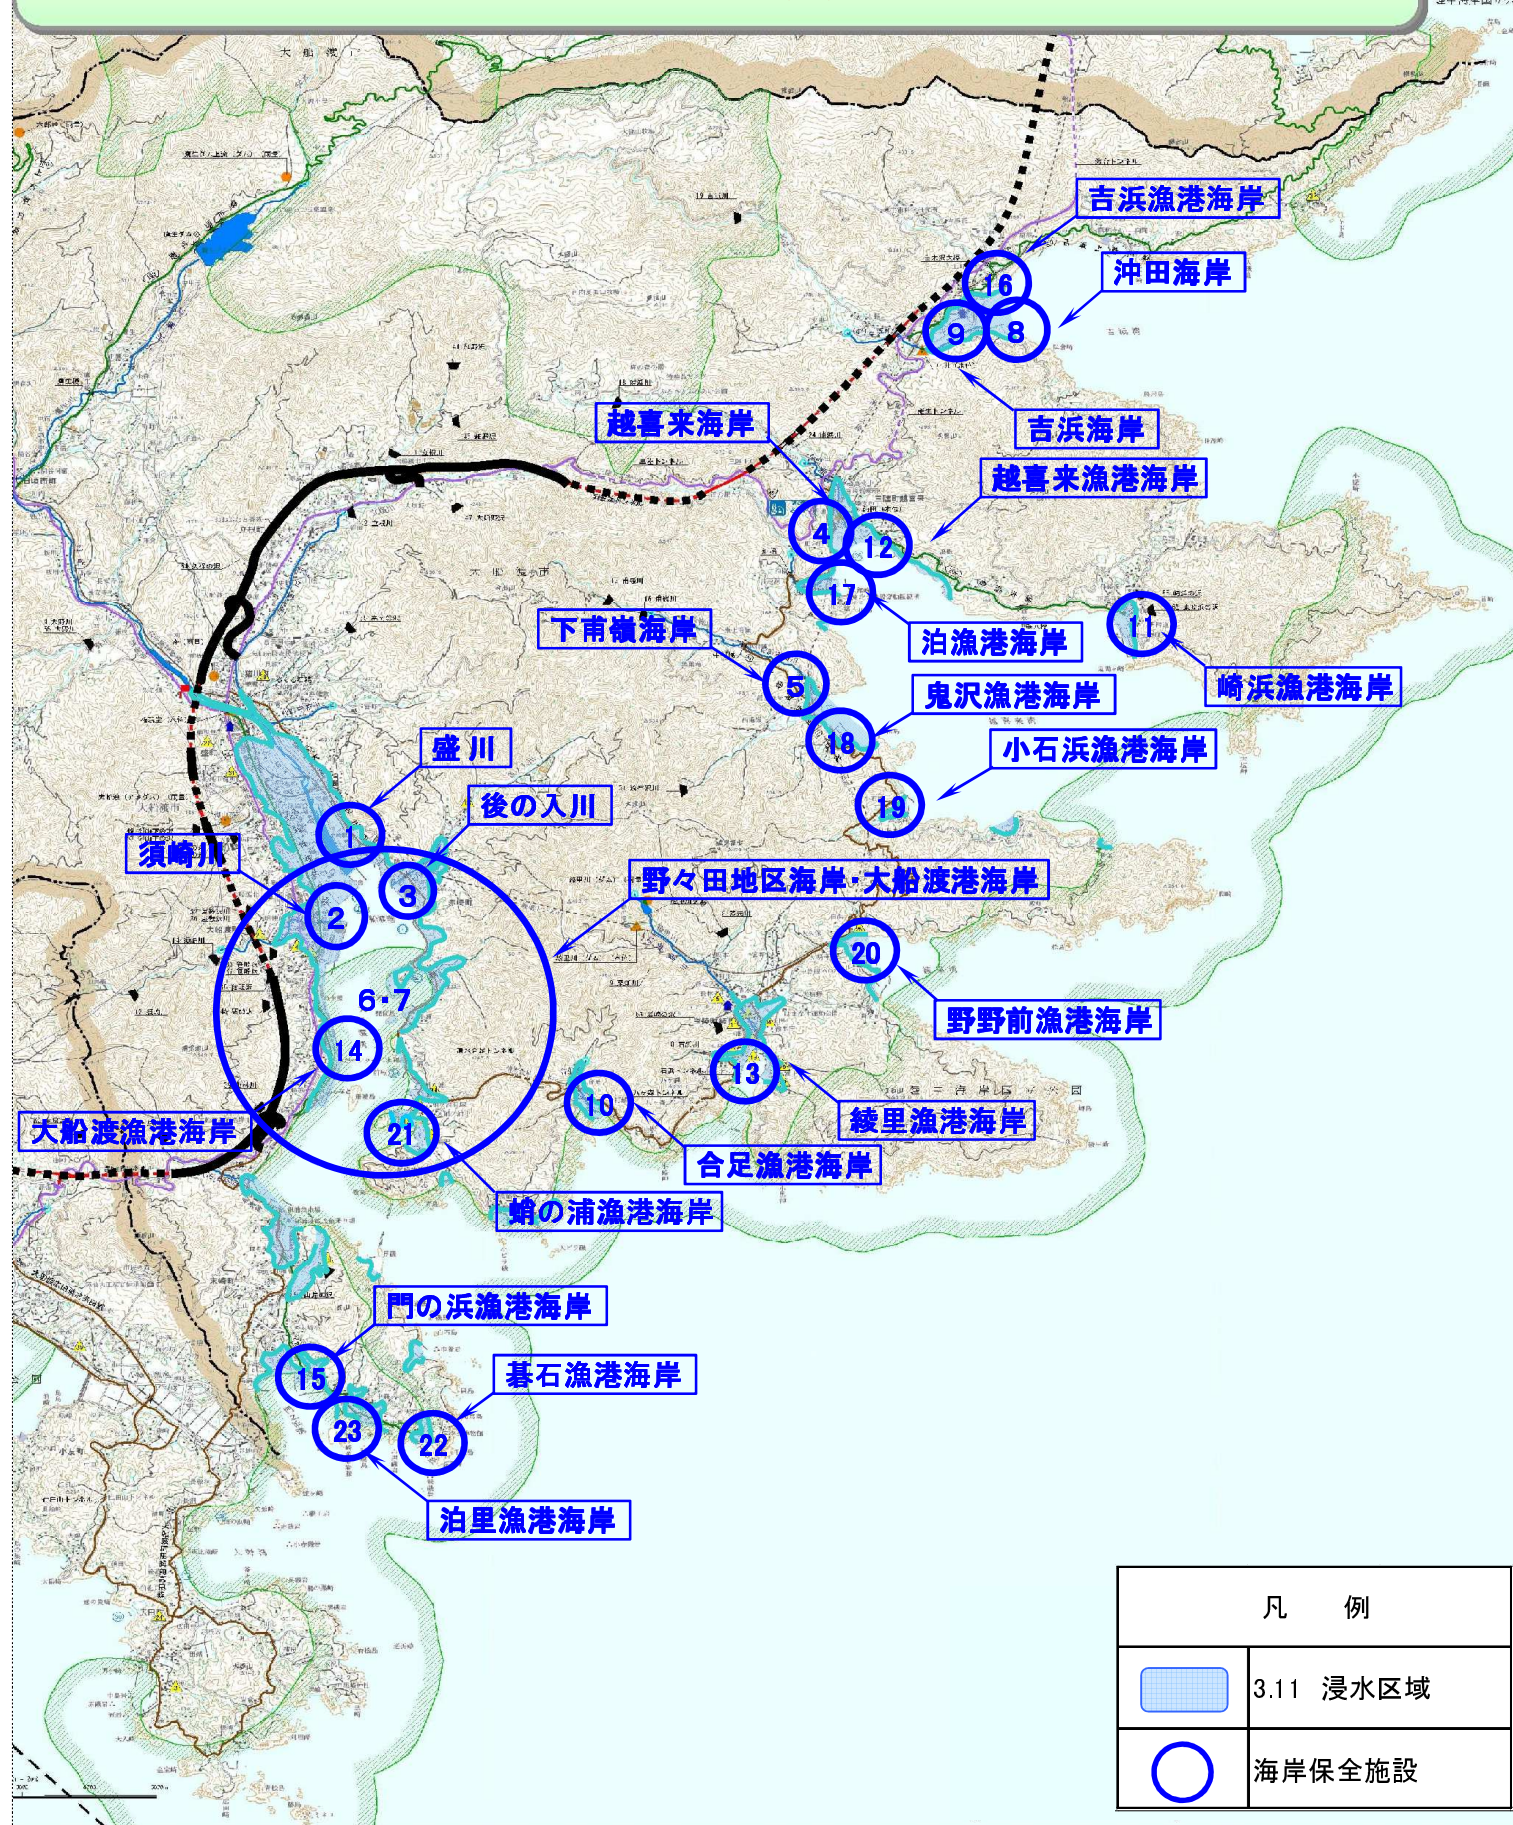

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  <										

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。




社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市 2／5】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【市】大船渡市集団移転課、住宅公園課、  
水産課(0192-27-3111)

命を守り、夢を育むまちづくりと  
防災に協働するまち大船渡

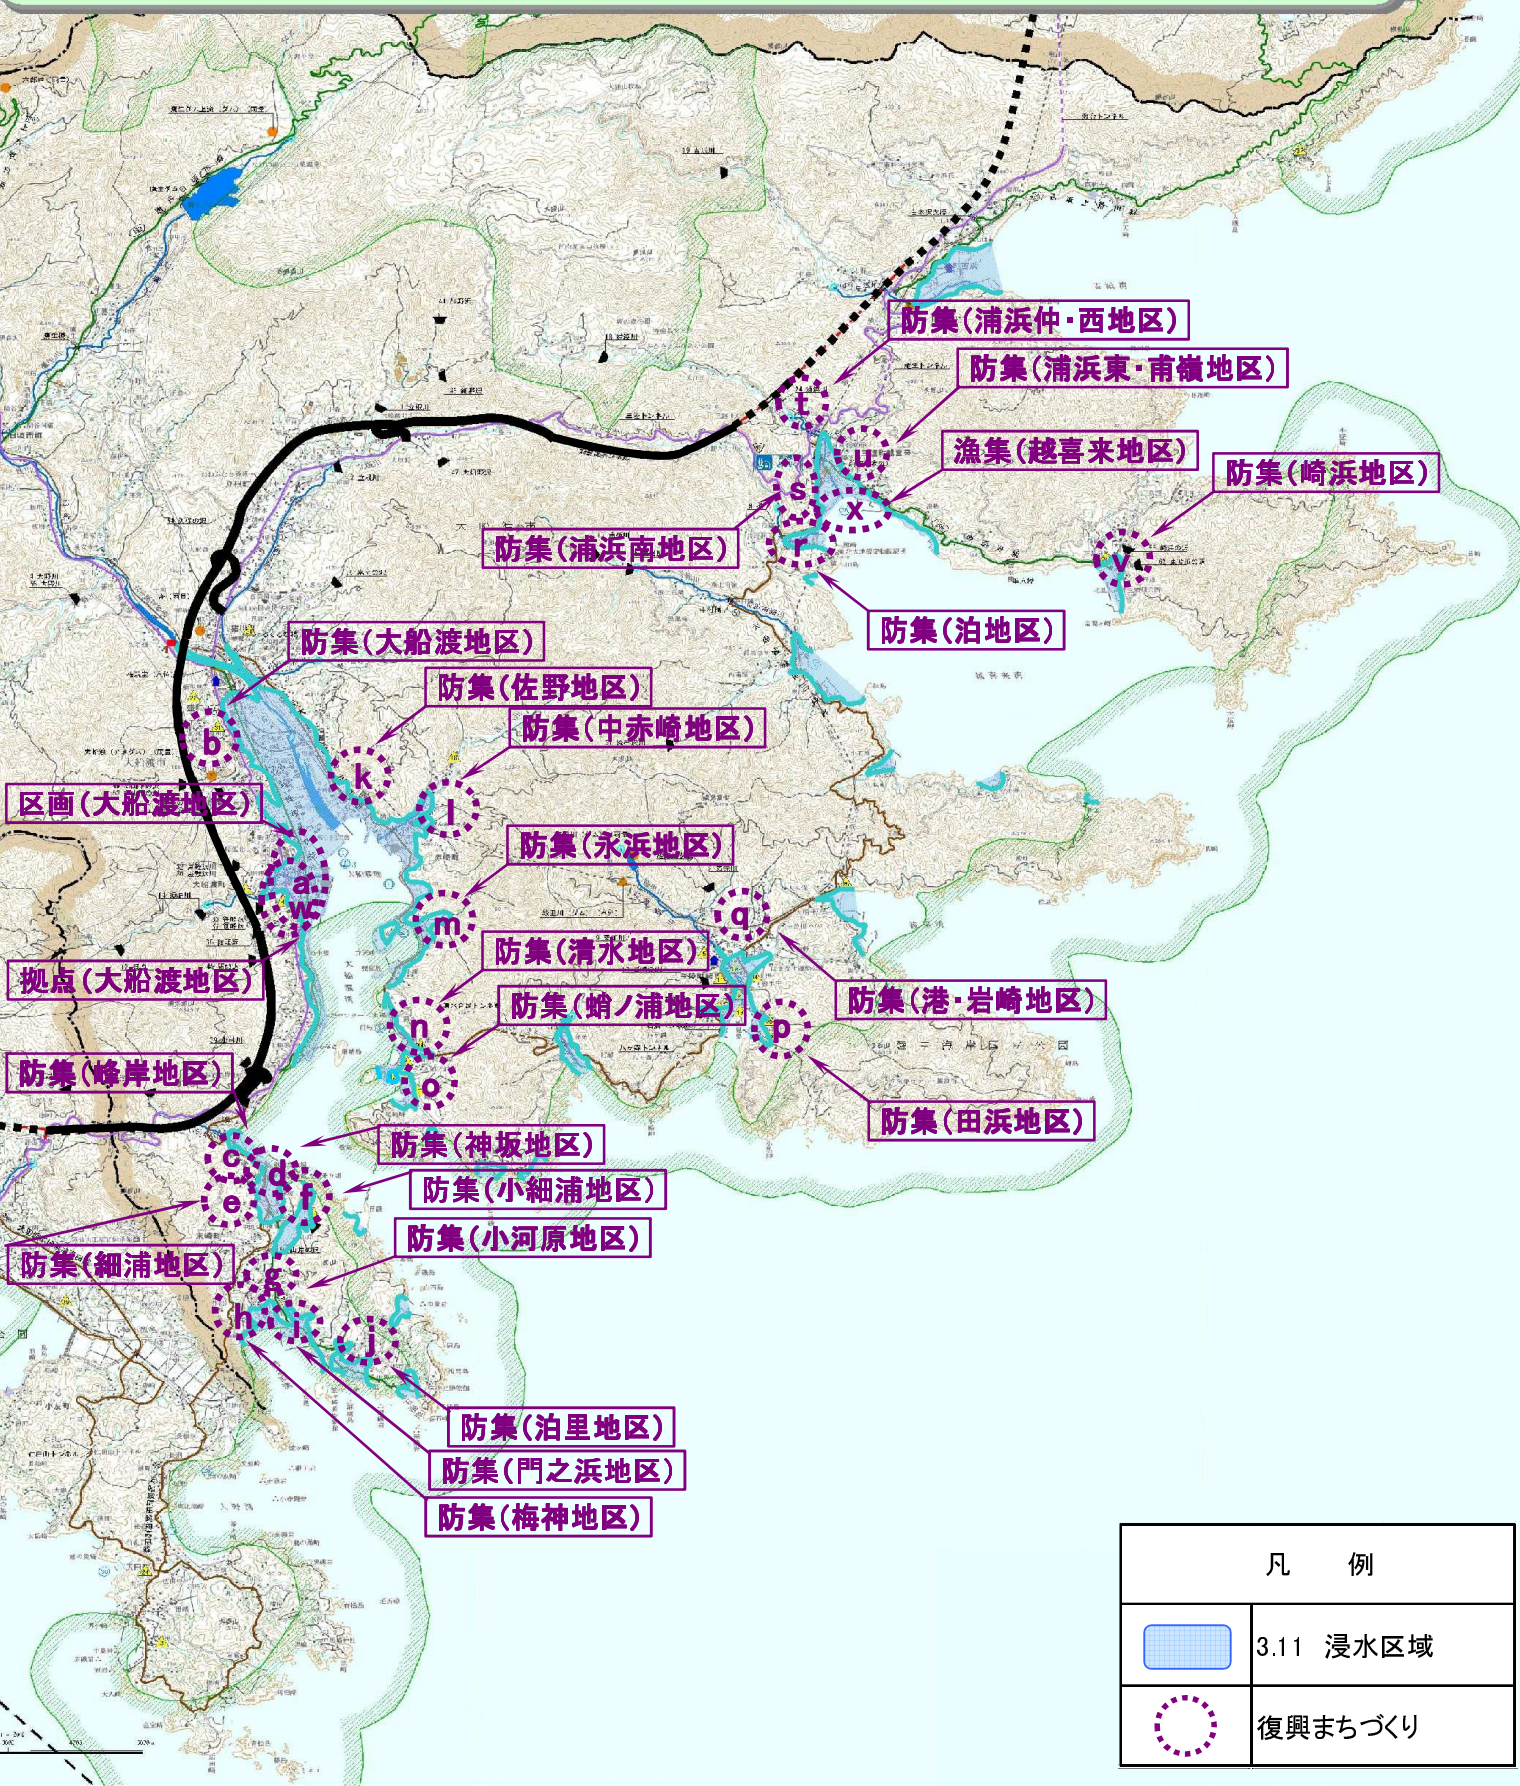

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興まちづくり	土地区画整理	市	a 大船渡駅周辺地区	区域面積:約33.8ha 対象戸数300戸(民300戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	用地	工事	順次建物建設				民300戸	
			b 大船渡地区	対象戸数:21戸(民21戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設				民21戸	
			c 峰岸地区	対象戸数:21戸(民21戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査(埋文含む)・設計等	工事	住宅建設				民21戸	
			d 神坂地区	対象戸数:9戸(民9戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設				民9戸	
			e 細浦地区	対象戸数:13戸(民13戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事	住宅建設				民13戸	
			f 小細浦地区	対象戸数:8戸(民8戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	☆工事	住宅建設	■H25.12完了			民8戸	
			g-1 小河原地区(平林)	対象戸数:29戸(民29戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設				民29戸	
			g-2 小河原地区(上山)	対象戸数:6戸(民6戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設				民6戸	
			g-3 小河原地区(鶴巻)	対象戸数:6戸(民6戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設				民6戸	
			h 梅神地区	対象戸数:13戸(民13戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設				民13戸	
	防災集団移転	市	i 門之浜地区	対象戸数:13戸(民13戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事	住宅建設				民13戸	
			j 泊里地区	対象戸数:17戸(民17戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設				民17戸	
			k 佐野地区	対象戸数:5戸(民5戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事	住宅建設				民5戸	
			l 中赤崎地区	対象戸数:77戸(民77戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設				民77戸	
			m 永浜地区	対象戸数:32戸(民32戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設				民32戸	
			n 清水地区	対象戸数:6戸(民6戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査等	★工事	住宅建設				民6戸	
			o 蛸ノ浦地区	対象戸数:16戸(民16戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設				民16戸	
			p 田浜地区	対象戸数:12戸(民12戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事	住宅建設				民12戸	
			q 港・岩崎地区	対象戸数:23戸(民23戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事	住宅建設				民23戸	
			r 泊地区	対象戸数:13戸(民13戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事	住宅建設				民13戸	
	津波復興拠点	市	s 浦浜南地区	対象戸数:11戸(民11戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事	住宅建設				民11戸	
			t 浦浜仲・西地区	対象戸数:10戸(民10戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設				民10戸	
			u 浦浜東・南嶺地区	対象戸数:10戸(民10戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査(埋文含む)・設計等	工事	住宅建設				民10戸	
			v 崎浜地区	対象戸数:21戸(民21戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査(埋文含む)・設計等	工事	住宅建設				民21戸	
			w-1 大船渡地区	区域面積:約4.2ha(先行整備区域2.3ha)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定	調査・設計等	★工事						
			w-2 大船渡地区	区域面積:約4.2ha(第2段階整備区域1.9ha)		都市計画決定・事業計画策定	調査・設計等	用地	工事					
			x 越喜来地区	集落道、用地造成他 対象戸数:15戸(民15戸)	事業準備	設計・用地等		工事					民15戸	

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。




社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市 3 / 5】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)  
【市】(教)生涯学習課(0192-27-3111内271)

命を守り、夢を育むまちづくりと  
防災に協働するまち大船渡

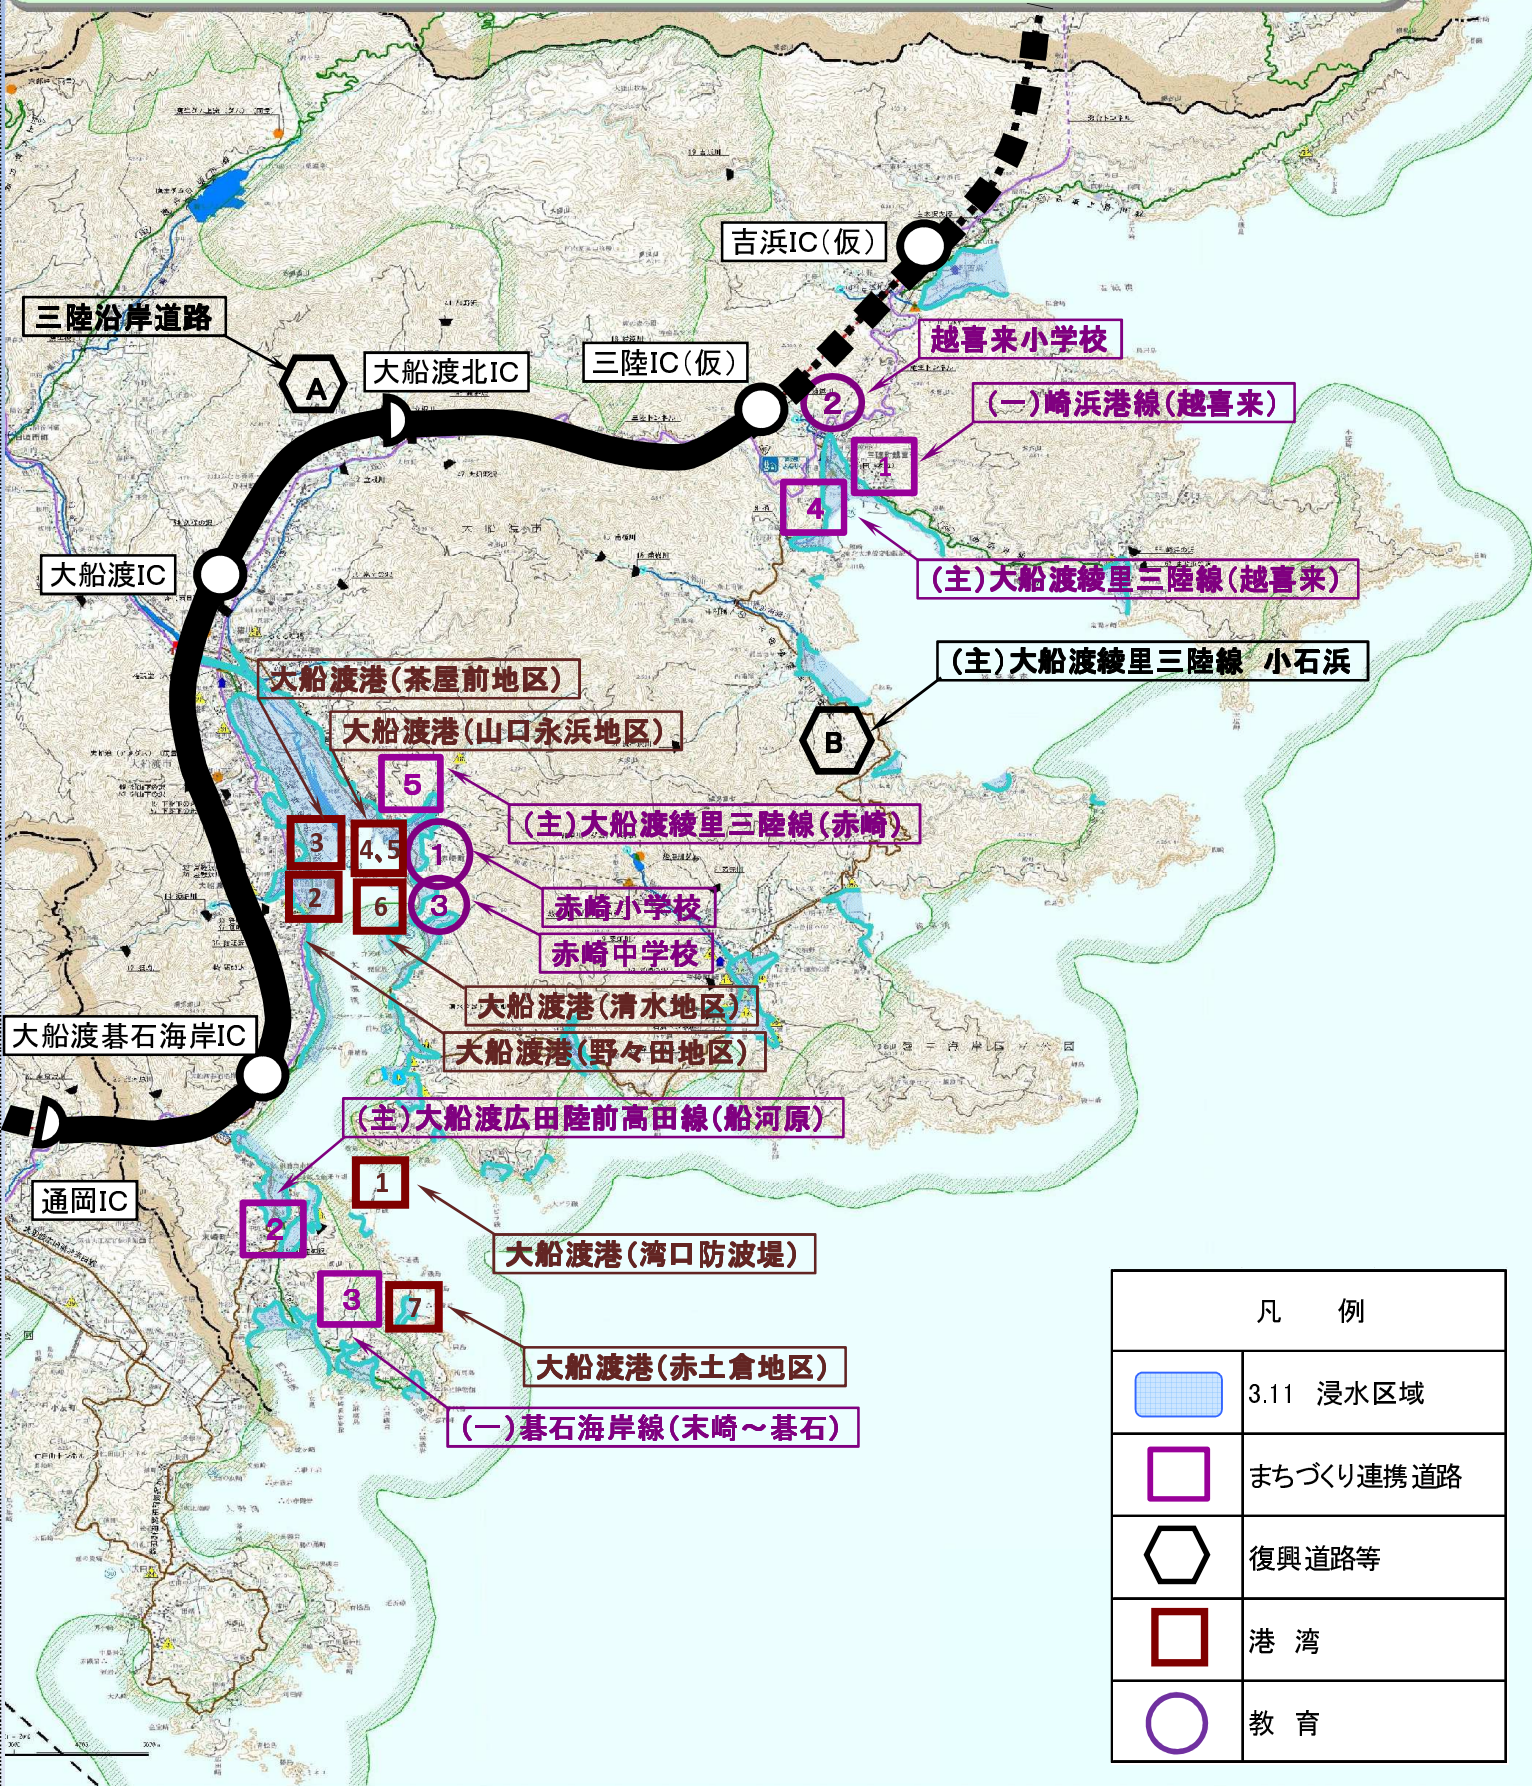

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興まちづくり	街路整備	県	路線数:1路線	整備延長:約3km		事業準備				都市計画変更 事業認可	詳細設計・用地測量	工事		
	まちづくり 連携道路		1 (一)崎浜港線	越喜来		施工準備			用地買収	用地・工事の推進				
			2 (主)大船渡広田 陸前高田線	船河原		施工準備			用地買収	用地・工事の推進				
			3 (一)基石海岸線	末崎～基石		施工準備			用地買収	用地・工事の推進				
			4 (主)大船渡 綾里三陸線	越喜来		施工準備			用地買収	用地・工事の推進				
			5 (主)大船渡 綾里三陸線	赤崎		施工準備			用地買収	用地・工事の推進				
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	吉浜釜石道路 (吉浜～釜石)	(H23 新規)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.2.25起工式								
	復興関連道路	県	B (主)大船渡 綾里三陸線	小石浜	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
港湾	大船渡港	県	1 湾口防波堤	(直轄災害復旧) 防波堤L=535m	施工準備	★工事(平成27年度完成予定)								
			2 野々田地区	(災害復旧) 防波堤L=170m、 須崎防波堤L=60m、 -4.5m岸壁L=150m、 -3.0m物揚場L=87m他	暫定供用	★防波堤、★岸壁、 ★物揚場	★臨港道路			ふ頭保安設備				
			3 茶屋前地区	(災害復旧) -9.0m岸壁L=428m、 -6.0m岸壁L=105m、 -3.0m物揚場L=376m、 -4.0m物揚場L=197m他	暫定供用	★物揚場、★臨港道路	★岸壁、★ふ頭保安設備							
			4 山口地区	(災害復旧) 防波堤L=64m、 さん橋(-2.0m)L=32m、 物揚場L=70m他	暫定供用	★防波堤、★さん橋 ★一部の物揚場・船揚場	一部の物揚場・船揚場、臨港道路							
			5 永浜地区	(災害復旧) 防波堤L=192m、 -2.0m物揚場L=108m、 -2.0m2号物揚場138m	暫定供用	★防波堤 ★一部の物揚場	一部供用	一部の物揚場						
			6 清水地区	(災害復旧) 防波堤L=109m、 物揚場L=285m、 船揚場L=98m	暫定供用	★防波堤 ★物揚場 ★一部の船揚場	一部供用	一部の船揚場、臨港道路						
			7 赤土倉地区	(災害復旧) 南防波堤L=79m、 北防波堤L=165m、 -2.0m2号物揚場 L=104m他	暫定供用	★防波堤 ★物揚場 ★臨港道路	一部供用	船揚場						
教育	小学校	市	1 赤崎小学校	(災害復旧) 移転	事業準備・ 住民合意	移転完了まで蛸ノ浦小を使用				用地取得・設計	造成工事	校舎・体育館等建設		
			2 越喜来小学校	(災害復旧) 移転	事業準備・ 住民合意	移転完了まで旧甫嶺小を使用				用地取得・設計	造成工事	校舎・体育館等建設		
	中学校	3 赤崎中学校	(災害復旧) 移転	事業準備・ 住民合意	移転完了まで仮設校舎を使用				用地取得・設計	造成工事	校舎・体育館等建設			


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。



社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市 4／5】 基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【県】大船渡土木センター (0192-27-9919)  
【市】大船渡市集団移転課、住宅公園課 (0192-27-3111)

命を守り、夢を育むまちづくりと  
防災に協働するまち大船渡

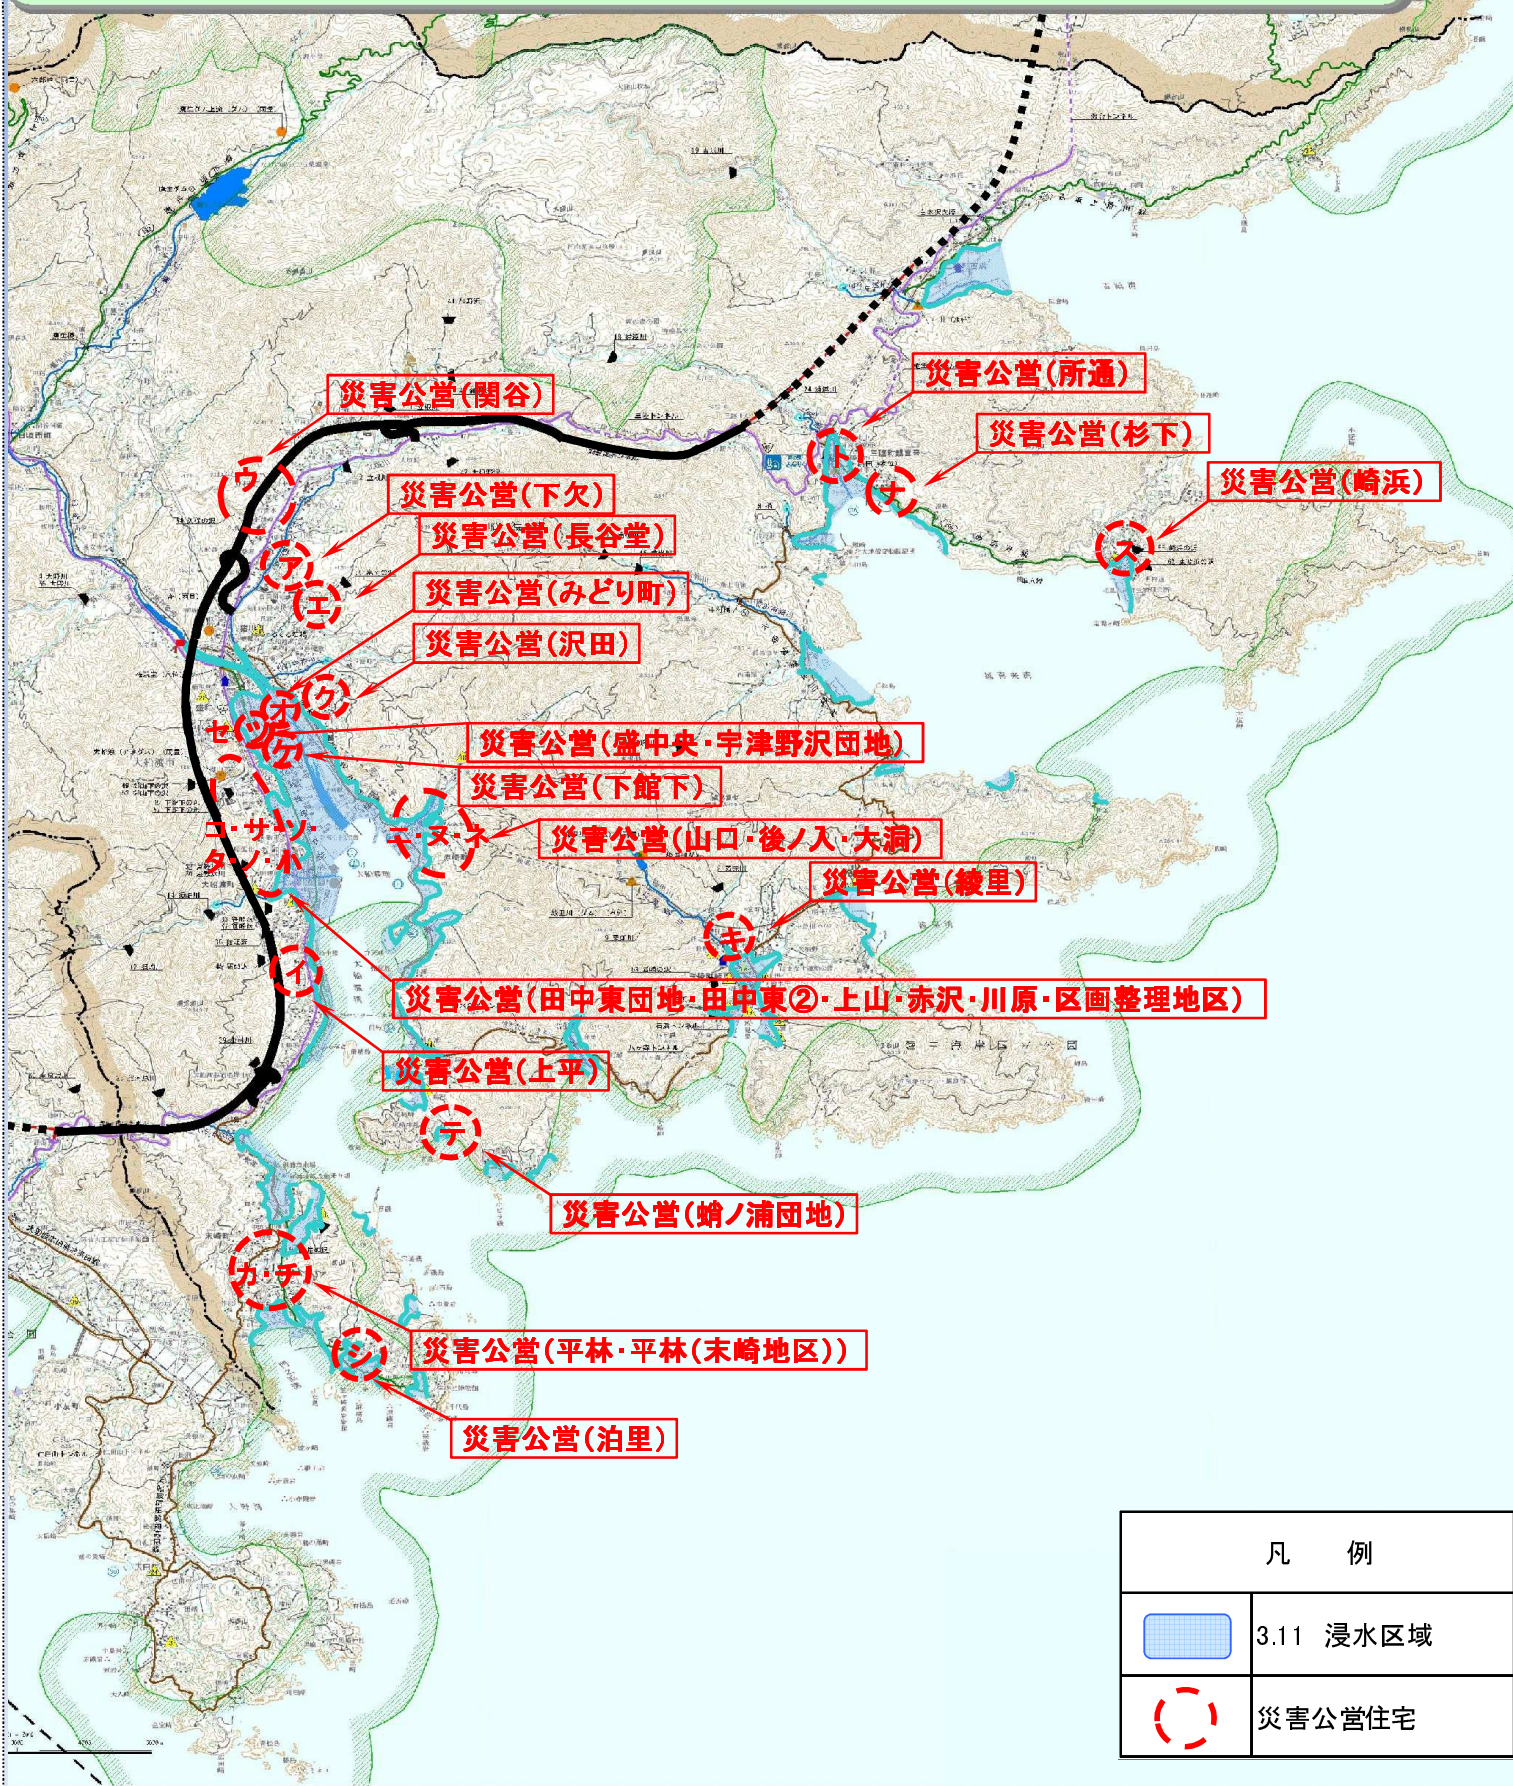

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H29	H30
災害公営住宅	直接建設	県	ア 下欠(単独)	RC造3階 予定戸数:33戸		用地	設計	★工事	33戸					
			イ 上平(単独)	RC造7階 予定戸数:65戸		用地	設計	★工事	65戸					
			ウ 関谷(単独)	RC造5階 予定戸数:50戸		用地	設計	工事	50戸					
			エ 長谷堂(単独)	RC造3階 予定戸数:53戸		用地	設計	★工事	53戸					
			オ みどり町(単独)	RC造6階 予定戸数:147戸		用地	設計	工事	147戸					
			カ 平林(単独)	RC造4階 予定戸数:56戸		用地		設計・工事	56戸					
	設計・施工一括選定	県	キ 綾里(単独)	RC造3階 予定戸数:30戸		用地		設計・工事	30戸					
			ク 沢田(単独)	RC造3階 予定戸数:20戸		用地		設計・工事	20戸					
			ケ 下館下(単独)	RC造8階 予定戸数:53戸			用地	設計・工事	53戸					
			コ 田中東団地(大船渡地区)(単独)	木造2階 予定戸数:12戸		設計	★工事	12戸	■H25.3完了					
	直接建設	市	サ 田中東②(大船渡地区)(単独)	木造2階 予定戸数:7戸		用地	設計	★工事	7戸					
			シ 泊里(末崎地区)(単独)	木造平屋 予定戸数:6戸			用地・造成	設計	6戸					
			ス 崎浜(越喜来地区)(単独)	木造平屋 予定戸数:7戸			用地・造成	設計	7戸					
			セ 盛中央(単独)	RC造5階 予定戸数:44戸		★買取		■H24.12入居開始	44戸					
			ソ 上山(大船渡地区)(単独)	RC造3階 予定戸数:11戸		用地・造成	設計	★工事	11戸					
			タ 赤沢(大船渡地区)(単独)	RC造5階 予定戸数:23戸		用地・造成	設計	★工事	23戸					
	買取	市	チ 平林(末崎地区)(単独)	RC造3階 予定戸数:11戸		用地・造成	設計	★工事	11戸					
			ツ 宇津野沢団地(単独)	RC造3階 予定戸数:20戸		用地・造成	設計	★工事	20戸					
			テ 蛸ノ浦団地(赤崎地区)(単独)	RC造3階 予定戸数:14戸		用地	造成	設計	14戸					
			ト 所通(越喜来浦浜地区)(単独)	RC造3階 予定戸数:17戸				設計	17戸					
			ナ 杉下(越喜来浦浜地区)(単独)	木造平屋 予定戸数:6戸			用地	設計	6戸					
			ニ 山口(赤崎地区)(単独)	RC造3階 予定戸数:14戸			用地	設計	14戸					
			ヌ 後ノ入(赤崎地区)(単独)	木造平屋 予定戸数:6戸			用地	設計	6戸					
			ネ 大洞(赤崎地区)(単独)	木造平屋 予定戸数:6戸			用地	造成	6戸					
			ノ 川原(単独)	RC造3階 予定戸数:29戸			用地	設計	29戸					
			ハ 区画整理地区(大船渡地区)(単独)	RC造5階 予定戸数:50戸				用地	設計	50戸				

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。




社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市 5／5】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【県】 大船渡水産センター(0192-27-5081)  
【市】 大船渡市水産課 (0192-27-3111)

命を守り、夢を育むまちづくりと  
防災に協働するまち大船渡

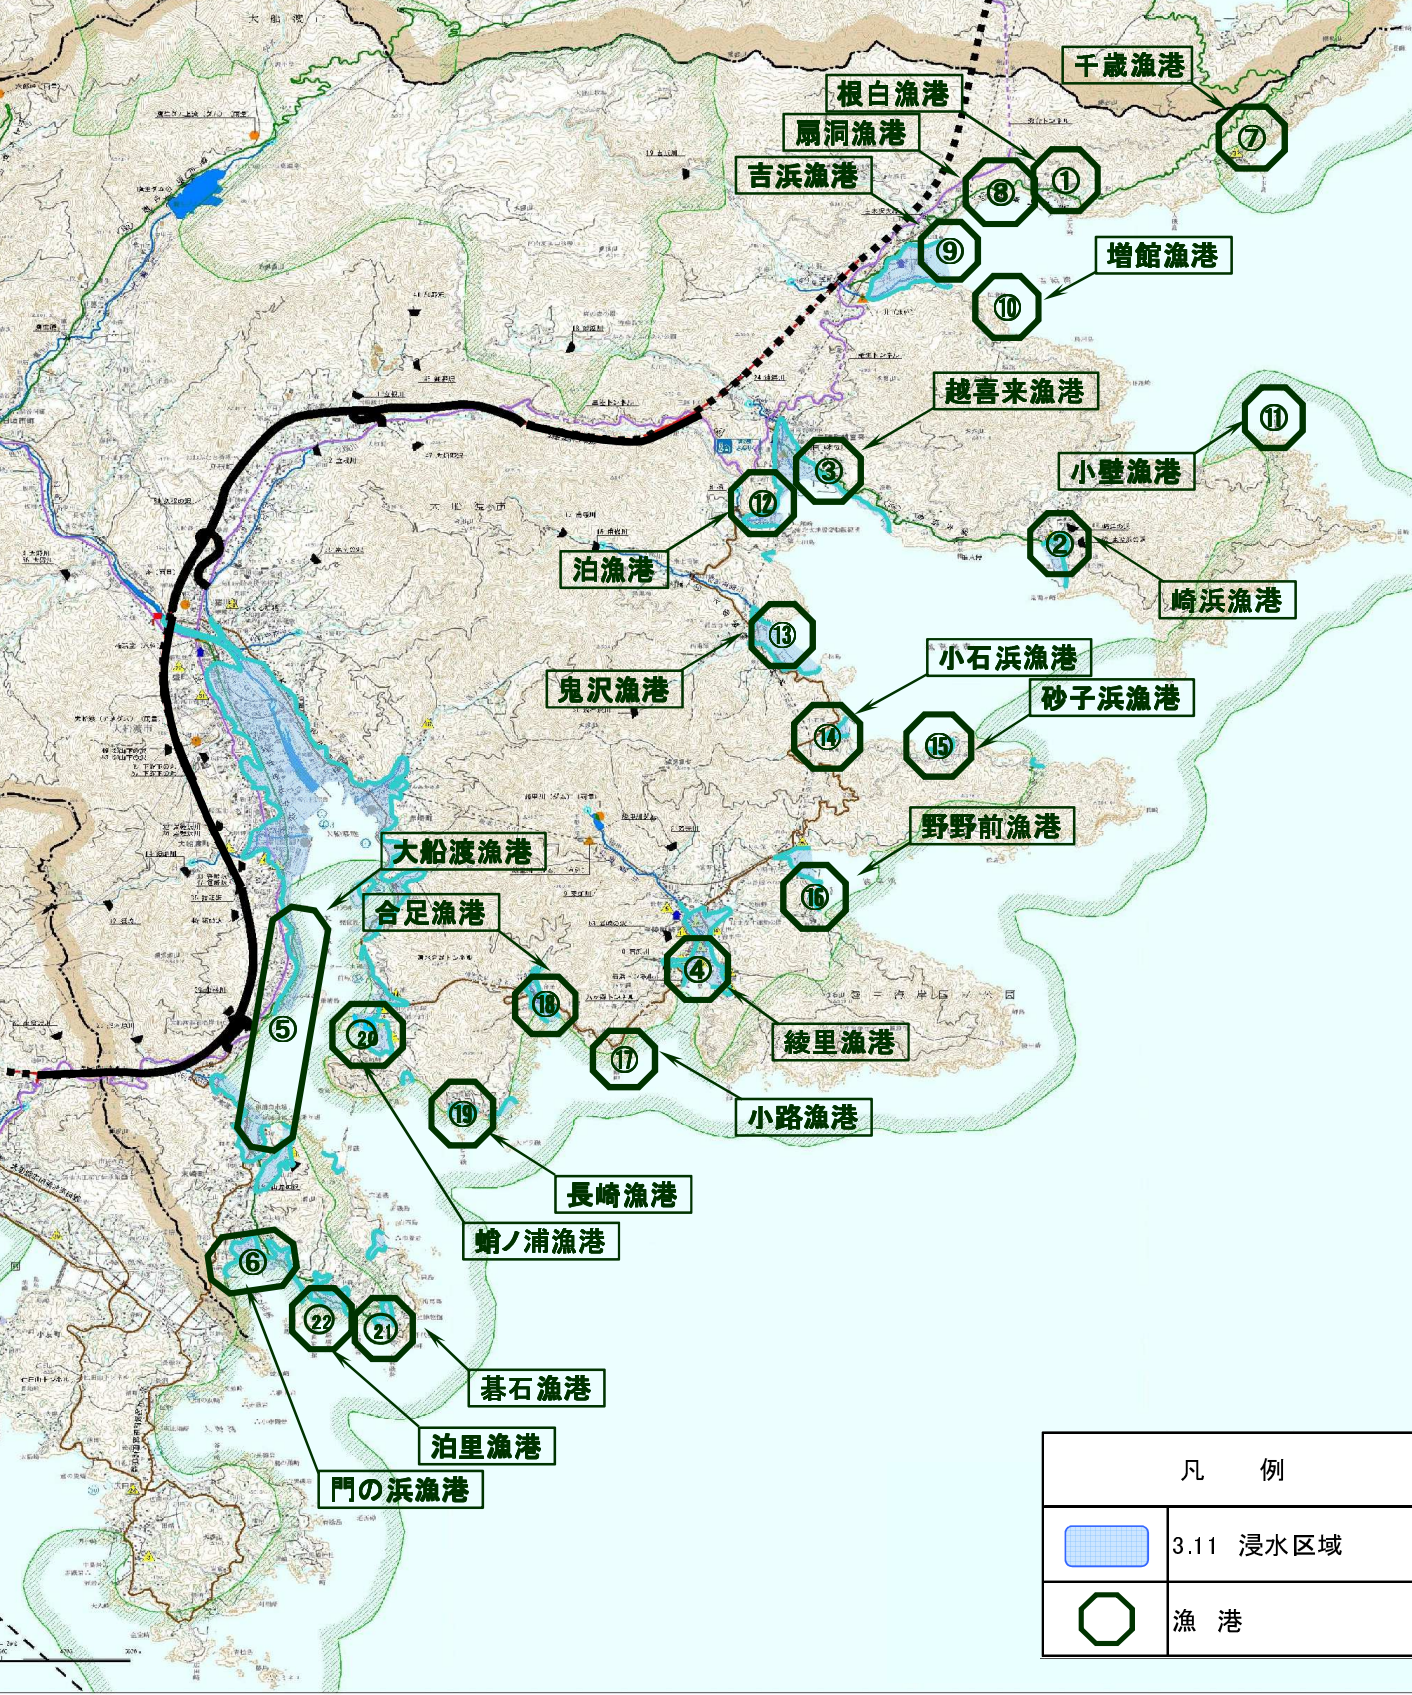

凡 例	
	3.11 浸水区域
	漁 港

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
漁 港	漁 港	県	① 根白漁港	(漁港災害) 防波堤L=748m、 岸壁L=638m 他	<div>施工準備</div>										
			応急対策	<div>★工事</div>											
			② 崎浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=721m、 岸壁L=827m 他	<div>施工準備</div>										
			応急対策	<div>★工事</div>											
			③ 越喜来漁港	(漁港災害) 防波堤L=580m、 岸壁L=436m 他	<div>施工準備</div>										
			応急対策	<div>★工事</div>											
		④ 綾里漁港	(漁港災害) 防波堤L=402m、 岸壁L=1,102m 他	<div>施工準備</div>											
		応急対策	<div>★工事</div>												
		⑤ 大船渡漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,263m、 岸壁L=3,512m 他	<div>施工準備</div>											
		応急対策	<div>★工事</div>												
		⑥ 門の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=907m、 岸壁L=575m 他	<div>施工準備</div>											
		応急対策	<div>★工事</div>												
		市	⑦ 千歳漁港	(漁港災害) 防波堤L=212m、 岸壁L=108m 他	<div>施工準備</div>										
					<div>★工事</div>										
			⑧ 扇洞漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=23m 他	<div>施工準備</div>										
			応急対策	<div>★工事</div>											
			⑨ 吉浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=223m、 岸壁L=185m 他	<div>施工準備</div>										
			応急対策	<div>★工事</div>											
			⑩ 増館漁港	(漁港災害) 防波堤L=137m、 岸壁L=15m 他	<div>施工準備</div>										
				<div>★工事</div>											
			⑪ 小壁漁港	(漁港災害) 岸壁L=44m 他	<div>施工準備</div>										
				<div>★工事</div>											
⑫ 泊漁港	(漁港災害) 防波堤L=283m、 岸壁L=202m 他		<div>施工準備</div>												
応急対策	<div>★工事</div>														
⑬ 鬼沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=329m、 岸壁L=209m 他		<div>施工準備</div>												
応急対策	<div>★工事</div>														
⑭ 小石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=422m、 岸壁L=239m 他		<div>施工準備</div>												
応急対策	<div>★工事</div>														
⑮ 砂子浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=176m、 岸壁L=247m 他	<div>施工準備</div>													
応急対策	<div>★工事</div>														
⑯ 野野前漁港	(漁港災害) 防波堤L=781m、 岸壁L=484m 他	<div>施工準備</div>													
応急対策	<div>★工事</div>														
⑰ 小路漁港	(漁港災害) 防波堤L=162m、 岸壁L=65m 他	<div>施工準備</div>													
	<div>★工事</div>														
⑱ 合足漁港	(漁港災害) 防波堤L=81m、 岸壁L=45m 他	<div>施工準備</div>													
	<div>★工事</div>														
⑲ 長崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=482m、 岸壁L=475m 他	<div>施工準備</div>													
応急対策	<div>★工事</div>														
⑳ 蛸ノ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=239m、 岸壁L=972m 他	<div>施工準備</div>													
応急対策	<div>★工事</div>														
㉑ 碁石漁港	(漁港災害) 防波堤L=123m、 岸壁L=104m 他	<div>施工準備</div>													
応急対策	<div>★工事</div>														
㉒ 泊里漁港	(漁港災害) 防波堤L=211m、 岸壁L=248m 他	<div>施工準備</div>													
応急対策	<div>★工事</div>														


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。



社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市 1 / 4】 基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)  
大船渡農林振興センター(0192-27-8541)  
大船渡水産振興センター(0192-27-5081)  
医療局(019-629-6347)  
【市】陸前高田市水産課、健康推進課(0192-54-2111)

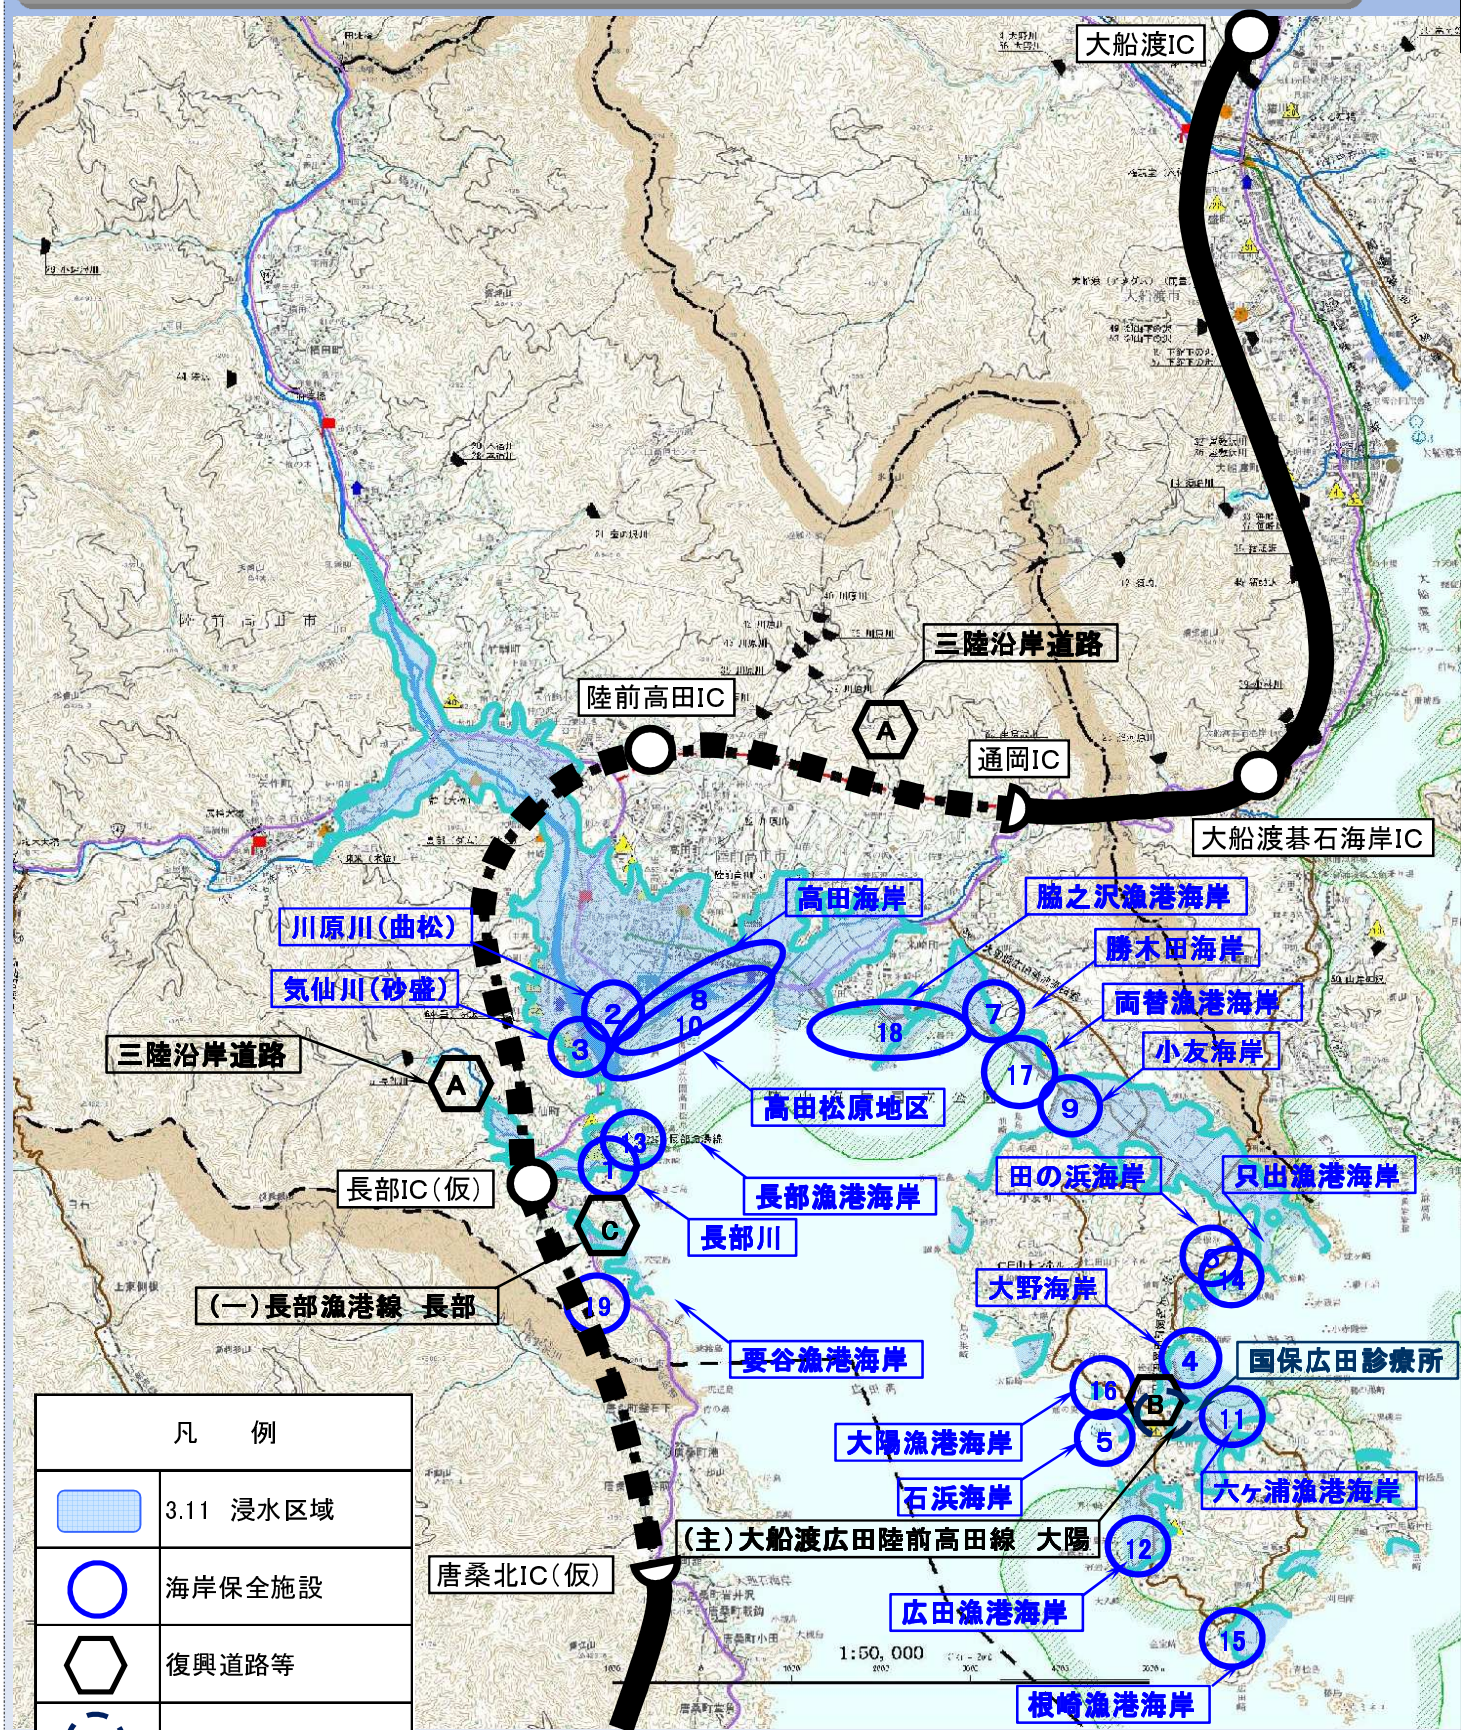

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮) 水門N=1基他	施工準備		★工事							
			2 川原川(曲松)	(災害復旧) 護岸工L=3.4km他	施工準備		★工事							
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧) 水門N=1基	施工準備		★工事							
			4 大野海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、離岸堤L=0.3km他	施工準備		工事							
			5 石浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、離岸堤L=0.12km他	施工準備		★工事							
			6 田の浜海岸	(災害復旧) 護岸工L=0.04km、消波工L=0.02km他	施工準備	☆工事	■H25.1完了							
			7 勝木田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km他	施工準備		★工事							
			8 高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.9km、水門N=1基、人工リーフL=1.2km他	応急対策	施工準備	★工事							
	農地海岸	市	9 小友海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.5km 水門等N=3基	応急対策	施工準備		★工事						
	10 高田松原地区		(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤)L=1.3km	施工準備 (他所管防潮堤との調整・林帯設計等)			工事							
	11-1 六ヶ浦漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備		工事							
	11-2 六ヶ浦(本港地区)		(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他		施工準備		工事							
	12-1 広田漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=10基 他	施工準備		★工事								
	12-2 広田(後浜地区)		(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他		施工準備		工事							
	13 長部漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	施工準備		★工事								
	14 只出漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備		工事							
	15 根岬漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 他	施工準備		工事								
	16 大陽漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他	施工準備		工事								
	17 両替漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=3基 他	応急対策	施工準備		工事							
18 脇之沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=9基 他	応急対策	施工準備		★工事									
19 要谷漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、水門N=7基 他	施工準備		工事										
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	高田道路	(事業中) ★用地・工事の推進									
	復興関連道路	県	B(主) 大船渡広田陸前高田線	大陽	(H23新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.2.6起工式								
			C(一) 長部漁港線	長部	(事業中) ☆用地・工事の推進	■H24.8.24供用開始								
医療	病院	県	県立高田病院	永上山麓地区民有地	建設場所選定					1病棟一般病床50～60床程度、診療科は内科・外科を基本にこれまでの外来診療機能を維持 他				
	医科診療所	市	国保広田診療所	診療所施設整備	用地設計・工事					用地取得・造成	設計	工事		


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。



社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市 2／4】 基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先  
【市】陸前高田市建設課、都市計画課、復興対策局(0192-54-2111)

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

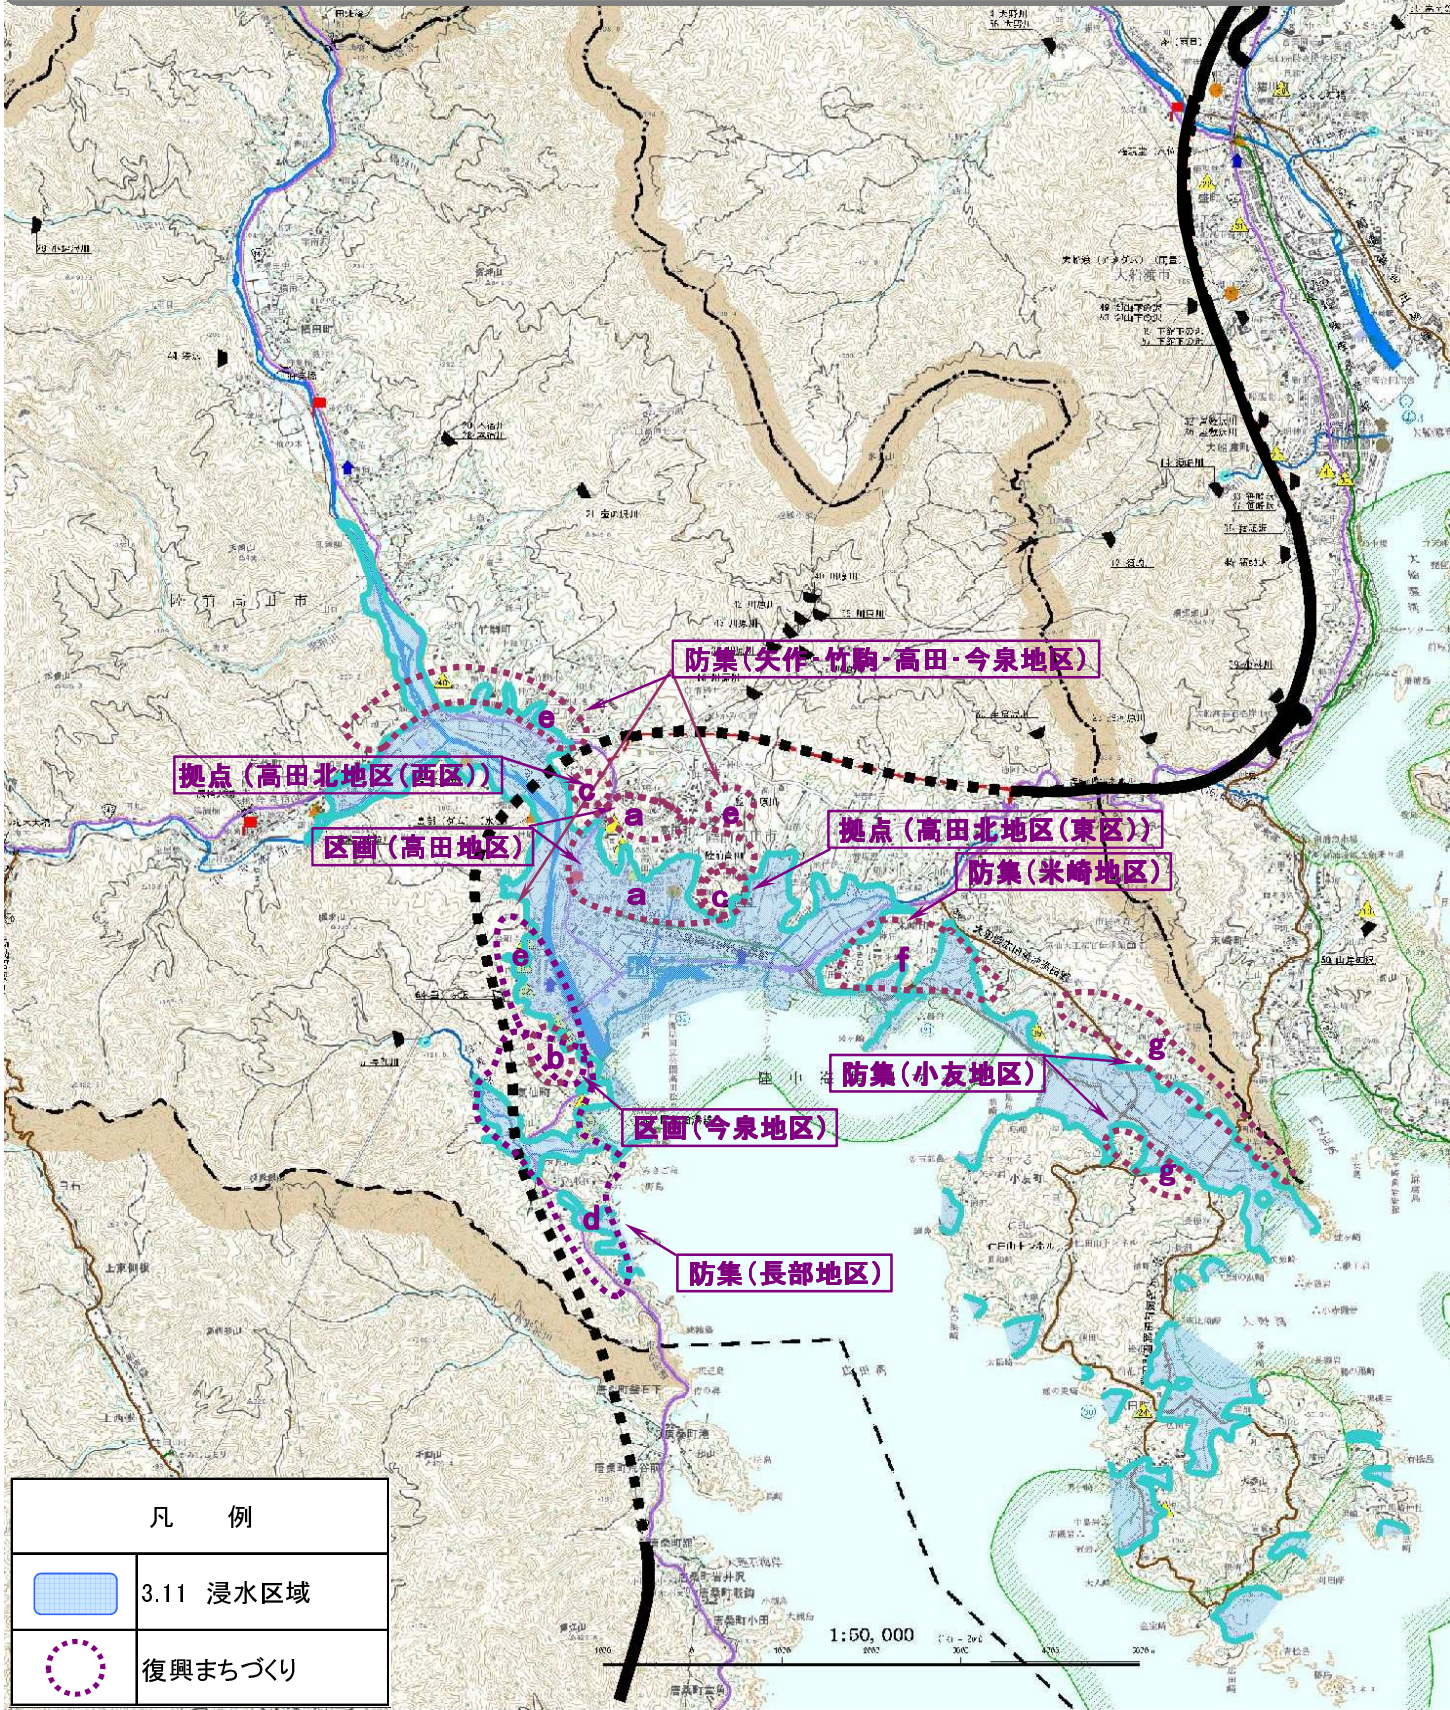

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
土地区画整理	a 高田地区		区域面積:189.8ha 対象戸数1,560戸 (民1,440戸・公120戸)	都市計画決定・事業計画策定等	事前準備					住民合意				
										高台 順次住宅建設 かさ上げ 順次住宅建設				
b 今泉地区			区域面積:113.0ha 対象戸数560戸 (民410戸・公150戸)	都市計画決定・事業計画策定等	事前準備					住民合意				
										高台 順次住宅建設 かさ上げ 順次住宅建設				
津波復興拠点	c-1 高田北地区(西区)		c-1 高田北地区(西区) 区域面積:9.6ha	事業準備	調査・設計等					★工事等				
	c-2 高田北地区(東区)		c-2 高田北地区(東区) 区域面積:9.1ha	事業準備	調査・設計等					★工事等				
復興まちづくり	市	防災集団移転	d-1 長部地区(月山)	対象戸数:54戸 (民54戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民54戸	順次住宅建設				
			d-2 長部地区(上長部)	対象戸数:18戸 (民18戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民18戸	順次住宅建設				
			d-3 長部地区(双六)	対象戸数:12戸 (民12戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民3戸	順次住宅建設				
			d-4 長部地区(要谷)	対象戸数:7戸 (民7戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民7戸	順次住宅建設				
			d-5 長部地区(福伏)	対象戸数:7戸 (民7戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民7戸	順次住宅建設				
			d-6 長部地区(今泉)	対象戸数:15戸 (民15戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事		順次住宅建設				
			e-1 矢作・竹駒・高田・今泉地区(下矢作)	対象戸数:6戸 (民6戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民6戸	順次住宅建設				
			e-2 矢作・竹駒・高田・今泉地区(館)	対象戸数:10戸 (民10戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民10戸	順次住宅建設				
			e-3 矢作・竹駒・高田・今泉地区(下沢)	対象戸数:6戸 (民6戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民6戸	順次住宅建設				
			e-4 矢作・竹駒・高田・今泉地区(高田)	対象戸数:56戸 (民56戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事		順次住宅建設				
			e-5 矢作・竹駒・高田・今泉地区(今泉)	対象戸数:40戸 (民40戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事		順次住宅建設				
			f-1 米崎地区(堂の前)	対象戸数:5戸 (民5戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民5戸	順次住宅建設				
			f-2 米崎地区(脇の沢)	対象戸数:131戸 (民71戸・公60戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民23戸	順次住宅建設				
			g-1 小友地区(両替)	対象戸数:15戸 (民15戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民15戸	順次住宅建設				
			g-2 小友地区(三田市)	対象戸数:5戸 (民5戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民5戸	順次住宅建設				
			g-3 小友地区(柳沢)	対象戸数:9戸 (民9戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民9戸	順次住宅建設				
			g-4 小友地区(茂里花)	対象戸数:5戸 (民5戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民5戸	順次住宅建設				
			g-5 小友地区(新田)	対象戸数:8戸 (民8戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民8戸	順次住宅建設				
			g-6 小友地区(只出)	対象戸数:14戸 (民14戸)	事業準備・住民合意	事業計画	調査・設計等	★工事	民14戸	順次住宅建設				


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。



社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市 3／4】 基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)  
教育委員会事務局(019-629-6106)  
【市】陸前高田市建設課、都市計画課、復興対策局、

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

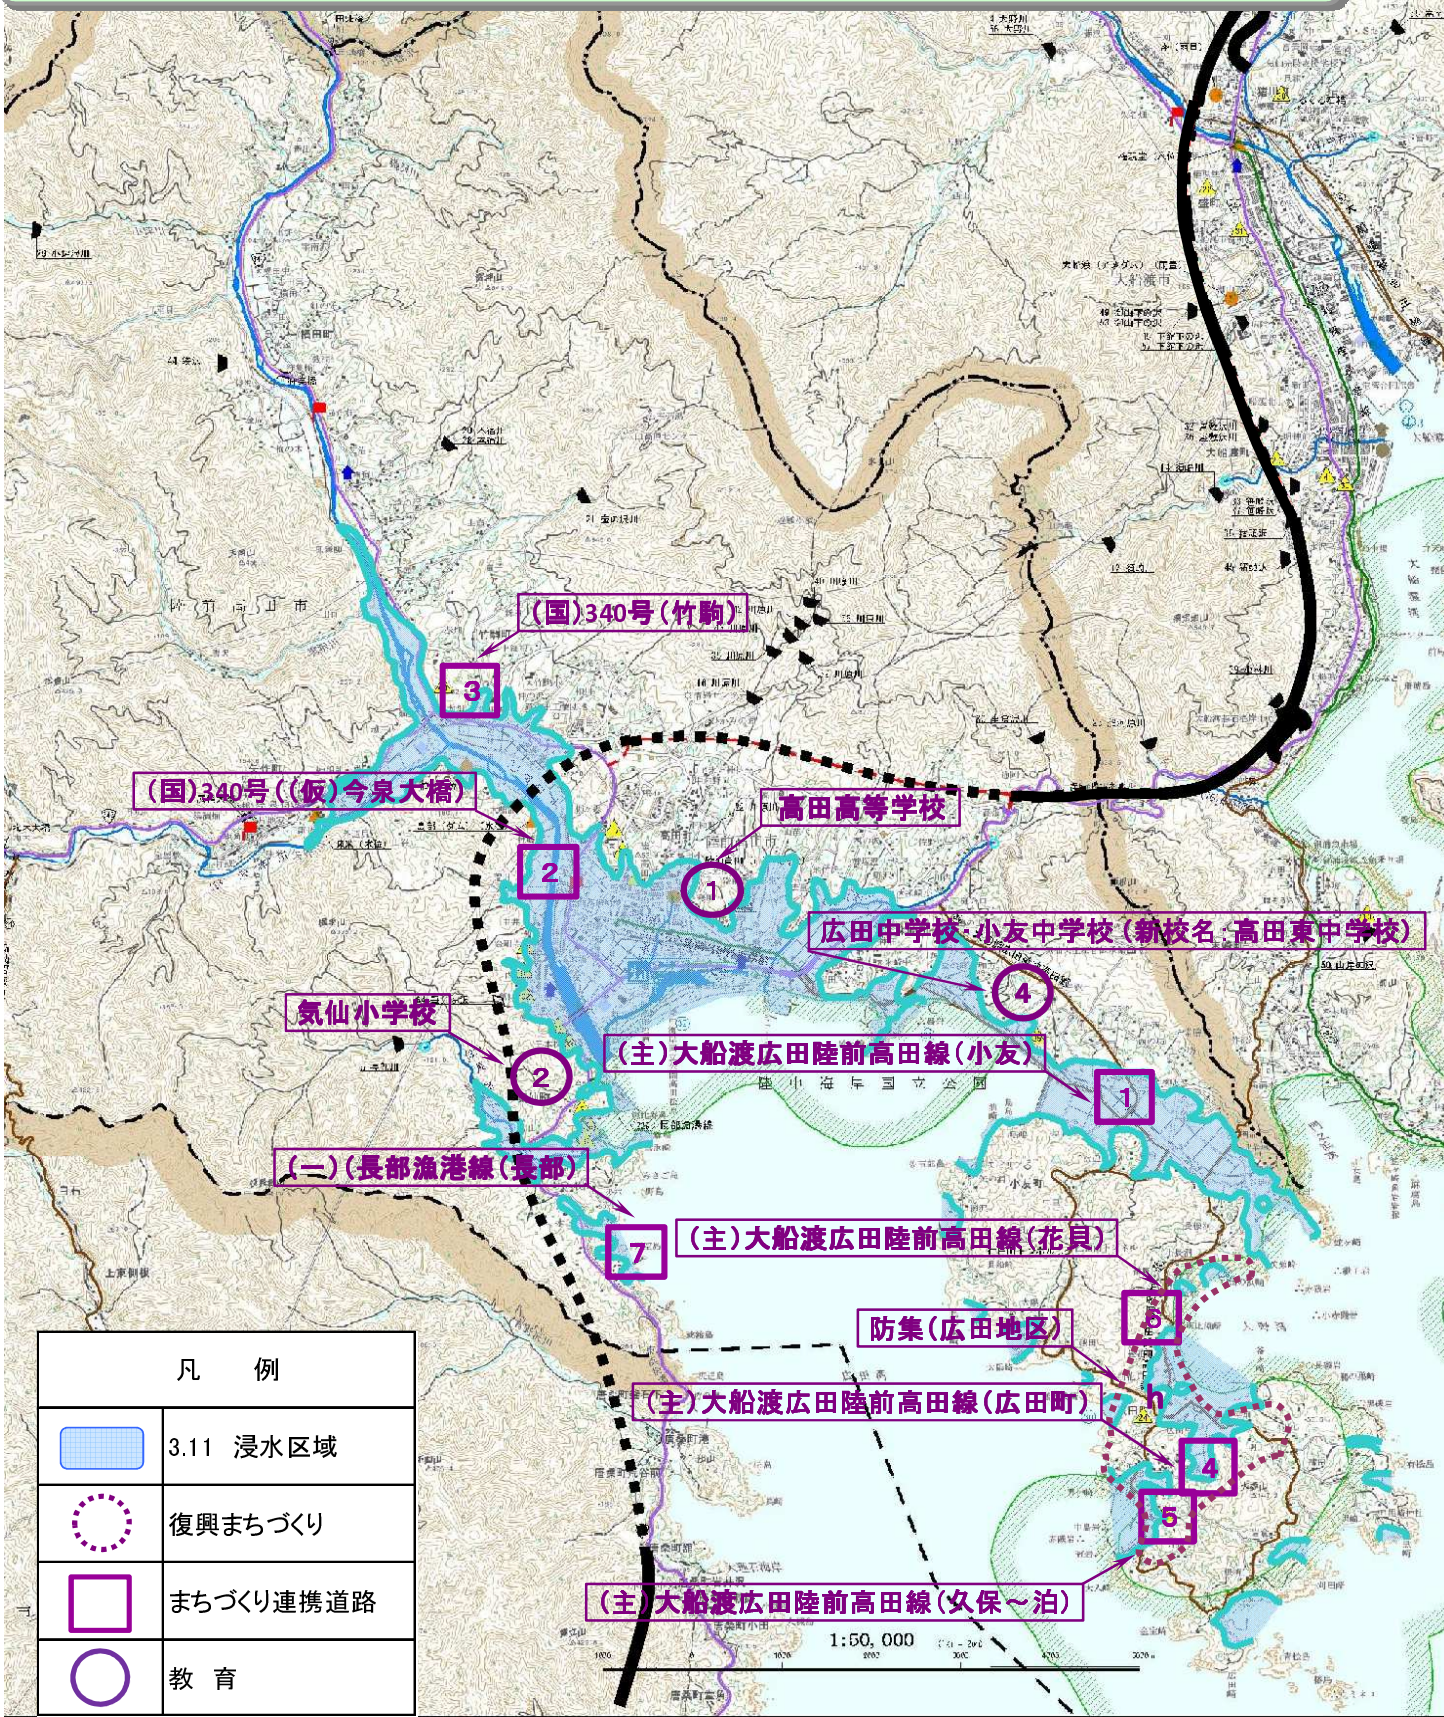

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	防災集団移転	市	h-1 広田地区(長洞)	対象戸数:14戸 (民14戸)	事業準備・住民合意	事業計画 設計等	★工事	民14戸 順次住宅建設						
			h-2 広田地区(大野)	対象戸数:7戸 (民7戸)	事業準備・住民合意	事業計画 設計等	★工事	民7戸 順次住宅建設						
			h-3 広田地区(広田大野)	対象戸数:25戸 (民25戸)	事業準備・住民合意	事業計画 設計等	★工事	民25戸 順次住宅建設						
			h-4 広田地区(田谷)	対象戸数:41戸 (民41戸)	事業準備・住民合意	事業計画 調査・設計等	★工事	民41戸 順次住宅建設						
			h-5 広田地区(六ヶ浦)	対象戸数:7戸 (民7戸)	事業準備・住民合意	事業計画 設計等	★工事	民7戸 順次住宅建設						
			h-6 広田地区(泊第一)	対象戸数:3戸 (民3戸)	事業準備・住民合意	事業計画 調査・設計等	★工事	民3戸 順次住宅建設						
			h-7 広田地区(泊第二)	対象戸数:8戸 (民8戸)	事業準備・住民合意	事業計画 調査・設計等	★工事	民8戸 順次住宅建設						
			h-8 広田地区(泊第三)	対象戸数:14戸 (民14戸)	事業準備・住民合意	事業計画 調査・設計等	★工事	民14戸 順次住宅建設						
			h-9 広田地区(中沢)	対象戸数:9戸 (民9戸)	事業準備・住民合意	事業計画 設計等	★工事	民9戸 順次住宅建設						
			h-10 広田地区(久保)	対象戸数:6戸 (民6戸)	事業準備・住民合意	事業計画 設計等	★工事	民6戸 順次住宅建設						
復興 まちづくり	連携道路	県	1 (主)大船渡広田陸前高田線	小友		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
			2 (国)340号	(仮)今泉大橋・大石沖		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
			3 (国)340号	竹駒		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
			4 (主)大船渡広田陸前高田線	広田町		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
			5 (主)大船渡広田陸前高田線	久保～泊		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
			6 (主)大船渡広田陸前高田線	花貝		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
			7 (一)長部漁港線	長部		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
教育	高等学校	県	1 高田高等学校	(災害復旧)校舎、第一体育館、第二体育館、柔剣道場、防災対応施設	用地・設計	★造成	設計	★第一体育館	★校舎等建設					
	小学校	市	2 気仙小学校	(災害復旧)移転	事業準備・住民合意									H25 長部小と統合移転完了まで現在の長部小を使用
	中学校	市	3 気仙中学校	協議・調整中	住民合意									学校統合等について、地域住民等と協議・調整中当面、旧矢作中を使用
	中学校	市	4 広田中学校 小友中学校	(災害復旧)移転	事業準備・住民合意	用地取得・設計		造成工事	H25 米崎中と3校統合(新校名:高田東中)移転完了まで現在の米崎中を使用					校舎・体育館等建設

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。  
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。




社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市 4 / 4】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)  
大船渡水産センター(0192-27-5081)  
【市】陸前高田市建設課、都市計画課、復興対策局、水産課  
(0192-54-2111)

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

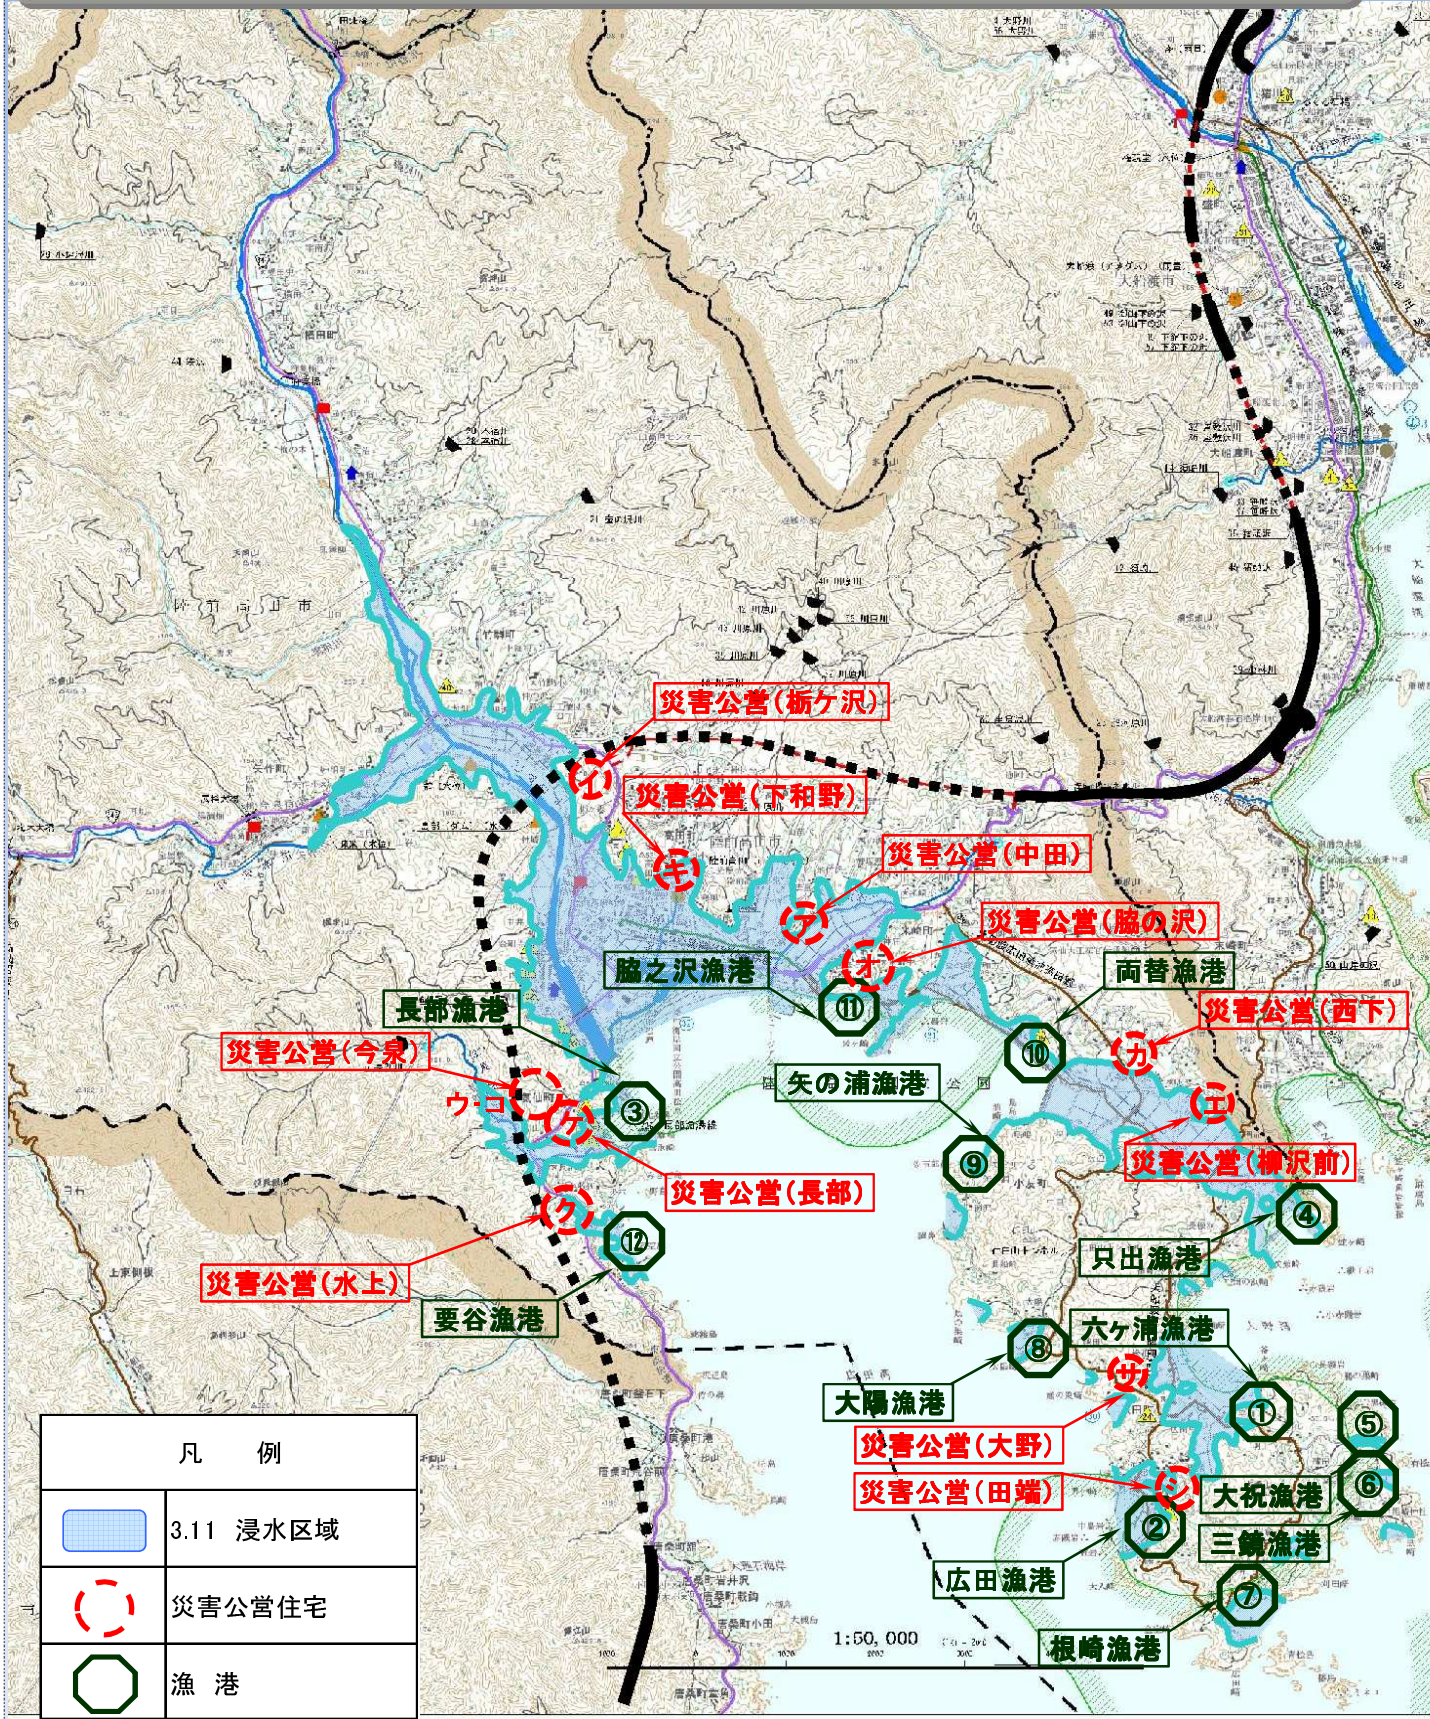

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期(基盤復興期間)		第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
災害公営住宅	直接建設	県	ア 中田(単独)	RC造8階 予定戸数:197戸	用地	設計	★工事		197戸			
			イ 栃ヶ沢(単独)	RC造8階 予定戸数:300戸	用地・造成	設計		工事	300戸			
			ウ 今泉(区:今泉地区)	RC造 予定戸数:60戸			用地	設計		60戸		
			エ 柳沢前(単独)	RC造3階 予定戸数:28戸	用地	設計	★工事		28戸			
			オ 脇の沢(防:米崎地区)	RC造 予定戸数:60戸			用地・設計・工事		60戸			
	設計・施工一括選定	市	カ 西下(単独)	RC造4階 予定戸数:40戸	用地		設計・工事		40戸			
			その他	予定戸数:15戸			用地・設計・工事		15戸			
	買取	市	キ 下和野(区:高田地区)	RC造7階 予定戸数:120戸	用地・造成	設計	★工事		120戸			
			ク 水上(単独)	RC造3階 予定戸数:30戸	用地	設計	★工事		30戸			
			ケ 長部(区:今泉地区)	RC造3階 予定戸数:30戸			用地	設計	工事			
			コ 今泉(区:今泉地区)	RC造3階 予定戸数:60戸			用地		設計	工事	60戸	
			サ 大野(単独)	RC造3階 予定戸数:40戸			用地	設計	工事	40戸		
			シ 田端(単独)	RC造3階 予定戸数:20戸			用地	設計	工事	20戸		
漁港	漁港	市	① 六ヶ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=601m、岸壁L=474m 他	施工準備	★工事						
			② 広田漁港	(漁港災害) 防波堤L=919m、岸壁L=1,176m 他	施工準備	★工事						
			③ 長部漁港	(漁港災害) 防波堤L=408m、岸壁L=1,180m 他	施工準備	★工事						
			④ 只出漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、岸壁L=298m 他	施工準備	★工事						
			⑤ 大祝漁港	(漁港災害) 防波堤L=99m、岸壁L=43m 他	施工準備	★工事						
			⑥ 三鏡漁港	(漁港災害) 防波堤L=14m、岸壁L=36m 他	施工準備	★工事						
			⑦ 根岬漁港	(漁港災害) 防波堤L=354m、岸壁L=150m 他	施工準備	★工事						
			⑧ 大陽漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、岸壁L=79m 他	施工準備	★工事						
			⑨ 矢の浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=136m、岸壁L=183m 他	施工準備	★工事						
			⑩ 両替漁港	(漁港災害) 防波堤L=274m、岸壁L=254m 他	施工準備	★工事						
			⑪ 脇の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,149m、岸壁L=531m 他	施工準備	★工事						
			⑫ 要谷漁港	(漁港災害) 防波堤L=556m、岸壁L=279m 他	施工準備	★工事						

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。



社会資本の復旧・復興ロードマップ 【その他の市町村】

基準日：平成25年12月31日見込み  
(平成25年12月27日公表)

【問い合わせ先】  
岩手県県土整備部 道路建設課 (TEL 019-629-5868)

沿岸12市町村以外における事業計画工程表【復興道路、復興支援道路】

番号	路線名	市町村名	箇所名
＜復興道路（直轄事業）＞			
A	東北横断自動車道 釜石秋田線	遠野市	遠野道路 (遠野住田～遠野)
B	東北横断自動車道 釜石秋田線	遠野市	遠野～宮守
C	東北横断自動車道 釜石秋田線	遠野市 ～花巻市	宮守～東和
D	宮古盛岡横断道路 (区界～築川)	宮古市 ～盛岡市	区界道路
E	宮古盛岡横断道路	盛岡市	都南川目道路
＜復興道路（県事業）＞			
a	宮古盛岡横断道路	盛岡市	築川道路
＜復興支援道路＞			
1	国 106号	盛岡市	川目
2	国 107号	奥州市	札押道路
3	国 107号	奥州市	梁川～口内
4	国 281号	岩手町	大坊
5	国 281号	岩手町	大坊の2
6	国 283号	遠野市	上郷道路
7	国 284号	一関市	真滝B P
8	国 284号	一関市	室根B P
9	国 284号	一関市	石法華
10	国 340号	遠野市	土淵B P
11	国 340号	遠野市	立丸峠
12	国 340号	九戸村	泥ノ木
13	国 340号	軽米町	駒板
14	国 340号	住田町	山谷
15	国 340号	葛巻町	四日市
16	国 342号	一関市	花泉B P
17	国 342号	一関市	白崖
18	国 343号	一関市	大原
19	国 343号	一関市	一ノ通
20	国 397号	住田町	子飼沢
21	国 397号	奥州市	分限城～赤金
22	国 397号	住田町	高屋敷
23	国 397号	住田町	津付道路
24	国 397号	奥州市	小谷木橋
25	一 遠野住田	遠野市	新里

凡例

復興道路


○ : H23新規

○ : 事業中

復興支援道路

○ : H25新規

○ : 事業中

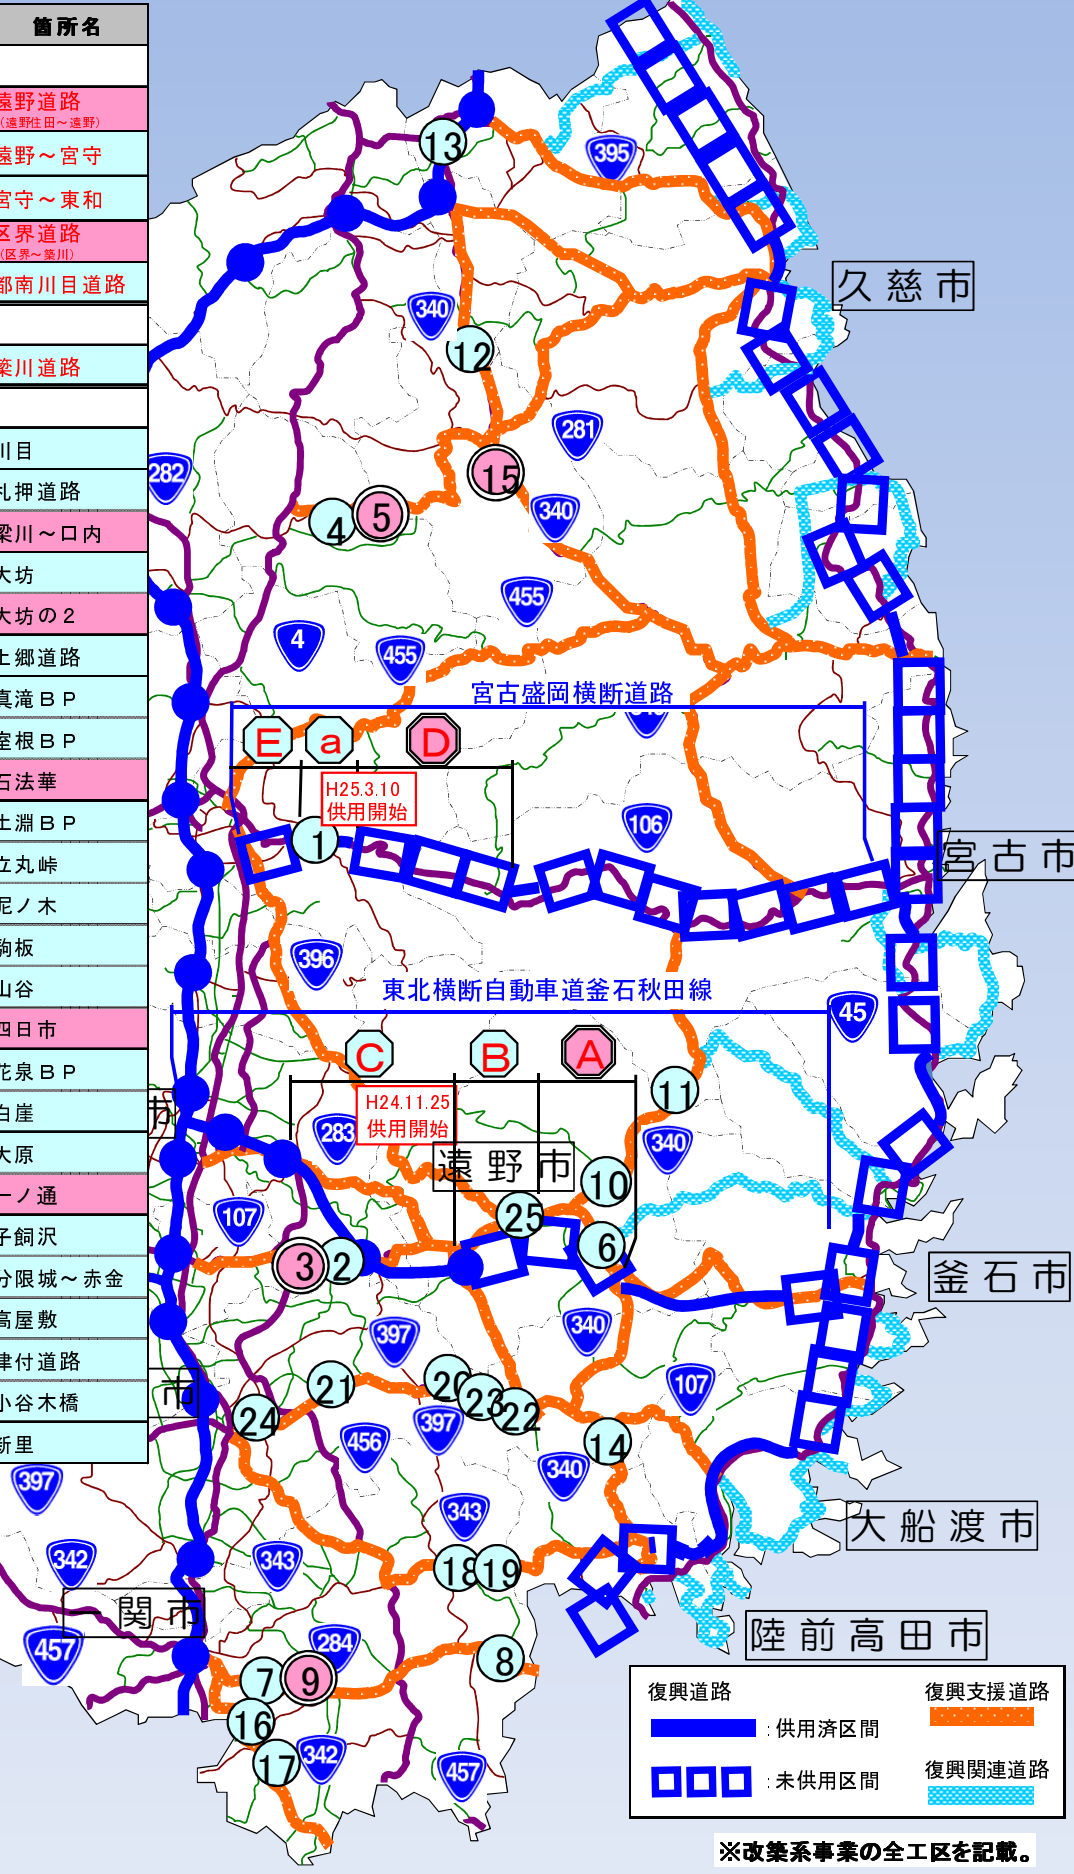

※改築系事業の全工区を記載。

区分	種別	路線名	番号	市町村名	箇所名	年度別整備スケジュール									
						第1期(基礎復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
						H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
直轄事業	復興道路	東北横断自動車道 釜石秋田線	A	遠野市	遠野道路 (遠野住田～遠野)	(H23新規) 準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.16起工式								
			B	遠野市	遠野～宮守	(事業中)	★用地・工事の推進								
			C	遠野市 ～花巻市	宮守～東和	(事業中) ☆用地・工事の推進	■H24.11.25供用開始								
		宮古盛岡横断道路	D	宮古市 ～盛岡市	区界道路 (区界～築川)	(H23新規) 準備	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
			E	盛岡市	都南川目道路	(事業中)	★用地・工事の推進 ※川目～田の沢 H27開通予定								
県事業	復興支援道路	宮古盛岡横断道路	a	盛岡市	築川道路	(事業中) ☆用地・工事の推進	■H25.3.10供用開始								
		一般国道106号 (ICへアクセスする道路)	1	盛岡市	川目	(H24新規) ☆用地・工事の推進	■H25.3.10供用開始								
			2	奥州市	札押道路	(事業中) ☆工事の推進	■H23.10.26供用開始								
		国道107号	3	奥州市	梁川～口内	(事業中)	(H25新規) 施工準備								
			4	岩手町	大坊	(事業中) ★用地・工事の推進 (逐次供用開始)	用地買収								
		国道281号	5	岩手町	大坊の2	(事業中)	(H25新規) 施工準備								
			6	遠野市	上郷道路	(事業中) ★用地・工事の推進 (逐次供用開始)	用地買収								
		国道283号	7	一関市	真滝BP	(事業中) ☆工事の推進	■H24.8.7供用開始								
			8	一関市	室根BP	(事業中) ★用地・工事の推進 (逐次供用開始)	用地買収								
		国道284号	9	一関市	石法華	(事業中)	(H25新規) 施工準備								
			10	遠野市	土淵BP	(事業中) ☆用地・工事の推進	■H24.7.22一部供用開始								
		国道340号	11	遠野市 (宮古市)	立丸峠 ※宮古市の復興支援道路(国道340号立丸峠と同一箇所)	(H24新規) 施工準備	■H25.12.25供用開始								
			12	九戸村	泥ノ木	(事業中) ★用地・工事の推進 (逐次供用開始)	用地買収								
			13	軽米町	駒板	(H24新規) 施工準備	用地買収								
			14	住田町	山谷	(H24新規) 施工準備	用地買収								
			15	葛巻町	四日市	(H25新規) 施工準備	用地買収								
		国道342号	16	一関市	花泉BP	(事業中) 一部区間供用開始	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
			17	一関市	白崖	(H24新規) 施工準備	用地買収								
		国道343号	18	一関市	大原	(事業中) ★用地・工事の推進 (逐次供用開始)	用地買収								
			19	一関市	一ノ通	(H25新規) 施工準備	用地買収								
		国道397号	20	住田町	子飼沢	(事業中) ☆用地・工事の推進 (逐次供用開始)	■H25.9.30供用開始								
			21	奥州市	分限城～赤金	(事業中) ★用地・工事の推進 (逐次供用開始)	用地買収								
			22	住田町	高屋敷	(事業中) ★用地・工事の推進 (逐次供用開始)	用地買収								
			23	住田町	津付道路	(事業中) ★用地・工事の推進	用地買収								
			24	奥州市	小谷木橋	(H24新規) 施工準備	用地買収								
		(一) 遠野住田線 (ICへアクセスする道路)	25	遠野市	新里	(事業中)	★用地・工事の推進								

※路線、箇所は、今後、変更する可能性があります。
